

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 911.अ.३०

रक्सौल, / दिनांक 20.07.2021

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभाजने,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।
19.7.2021

Requisition of Allotment under Head MR HEAD-3054 Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

A-7 Raxaul

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as Pcs MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	A.A.		Agreement Value		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of BKR (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent	Previous Total Allotted Amount	up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
						Length (in Km)	Total (Amount) (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-NITS-20 Raxaul/06	Paltania Chak - Jankapur Path (BR-11-ETQ)	Barthonia Engicon Pvt Ltd.	31708202037	3030-4 (30) 3054-04-117-2019. 5973 / 4271. Raxaul-30.10.2019	4.000	165.27750	110.801	41.3573	179MBD/2020-21	13-08-2021	-	2504	25mm	5	0	0	110.80100	Work in Progress
																		110.80100	


Executive Engineer,
 Road & Works Department,
 Works Division, Raxaul
 19.7.24

Road Name-Pakhnahya Chowk to Jaitapur Path, Contractor- Barhoniya Engicon Pvt. Ltd.

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR	CATEGO	RY	Latitude	Longitu	Event
16/7/21	17:53:8	84	0.1	300	0	3000	3103 G		26.91515	84.73492	Normal
16/7/21	17:53:8	84	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.91507	84.73389	Normal
16/7/21	17:53:8	84	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.91496	84.73295	Normal
16/7/21	17:53:43	84	0.1	240	30.3	2400	2504 G		26.91501	84.73185	Normal
16/7/21	17:54:0	84	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.91509	84.73086	Normal
16/7/21	17:54:17	84	0.1	230	20.2	2300	2404 G		26.91454	84.73012	Normal
16/7/21	17:55:0	84	0.1	200	30.3	2000	2105 G		26.9137	84.72997	Normal
16/7/21	17:55:0	84	0.1	190	30.3	1900	2005 G		26.91285	84.7297	Normal
16/7/21	17:55:28	84	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.91203	84.72919	Normal
16/7/21	17:55:28	84	0.1	250	20.2	2500	2604 G		26.9113	84.72869	Normal
16/7/21	17:55:28	84	0.1	210	20.2	2100	2205 G		26.91057	84.72811	Normal
16/7/21	17:56:3	84	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.91021	84.72717	Normal
16/7/21	17:56:3	84	0.1	230	20.2	2300	2404 G		26.90971	84.7264	Culvert
16/7/21	17:56:38	84	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.90893	84.72582	Normal
16/7/21	17:57:0	84	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.90807	84.72547	Normal
16/7/21	17:57:14	84	0.1	240	20.2	2400	2504 G		26.90728	84.72527	Normal
16/7/21	17:57:14	84	0.1	250	20.2	2500	2604 G		26.90639	84.72493	Normal
16/7/21	17:57:49	84	0.1	230	20.2	2300	2404 G		26.90571	84.72434	Normal
16/7/21	17:58:0	84	0.1	220	20.2	2200	2305 G		26.90394	84.72404	Normal
16/7/21	17:58:24	84	0.1	250	20.2	2500	2604 G		26.90308	84.72379	Normal
16/7/21	17:58:24	84	0.1	230	30.3	2300	2404 G		26.90227	84.72364	Normal
16/7/21	17:58:24	84	0.1	260	30.3	2600	2704 G		26.9023	84.72365	Normal
16/7/21	17:59:0	84	0.1	240	20.2	2400	2504 G		26.90137	84.72372	Normal
16/7/21	17:59:0	84	0.1	280	20.2	2800	2903 G		26.9005	84.7237	Normal
16/7/21	17:59:35	84	0.1	320	30.3	3200	3303 G		26.89963	84.72418	Normal
16/7/21	18:0:0	84	0.1	200	30.3	2000	2105 G		26.89877	84.72423	Normal
16/7/21	18:0:10	84	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.89793	84.72446	Normal
16/7/21	18:0:45	84	0.1	250	20.2	2500	2604 G		26.897	84.72426	Normal
16/7/21	18:1:0	84	0.1	200	30.3	2000	2105 G		26.8962	84.72404	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$$

$$X = 3200$$

$$Y = 3303$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

16/7/21	18: 1: 21	84	0.1	260	30.3	2600	2704 G	26.89536	84.7237	Normal
16/7/21	18: 1: 21	84	0.1	270	20.2	2700	2804 G	26.89454	84.72327	Normal
16/7/21	18: 1: 21	84	0.1	250	30.3	2500	2604 G	26.89376	84.72281	Normal
16/7/21	18: 2: 0	84	0.1	260	30.3	2600	2704 G	26.8929	84.72246	Normal
16/7/21	18: 2: 0	84	0.1	250	20.2	2500	2604 G	26.89207	84.7219	Normal
16/7/21	18: 2: 31	84	0.1	240	10.1	2400	2504 G	26.89129	84.72141	Normal
16/7/21	18: 3: 7	84	0.1	280	20.2	2800	2903 G	26.89048	84.72104	Normal
16/7/21	18: 3: 7	84	0.1	250	30.3	2500	2604 G	26.88966	84.72059	Normal
16/7/21	18: 4: 0	84	0.1	260	30.3	2600	2704 G	26.88936	84.71973	Normal
16/7/21	18: 4: 17	84	0.1	320	10.1	3200	3303 G	26.8891	84.71934	Normal
				TOTAL IRI		100169				
				AVERAGE IRI		2504.225				


James
JE
17/7/21

AE
17.7.21
Rangathur

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORKS DEPARTMENT
WORKS DIVISION, RAXAUL
Sayed
19/7/21

Name of Customer : Barthonia Engicon Pvt. Ltd
 Name of Work/ Road : Paknahiya Chowk to Jaipur
 Lab Job number : 84
 Date : 16-07-2021
 Section No. : 84

Test Date : 16-07-2021
 Machine No : 378
 Start S No : 0.00 KM
 Start E No : 4.00 KM
 Weather : Normal
 Start Location : 26.91515
 End Location : 84.719343
 Road Name : Paknahiya Chowk to Jaipur
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side : Interval
 UIV Range : 1005 To 4000
 Dist Range : 0 To 4.1
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$

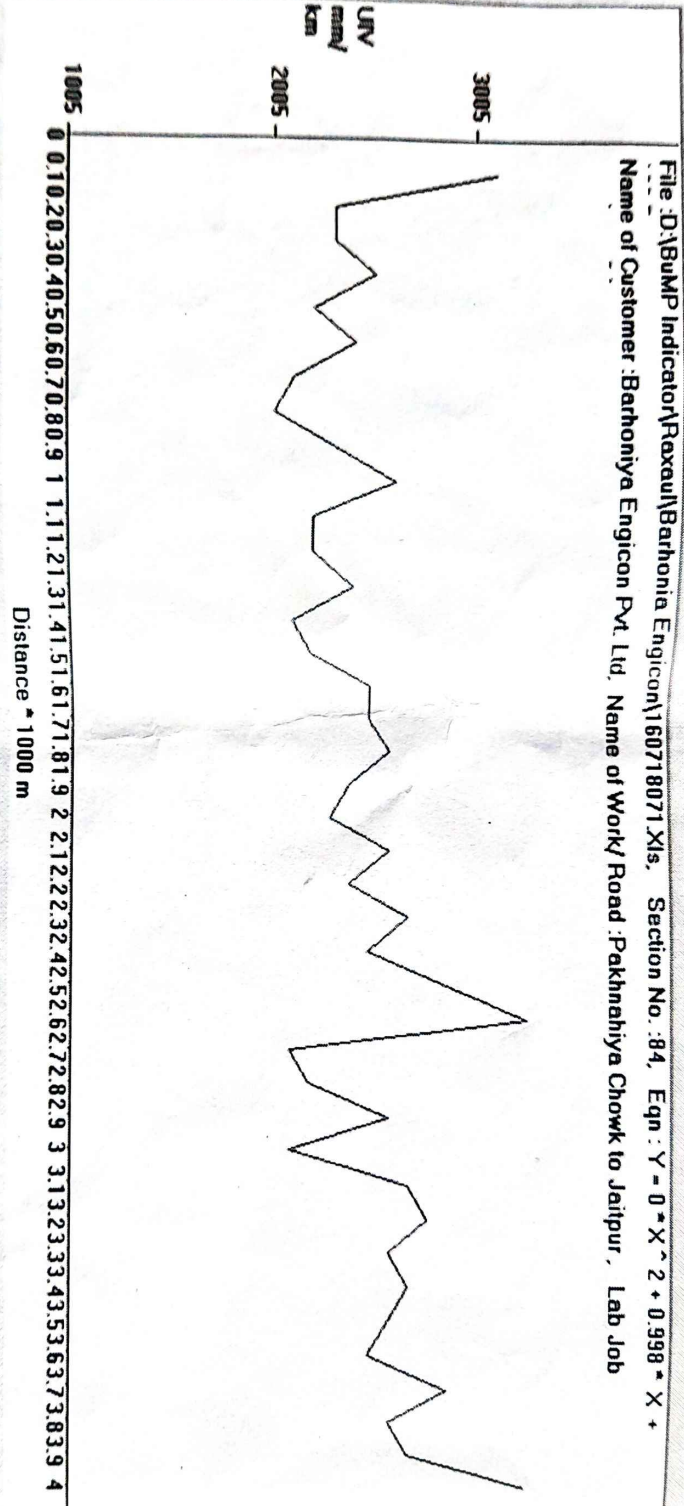

Sharma
 17/7/21
 J.E

AB
 14.7.21
 Rawgas hbr

Sharma
