

बाद क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर प्रमंडलीय जाँच प्रतिवेदन टेरा प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- अरवि कुमार, कार्यकारी अभियंता
2. निरीक्षण की तिथि :- गुमीना बसि विभाग, सवि प्र, दाउदनगर।
25.11.21
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- सुन्दरगंज से अद्वोर पथ। (मेयनाज सिविल)
4. पथ की लम्बाई :- 15.10 m
5. कार्य प्रमंडल का नाम :- गुमीना बसि विभाग, सवि प्र, (गोरेगावाड़)
6. प्रखंड का नाम :- वारणा
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No) - हाँ,
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 15.10 m to

10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरणी :-
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)

Brick bat filling

$$\begin{aligned}
 1 \times 12.00 \times 1.5 \times 1.00 &= 18.00 \text{ m}^3 \\
 1 \times 3.5 \times 4.2 \times 3.12 &= 36.75 \text{ m}^3 \\
 1 \times 2.5 \times 4.2 \times 3.12 &= 23.62 \text{ m}^3 \\
 1 \times 1.8 \times 1.2 \times 1.5 &= 3.24 \text{ m}^3 \\
 \hline
 &= 81.61 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

E.C. bag filling brick bat
Locob Sand filling &
Carriage by tractor.
Supply E.C. bag filling 3 840 bag.

$$\begin{aligned}
 1 \times 12 \times 0.90 \times 1.00 &= 12.96 \text{ m}^3 \\
 1 \times 1.5 \times 1.00 \times 1.22 &= 1.83 \text{ m}^3 \\
 2 \times 2 \times 0.70 \times 2.8 &= 4.5 \text{ m}^3 \\
 \hline
 &= 19.29 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

E.C. bag filling brick bats
Locob Sand filling & Carriage
by tractor. etc.

11. Temporary Restoration में किस-किस :-
समाग्रियों का उपयोग किया गया है,
उसका विवरणी

12. अनियुक्ति :- Montroble (सुचारु एवं संपूर्ण रूप से)
एवं कार्य संतोषप्रद।

25.11.21
Am

25.11.21
निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित



ग्रामीण कार्य विभाग

Rural Works Department, Govt of Bihar

बिहार ग्रामीण रोज़गार विकास प्राधिकरण




BIHAR RURAL ROADS PROJECT Bihar Rural Road Development Agency (BRRDA) Govt. of Bihar

FDR

6

YEAR -2021-2022

DETAILED PROJECT REPORT

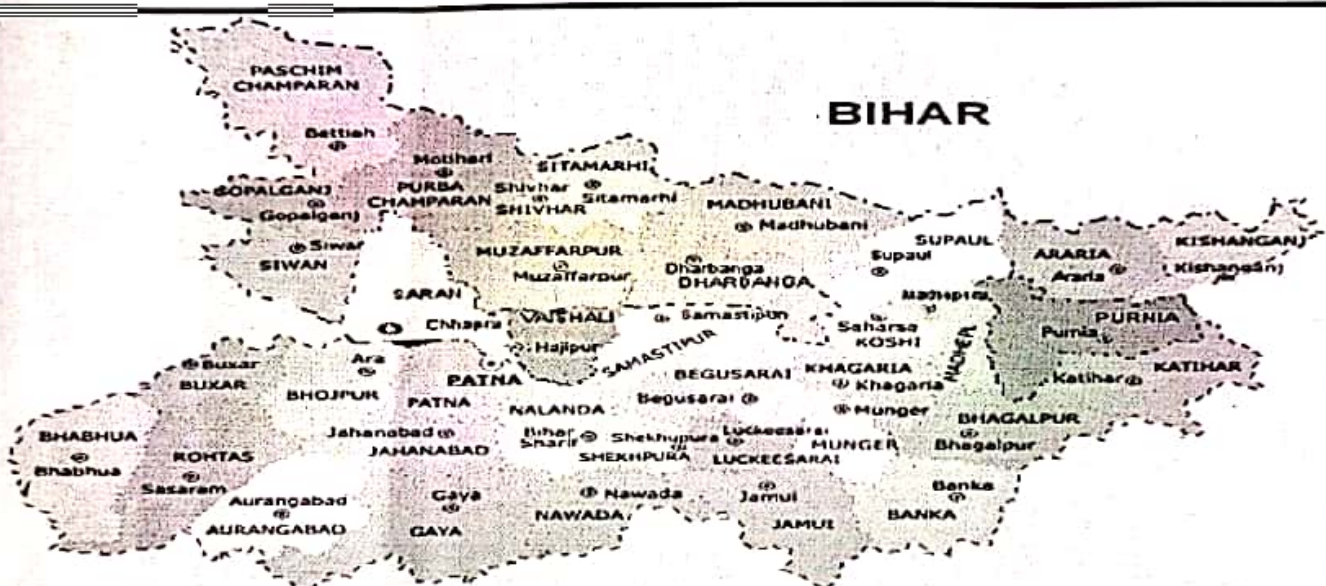

Name of the Road :-

MB No-3099

RESTORATION REPAIR OF ROAD FROM SUNDARGANJ TO JAMHOR (NEAR MEGHRAJ BIGHA) length = 15.00 m to

DISTRICT	:	AURANGABAD	
DIVISION	:	AURANGABAD	
BLOCK	:	BARUN	
TOTAL COST OF CONSTRUCTION	:	2.497	Lac
TOTAL COST OF PROJECT	:	2.497	Lac

SUBMITTED BY:-

EXECUTIVE ENGINEER
RWD (W) DIVISION AURANGABAD
AURANGABAD

2516
b. 1.698 Lac

बाढ़ क्षतिग्रस्त पथों का अन्तर् प्रगंडलीय जाँच प्रतिवेदन हेतु प्रपत्र।

1. निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम :- अंजलि कुमार, इन्सपेक्टर इन्फ्रस्ट्रक्चर
2. निरीक्षण की तिथि :- शुक्रवादि, 25.11.21
3. पथ का नाम (शीर्ष के साथ) :- सुन्दरगंज से अदौर पथ (मेयनाज सिविल)
4. पथ की लम्बाई :- 15.10 मी
5. कार्य प्रगंडल का नाम :- शुक्रवादि, इन्सपेक्टर इन्फ्रस्ट्रक्चर
6. प्रगंड का नाम :- बाढ़
7. पथ की स्थिति :- (पूर्ण / On going)
8. पथ अनुरक्षण अवधि में है :- (Yes/No) - हाँ
9. क्षतिग्रस्त भाग की लम्बाई :- 15.10 मी
10. क्षतिग्रस्त भाग में कराये गये कार्य का विवरण :-
(लम्बाई x चौड़ाई x गहराई)

<u>Brick bat filling</u>	<u>840 bag</u>
$1 \times 12.00 \times 1.5 \times 1.00 = 18.00 \text{ m}^3$	<u>E.C. bag filling brick bat</u>
$1 \times 3.5 \times 4.2 \times 3.12 = 36.75 \text{ m}^3$	<u>Locob sand filling &</u>
$1 \times 2.5 \times 4.2 \times 3.12 = 23.62 \text{ m}^3$	<u>Carriage (2.00 + 2.00) x 4.30 x 0.15 =</u>
$1 \times 1.8 \times 1.2 \times 1.5 = 3.24 \text{ m}^3$	<u>Supply E.C. bag filling - 3 840 bag.</u>
<u>81.61 m</u>	$1 \times 12 \times 0.90 \times 1.2 = 12.96 \text{ m}^3$
	$1 \times 1.5 \times 1.00 \times 1.22 = 1.83 \text{ m}^3$
	$2 \times 2 \times 0.90 \times 2.8 = 10.08 \text{ m}^3$
11. Temporary Restoration में किस-किस समाग्रियों का उपयोग किया गया है, उसका विवरण :-
E.C. bag filling brick bat
Locob sand filling & Carriage by tractor. etc.

12. अभियुक्ति :- Monobable (सुचारु रूप से अनावधान प्रारम्भ)

25.11.21
A-00

निरीक्षी पदाधिकारी का हस्ताक्षर
पदनाम सहित

SUMMARY OF COST ESTIMATE FOR THE PROJECT

PACKAGE NO.
NAME OF ROAD :

RESTORATION REPAIR OF ROAD FROM SUNDARGANJ TO
JAMHOR (NEAR MEGHRAJ BIGHA)

DISTRICT

AURANGABAD

BLOCK

BARUN

DIVISION

AURANGABAD

LENGTH OF ROAD (in Km)

0.164

LENGTH OF BT PAVEMENT

0

LENGTH OF CC PAVEMENT

0

CD STRUCTURES

HUME PIPE

0

RCC CULVERT

0

BOX CELL CULVERT

0

CAUSEWAY / MINOR BRIDGE

0

Sl. No.	DESCRIPTION	AMOUNT (LAKHS)
2	SEND FILING	1561.291
3	BRICK BATS	176119.277
4	HP Pipe NP3	0.000
5	EC bag board	24387.000
	Traffic Signs board	11015.718
TOTAL		213883.285
ADD GST @ 12 %		25665.994
ADD LABOUR CESS @ 1 %		2138.833
TOTAL COST OF PROJECT IN LACS =		241688.112

1.413
0.170
0.014
0.101
1.698

[Signature]
28/10/24

JE
RWD

[Signature]
28/10/24

AE
RWD

[Signature]
28/10/24

EE
RWD

Provisionally Technically Sanctioned for Rs. 1.698 lakh
pees. ———— Crore. one lakh. sixty nine.
thousand. Eight ———— Hundred ———— only

Certified copy

[Signature]
24/10/24
S.E.
R.W.D (W) Circle
Aurangabad

[Signature]
S.E.
R.W.D (W) Circle
Aurangabad

Sl. No.	SDB SL. NO	MORD Ref. No	Description	Unit	NOS	LENGTH	WIDTH	HEIGHT	QUANTITY	RATE	AMOUNT (In Rs.)
SUB HEAD : PREPARATORY WORKS, SITE CLEARANCE, DISMANTLING											
1	11.2	300.61	Filling in foundation trenches as per drawing and technical specification Clause 305.3.9								
				Cum	1.00	2.50	4.200	0.15	1.58		
				Cum	1.00	2.00	4.200	0.150	1.26		
									2.84	550.72	1,561.29
2		401	BRICK BATS Providing and filling brick bats in ditches including cost of brick bats and labour all complete job as per specification and direction of E/I.								
				Cum	1.00	12.00	1.500	1.000	18.00		
				Cum	1.00	3.50	4.200	3+2/2	36.75		
				Cum	1.00	2.50	4.200	3+1.5/2	23.62		
				Cum	1.00	1.80	1.200	1.500	3.24		
									81.61	2,158.06	1,76,119.28
3	5.1	502	Providing, Supplying and laying Empty Cement bags including filling, stitching, laying and placing at worksite all complete job as per specification and direction of E/I.								
				cum	1.00	12.00	0.900	1.20	12.96		
					1.00	1.50	1.000	1.20	1.80		
					1.00	2.00	0.900	2.50	4.50		
									19.26		
									0.023		
					no of bag				837.39	29.12	24,387.00
4			Providing and fixing of retro-reflectorised cautionary, mandatory and informatory sign as per IRC.67 made of encapsulated lens type reflective sheeting vide Clause 1701.2.3 fixed over aluminium sheeting, 1.5 mm thick supported on a mild steel angle iron post 75 mm x 75 mm x 6 mm firmly fixed to the ground by means of properly designed foundation with M15 grade cement concrete 450 mm x 450 mm x 600 mm, 600 mm below ground level as per drawing and Technical Specification Clause 305.3.9								
				no					2.00	5,907.86	11,815.72
											213,883.29

JE
RWD

AE
RWD

EE
RWD

1.4/3.

28/10/21

28/10/21
ACB
