

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नवादा।

पत्रांक :- 1240 अनु०

/नवादा, दिनांक :- 29/07/2020

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, नवादा।

सेवा में,


नोडल पदाधिकारी (MR-3054),
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार पटना।

विषय: MR-3054 योजना अंतर्गत अनुरक्षण मद की राशि से संबंधित अधिचाना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित विहित प्रपत्र में वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए अनुरोध है कि आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन


29.7.2020
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, नवादा।

Name of Road - Ranipur to Dhurihar

Name of Contractor - Shri Pankaj Kumar

Batch Name - MR-N/19-20/Nawada-01

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IR In	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
28/6/20	19:41:0	No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
28/6/20	19:42:0	26	0.1	330	0	3300	3341	G	24.878023	85.455555	Speed Breaker
28/6/20	19:42:0	26	0.1	320	10.1	3200	3251	G	24.878022	85.456582	Normal
28/6/20	19:43:0	26	0.1	390	10.1	3900	3880	G	24.878022	85.457592	Normal
28/6/20	19:43:0	26	0.1	300	20.2	3000	3071	G	24.877792	85.45838	Normal
28/6/20	19:43:0	26	0.1	250	20.2	2500	2622	G	24.876895	85.458248	Curve
28/6/20	19:43:0	26	0.1	280	20.2	2800	2892	G	24.876545	85.458988	Normal
28/6/20	19:43:0	26	0.1	170	30.3	1700	1904	G	24.87648	85.459982	Curve
28/6/20	19:44:0	26	0.1	230	20.2	2300	2443	G	24.876208	85.460807	Curve
28/6/20	19:44:0	26	0.1	240	20.2	2400	2533	G	24.876013	85.462	Normal
28/6/20	19:44:0	26	0.1	220	30.3	2200	2353	G	24.875885	85.462608	Normal
28/6/20	19:44:0	26	0.1	270	30.3	2700	2802	G	24.875795	85.463618	Normal
28/6/20	19:44:0	26	0.1	300	20.2	3000	3071	G	24.875915	85.464612	Curve
28/6/20	19:45:0	26	0.1	270	20.2	2700	2802	G	24.875947	85.465572	Normal
28/6/20	19:45:0	26	0.1	180	30.3	1800	1994	G	24.876038	85.466582	Normal
28/6/20	19:45:0	26	0.1	260	20.2	2600	2712	G	24.876462	85.467305	Normal
28/6/20	19:45:0	26	0.1	190	30.3	1900	2084	G	24.877425	85.467423	Normal
28/6/20	19:45:0	26	0.1	320	20.2	3200	3251	G	24.878277	85.467322	Normal
28/6/20	19:46:0	26	0.1	320	20.2	3200	3251	G	24.87923	85.46739	Normal
28/6/20	19:46:0	26	0.1	390	20.2	3900	3880	G	24.88012	85.467272	Normal
28/6/20	19:46:0	26	0.1	320	20.2	3200	3251	G	24.880995	85.467172	Normal
28/6/20	19:46:0	26	0.1	270	20.2	2700	2802	G	24.88189	85.467087	Normal
28/6/20	19:47:0	26	0.1	260	20.2	2600	2712	G	24.882777	85.467255	Normal
28/6/20	19:47:0	26	0.1	310	20.2	3100	3161	G	24.883698	85.467238	Normal
28/6/20	19:47:0	26	0.013	40	181.8	3077	3140	G	24.884535	85.466598	Normal
							Total	69203		Normal	
							Average	2883.45			

$$Y = 0.0 * X^2 + 0.898 * X + 3.1$$

$$X = 3077$$

$$Y = 3140$$

(R) RURAL ROAD


Good Average Poor
4000 4001-5000 >5001

28/6/20
P.F.
1/2 HRS

28/6/20
P.F.
1/2 HRS

28/6/20
P.F.
1/2 HRS

File: G:\Bump Indicator\28061947.Xls, Section No.: 26, Eqn: $Y = 0 * X^2 + 0.898 * X + 377.8$
 Name of Customer: Shri Pankaj Kumar, Name of Work/ Road: Ranipur to Dhurihar, Lab Job number :

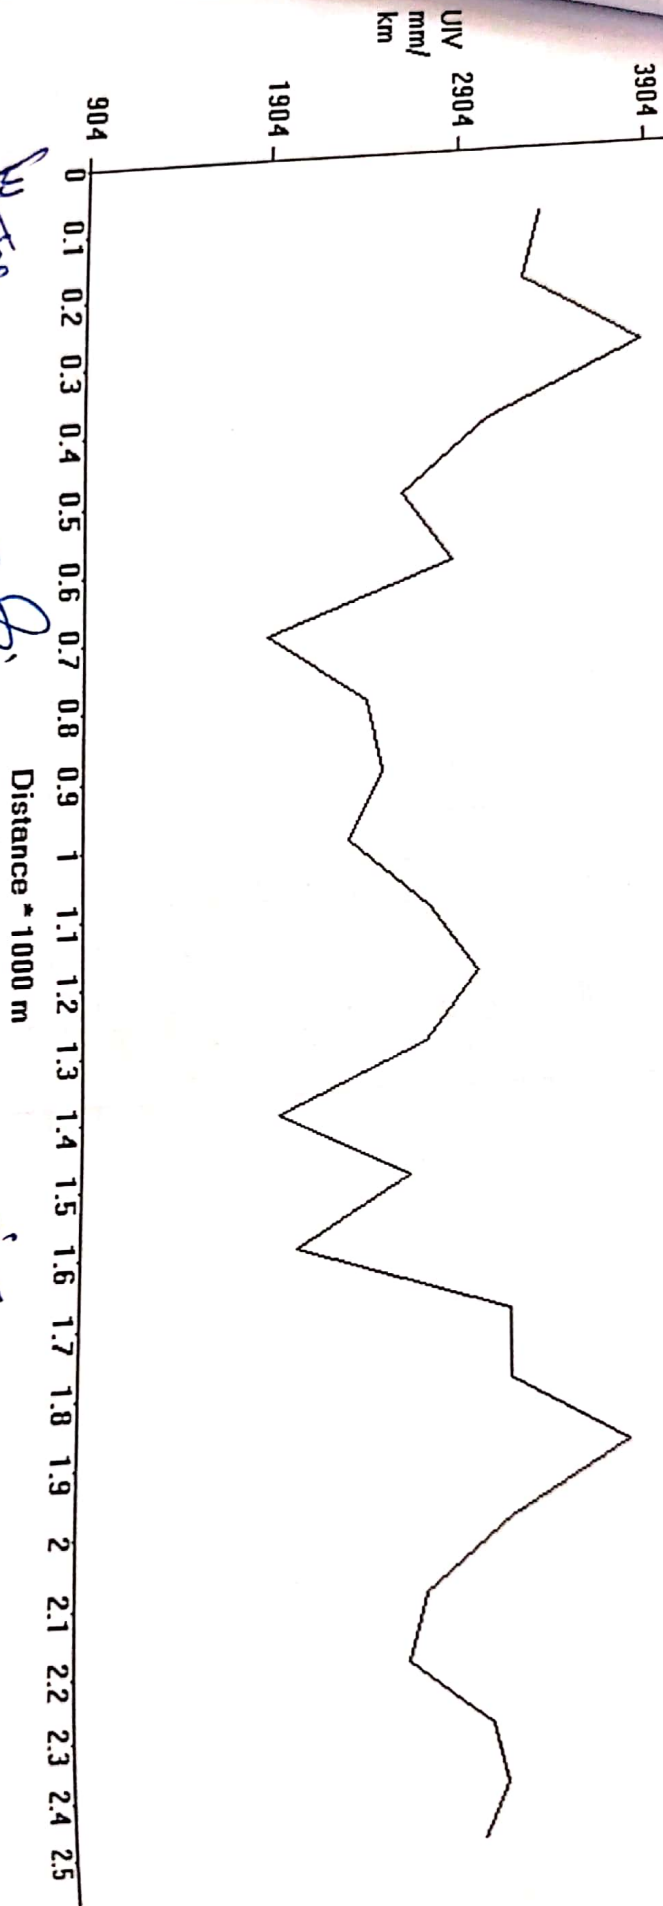

W
~~24/6/20~~
 D.F.
 12 Hrs

24/6/20
~~24/6/20~~
 12 Hrs

24/6/20
~~24/6/20~~
 12 Hrs
