

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 262

रक्सौल, / दिनांक 18/02/2021

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची
1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभाजन,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।
18.2.21

Requisition of Allotment under Head MIR HEAD-3054 Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Division :- Raxaul

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	A.A.		Agreement Value		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent	Previous Total Allocated Amount	up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done. (in Lakh)	Remarks
						Length (in Km)	Total (Amount) (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-N/19-20/Raxaul/05	PWD Road at Matter chowk-Ekdari	Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	317851032016	3054-04-117-2019 5128/4271 3178-24.09 2019	2.460	87,86,120	55,99,800	25,37,69	178 SBD/2020-21	12-05-2021	-	2757	25mm	5	0	0	55,99,800	Work in Progress
2	MR-N/19-20/Raxaul/05	Chauradano RFO Road - Raghunathpur	Barhonia Engicon Pvt. Ltd.	317851032019	3054-04-117-2019 5973/4271 3178-30.10. 2019	1.460	53,40,040	33,94,200	15,32,46	178 SBD/2020-21	12-05-2021	-	2632	25mm	5	0	0	33,94,200	Work in Progress
																		89,94,000	

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul
18.12.21

ROAD NAME- PWD ROAD MATAR CHOWK TO EKDARI, CONTRACTOR-BARHONIYA ENGICON PVT. LTD

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI in	CATEGO	Latitude	Longitu	Event	
No.		in km	in mm	Rate	mm/km	UIV	ROAD	RY		de		
16/2/21	9:17:0	77	0.1	200	0	2000	2105 G		26.84012	84.99934	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$
16/2/21	9:17:32	77	0.1	180	30.3	1800	1905 G		26.83994	85.318	Normal	X = 3000
16/2/21	9:17:32	77	0.1	240	30.3	2400	2504 G		26.83983	85.1363	Normal	Y = 3103
16/2/21	9:17:32	77	0.1	170	30.3	1700	1806 G		26.83971	85.2322	Normal	
16/2/21	9:18:0	77	0.1	170	30.3	1700	1806 G		26.83952	85.3282	Normal	(R) RURAL ROAD
16/2/21	9:18:8	77	0.1	230	30.3	2300	2404 G		26.83932	85.4292	Normal	Good
16/2/21	9:18:8	77	0.1	240	30.3	2400	2504 G		26.83912	85.5337	Normal	Average
16/2/21	9:18:43	77	0.1	360	20.2	3600	3702 G		26.83987	85.5538	Normal	Poor
16/2/21	9:19:0	77	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.84077	85.5588	Normal	<4000 4001-5000 >5001
16/2/21	9:19:0	77	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.84165	85.569	Normal	
16/2/21	9:19:19	77	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.84262	85.5757	Normal	
16/2/21	9:19:19	77	0.1	320	20.2	3200	3303 G		26.84351	85.5655	Normal	
16/2/21	9:20:0	77	0.1	360	30.3	3600	3702 G		26.84447	85.5487	Normal	
16/2/21	9:20:0	77	0.1	290	20.2	2900	3003 G		26.84552	85.542	Normal	
16/2/21	9:20:29	77	0.1	310	10.1	3100	3203 G		26.84559	85.675	Normal	
16/2/21	9:21:0	77	0.1	250	20.2	2500	2604 G		26.84552	85.7727	Normal	
16/2/21	9:21:4	77	0.1	200	30.3	2000	2105 G		26.84541	85.8753	Normal	
16/2/21	9:21:4	77	0.1	300	30.3	3000	3103 G		26.84538	85.9763	Normal	
16/2/21	9:21:40	77	0.1	330	30.3	3300	3402 G		26.84573	85.10673	Normal	
16/2/21	9:22:0	77	0.1	320	30.3	3200	3303 G		26.8457	85.11598	Normal	
16/2/21	9:22:15	77	0.1	360	30.3	3600	3702 G		26.84602	85.1249	Normal	
16/2/21	9:22:50	77	0.1	250	30.3	2500	2604 G		26.84658	85.13147	Normal	
16/2/21	9:23:0	77	0.1	340	30.3	3400	3502 G		26.8467	85.13955	Normal	
16/2/21	9:23:26	77	0.1	300	30.3	3000	3103 G		26.84764	85.14192	Normal	
		TOTAL IRI		66190								
		AVERAGE IRI		2757.92								

16/02/21
JE
Chandana


16/2/21
AE

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORK DEPARTMENT
WORKS DIVISION, RAXAUL
18.2.21

Name of Customer: RHONIVA ENGICON PVT. LTD
 Name of Work/Road: PWD ROAD MATAR CHOWK
 Lab Job number: 16-02-2021
 Date: 16-02-2021
 Section No. 77

Test Date :	16-02-2021	Road Name :	MATAR CHOWK TO EKDAARI
Machine No :	378	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	0.00 KM	Side :	Interval
Start E No :	2.460 KM	UIV Range :	806 To 5000 1000 mm/km
Weather :		Dist Range :	0 To 2.5 0.1 1000 m
Start Location :		Equation :	$Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$
End Location :			

File : D:\BuMP Indicator\Raxaul\Barhonia Engicon\16020936.Xls, Section No. : 77, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.998 * X +$
 Name of Customer : BARHONIVA ENGICON PVT. LTD, Name of Work/ Road : PWD ROAD MATAR CHOWK TO

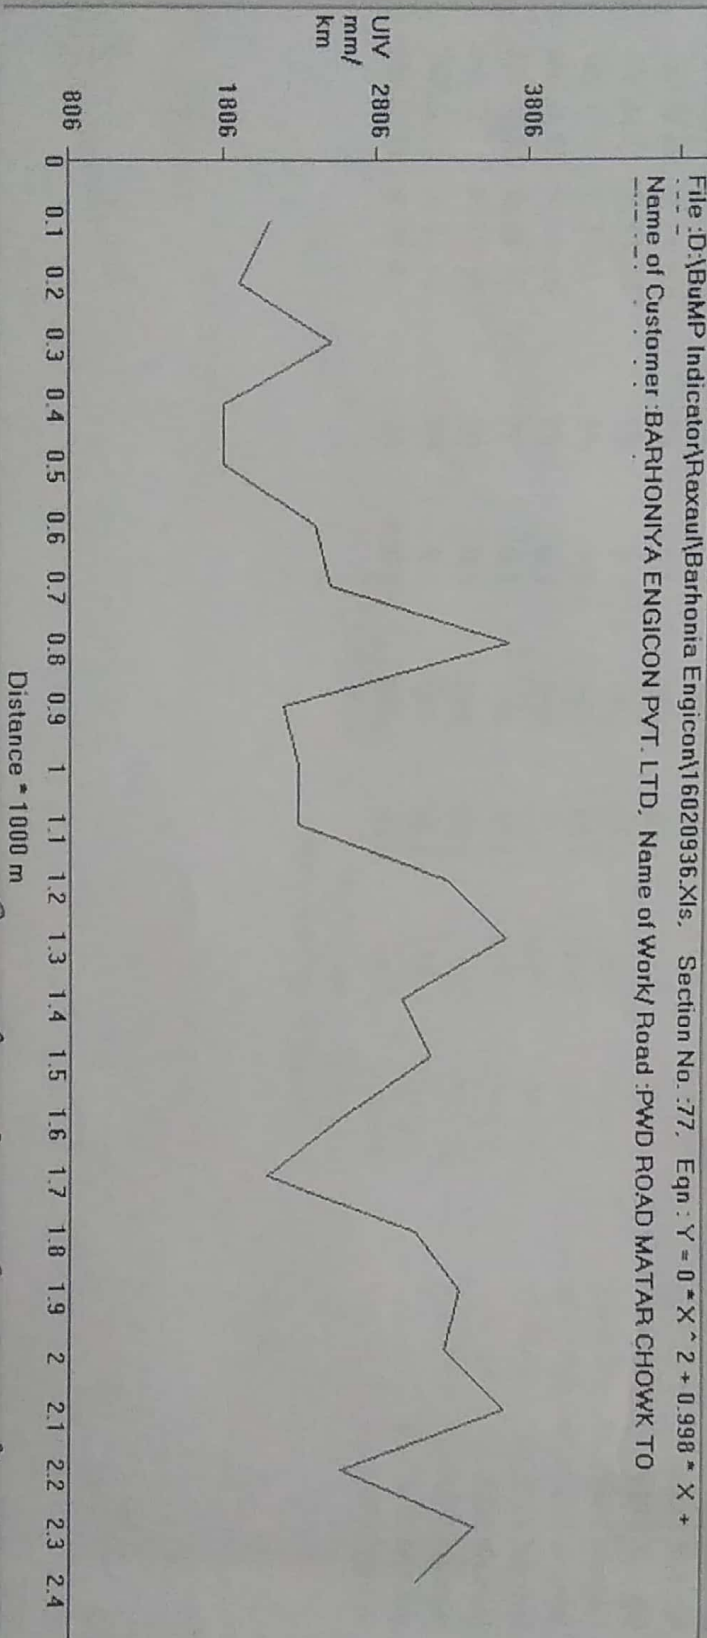

यहाँ की डरी मजदूरों के द्वारा की गई है।
 जोई अगल मजदूरों के लिए अगल रखी है।

Office
 16/02/21
 JE/Chauradano

16/02/21
 A.E.

E.E.
 Raxaul

Handwritten signature/initials.
