

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

पत्रांक:- 355(अ.मु.०)

पालीगंज/दिनांक:- 15/3/21

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
सह- सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy -2018 अन्तर्गत
कार्यन्वित की जा रही योजना का आवंटन हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि निम्नलिखित योजना का कुल राशि रुपये
1,15,54,617.00 मात्र का आवंटन हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्रवाई
समर्पित किया जाता है।

अनु० :- (1) अधियाचना विहित प्रपत्र में

विश्वासभाजन

15/3/21
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पालीगंज।
12/3/2021

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy -2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Work Division:- Paliganj

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In Km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/19-20 Paliganj/09	Pali Rani Talab Path to Ijarta	10100101024	Lt no. 6459 dt. 13.12.2019	1.6	56.04400	38.61200	17.05601	03/MBD/20-21 dt. 08.06.20	07.03.2021	-	Details Attached	25	5.21%	-	-	31.38840	
2	MR-N/19-20 Paliganj/09	Rakasiya to Kalyanpur	NEA220001633	Lt no. 6459 dt. 13.12.2019	2.9	125.12400	99.06600	30.84858	03/MBD/20-21 dt. 08.06.20	07.03.2021	-	Details Attached	25	5.08%	-	-	84.15777	
Total																	115.54617	

17/3
Executive Engineer
RWD Works Division Paliganj

NAME OF THE ROAD : RAKASIA TO KALYANPUR

LENGTH OF THE ROAD : 2.90 KM

PACKAGE NO. : MR-N/19-20/PALIGANU/09

DIVISION : PALIGANU


BLOCK : PALIGANU

CONTRACTOR : KRISHABH NIRMAL PVT LTD

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV mm/km	CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event		
7/2/21	10:57:2	21	0.1	380	0	3800	3835	ROAD	5.01	25.356348	84.832137	Normal	$Y = 0 \cdot X^2 + 0.936 \cdot X - 278.4$	
7/2/21	10:57:12	21	0.1	310	30.3	3100	3180	G	4.24	25.356507	84.831127	Normal	$X = 3900$	
7/2/21	10:57:22	21	0.1	320	30.3	3200	3273	G	4.35	25.356666	84.830168	Normal	$Y = 3928$	
7/2/21	10:57:37	21	0.1	290	30.3	2900	2992	G	4.01	25.356803	84.829123	Normal		
7/2/21	10:57:47	21	0.1	330	30.3	3300	3367	G	4.46	25.356755	84.828147	Normal	(R) RURAL ROAD	
7/2/21	10:58:0	21	0.1	310	30.3	3100	3180	G	4.24	25.356695	84.827137	Normal	Good	Average
7/2/21	10:58:12	21	0.1	340	30.3	3400	3460	G	4.57	25.35662	84.826127	Normal	<4000	4001-5000 >5001
7/2/21	10:58:22	21	0.1	350	30.3	3500	3554	G	4.68	25.356535	84.82508	Normal		
7/2/21	10:58:32	21	0.1	320	30.3	3200	3273	G	4.35	25.356457	84.824073	Normal		
7/2/21	10:58:47	21	0.1	380	30.3	3800	3835	G	5.01	25.356395	84.823097	Normal		
7/2/21	10:58:57	21	0.1	390	30.3	3900	3928	G	5.12	25.35638	84.822103	Normal		
7/2/21	10:59:10	21	0.1	370	30.3	3700	3741	G	4.9	25.356463	84.82106	Normal		
7/2/21	10:59:23	21	0.1	390	10.1	3900	3928	G	5.12	25.356523	84.82002	Normal		
7/2/21	10:59:43	21	0.1	380	20.2	3800	3835	G	5.01	25.356587	84.819023	Normal		
7/2/21	11:0:0	21	0.1	370	30.3	3700	3741	G	4.9	25.356648	84.818047	Normal		
7/2/21	11:0:10	21	0.1	340	30.3	3400	3460	G	4.57	25.356703	84.81702	Normal		
7/2/21	11:0:20	21	0.1	320	30.3	3200	3273	G	4.35	25.356785	84.816043	Normal		

7/2/21
7.9.21
W

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UV mm/km	CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event
7/2/21	11:0:32	21	0.1	260	30.3	2600	2712	ROAD G	3.68	25.356862	84.81505	Normal
7/2/21	11:0:42	21	0.1	270	30.3	2700	2805	G	3.79	25.356932	84.814007	Normal
7/2/21	11:0:52	21	0.1	260	30.3	2600	2712	G	3.68	25.35704	84.812978	Normal
7/2/21	11:1:8	21	0.1	320	30.3	3200	3273	G	4.35	25.35713	84.812053	Normal
7/2/21	11:1:18	21	0.1	300	30.3	3000	3086	G	4.13	25.357205	84.81101	Normal
7/2/21	11:1:28	21	0.1	380	20.2	3800	3835	G	5.01	25.357282	84.81	Speed Breaker
7/2/21	11:1:43	21	0.1	370	20.2	3700	3741	G	4.9	25.357582	84.80909	Normal
7/2/21	11:2:0	21	0.1	300	30.3	3000	3086	G	4.13	25.358452	84.809023	Normal
7/2/21	11:2:10	21	0.1	380	30.3	3800	3835	G	5.01	25.359338	84.809007	Normal
7/2/21	11:2:28	21	0.1	390	10.1	3900	3928	G	5.12	25.360308	84.808972	Normal
TOTAL			2.7	9120	717.1	91200	92868		122.69	684.64	2290.12072	
AVERAGE						3377.778	3439.556		4.544074			

 7.2.21
 7/2/21
 AG

Name of Customer : KRISHABH NIRMAN PVT LTD
Name of Work/ Road : RAKASIA TO KALYANPUR
Lab Job number :
Date : 07/02/2021
Section No. : 21

Test Date : 07-02-2021
Road Name : RAKASIA TO KALYANPUR
Machine No :
Road Type : (R) RURAL ROAD
Start S No :
Side :
Start E No :
Interval :
Weather :
UV Range : 1712 To 5000 mm/km
Dist Range : 0 To 28
Equation :
Start Location :
End Location :


Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\SHAZ\Desktop\21 SECTION.Xls, Section No. : 21, Eqn :

Name of Customer : KRISHABH NIRMAN PVT LTD, Name of Work/ Road : RAKASIA TO KALYANPUR, Lab Job

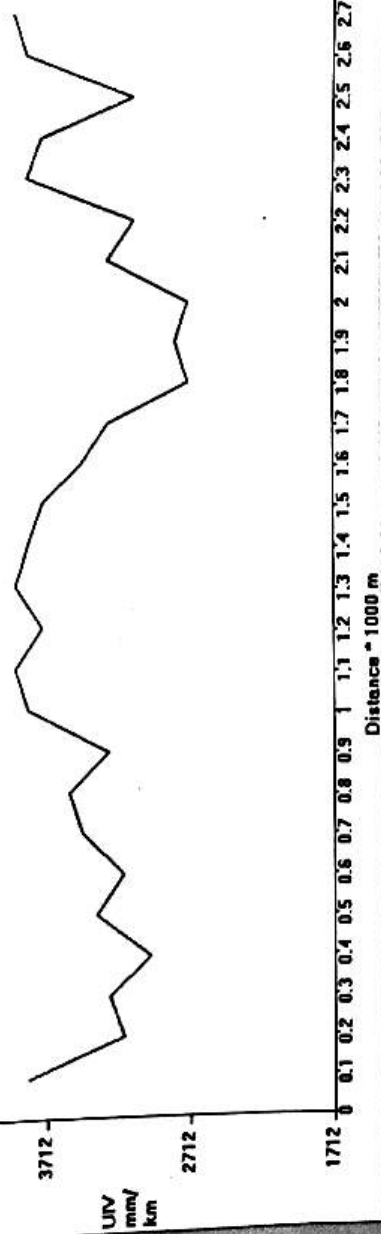

07/02/2021
A.C.

1

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग
पटना-800007

पत्रांक 365/अभ

पटना/दिनांक 09-03-2021

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य पत्रांक पानीगंज

विषय - जॉइन्ट प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रस्ताव - A.E. R.O.D. (4) Sub-Division Panchayat vide Letter No-14 (31/3/2021) dt-28/2/2021

नहाशत

उपरोक्त विषयक के संबंध में जॉइन्ट प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है जो निम्न प्रकार है-

N/A - Lakshya to Kalyanpur

Ref. No - 03/ROD/2020-21

1) S.D. B.C.
2) Bitumen Content

अनु-संशोधन

विश्वासभाजन

9/3/21

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

REGIONAL LABORATORY, R.W.D. GULJARHAGH, PATNA

PHYSICAL AND GRADATION TEST OF COARSE AGGREGATE

Name of Project/Road : Raknasia to Kalyanpur

Name of Scheme : MR-1054

Name of Agency : Krishabh Nitman Pvt Ltd.

Nature of sample : Semi Dense Bituminous Concrete Date of Collection/Received : 01/03/2021

Location : 600 m

Date of Test : 05/03/2021

Ref : Material sent by E.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division : Padigra

vide letter No 190(113) Dt 22/11/2020

Agreement No / Package No. : 03 / MID / 2020-21

Sl No	AIV	
	Average Test Value	Required Value (Max)
1	—	30%

Sl No	Sieve Size (mm)	Weight of Sample Taken Kgs 17.715					Remarks
		Weight Retd.	% of Wt. Retained	% of Cum. Retained	% of Passing	Required value	
1	132	0.000	0.00	0.00	100	100	
2	95	0.353	4.25	4.25	95.75	90-100	
3	4.75	8.955	50.55	54.80	45.20	35-51	
4	2.36	2.409	13.60	68.40	31.60	24-39	
5	1.18	1.612	9.10	77.50	22.50	15-30	
6	0.300	1.585	8.95	86.45	13.55	9-19	
7	0.075	1.263	9.95	96.40	3.60	3-8	

Copy Submitted to forwarded to:
E.E. R.W.D. Works Division

Bois
5/3/21
Regional Laboratory
R.W.D. Guljarhagh patna - 7

[Signature]
5/3/21
AD
Regional Laboratory
R.W.D. Guljarhagh patna - 7

Bois
5/3/21
Regional Laboratory
R.W.D. Guljarhagh patna - 7

[Signature]
5/3/21
Regional Laboratory
R.W.D. Guljarhagh patna - 7

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग
पटना-800007

पत्रांक : 114/ल.ग.

पटना/दिनांक : 16.1.2021

प्रेषक :
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7
सेवा में :
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल प.प. (ल.ग.)

विषय :- जॉचफल प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग :- Mr. Paligani vide letter no. 121 (अड) dt 8.12.2020

महोदय ,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में जॉचफल प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक
करवाई हेतु भेजा जा रहा है जो निम्न प्रकार है:-

Rakasiya to Kalyanpur
Bitumen Content for 1935

अनु-यथोक्त

विश्वासभाजन
18/1/2021
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग
पटना-800007

पत्रांक : 100/म.प्र.

पटना/दिनांक 15.1.2021

प्रेषक ,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

सेवा में ,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल भारतीय राजीश...

विषय :- जॉचफल प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग :- A.C. Paligani vide letter no. 118 (313) dt 7.12.2020

महाराज ,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में जॉचफल प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है जो निम्न प्रकार है:-

Rakasiya to Kalyanpur

stone chips (13.2mm to 9mm)

अनु:-यथोक्त

विश्वासभाजन

15/1/2021

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग

क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER 15/11/2024

100 REGIONAL LABORATORY, R. W. D., GULZARBAGH, PATNA - 7
PHYSICAL AND GRADATION TEST OF COARSE AGGREGATE

Name of Project/Road :- Rakasiya to Kalyanspur

Name of Scheme :- MR-2024

Name of Agency :- Krishabh Alimyan Pvt. Ltd.

Nature of sample : Mix seal (13.2mm to 0.075mm) Date of Collection/Received :- 12/11/2024

Location :- _____ Date of Test :- 15/11/2024

Ref :- Material sent by E.E./A.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division Paligani

vide letter No. 118 (2024) 7-12-2024

Agreement No / Package No. : 03/MR/2020-21

Sl. No.	A.I.V.	
	Average Test Value	Required Value(Max)
1.	—	40%

Sl. No.	Sieve Size in (mm)	Weight of Sample Taken Kgs (8.710)				Required Value		Remarks
		Weight Retd.	% of Wt. Retained	% of Cum. Retained	% of Passing	Type A	Type B	
1	13.2	0.000	0.00	0.00	100	—	100	
2	11.2	0.449	2.40	2.40	97.60	100	88-100	
3	5.6	9.804	52.40	54.80	45.20	52-88	31-52	
4	2.8	4.228	22.60	77.40	22.60	14-38	5-25	
5	0.09	3.620	19.35	96.75	3.25	0-5	0-5	

Rajesh
 15/11/2024
 Regional Laboratory
 R.W.D. Guljarbagh patna - 7

Kalyan
 15/11/2024
 A.D.
 Regional Laboratory
 R.W.D. Guljarbagh patna - 7

Rajesh Kumar
 15/11/2024
 A.E.
 Regional Laboratory
 R.W.D. Guljarbagh patna - 7

He
 15/11/2024
 E.E.
 Regional Laboratory
 R.W.D. Guljarbagh patna - 7

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER

103

REGIONAL LABORATORY, R. W. D., GULZARBAGH, PATNA - 7

PHYSICAL AND GRADATION TEST OF COARSE AGGREGATE

Name of Project/Road :- Rakasiga to Kalyanpur

Name of Scheme :- M/R- 3534

Name of Agency :- Krishabh Nirman Pvt. Ltd.

Nature of sample : Stone Metal GR - II

Date of Collection/Received on lab. :- 12/1/2021

Location/Chainage :- 1400m

Date of Test :- 15/1/2021

Ref :- Material sent by E.E./A.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division - Palgani

vide letter No. 117(315) D.12.2020

Agreement No / Package No. : 03/ M/RD/2020-21

Sl. No.	A.I.V.	
	Average Test Value	Required Value(Max)
1.	22.73.1.	40%

Sl. No	Sieve Size in (mm)	Weight of Sample Taken Kgs 28.460				Required Value			Remarks
		Weight Retained	% of Wt. Retained	% of Cumm. Retained	% of Passing	Grading I	Grading II	Grading III	
1	125	-	-	-	-	100	-----	-----	
2	75	-	-	-	-	90-100	100	-----	
3	63	0.000	0.00	0.00	100	25-60	90-100	100	
4	53	0.868	3.05	3.05	96.95	-----	25-75	95-100	
5	45	7.044	24.75	27.80	72.20	0-15	0-15	65-90	
6	22.4	18.001	63.25	91.05	8.95	0-5	0-5	0-10	
7	11.2	1.523	5.35	96.40	3.60	-----	-----	0-5	

Rajesh
15/1/2021

Regional Laboratory
R. W. D. Gulzarbagh Patna - 7

T. G. S.
15/1/2021

Regional Laboratory
R. W. D. Gulzarbagh Patna - 7

Rajesh
15/1/2021

Regional Laboratory
R. W. D. Gulzarbagh Patna - 7

Rajesh
15/1/2021

Regional Laboratory
R. W. D. Gulzarbagh Patna - 7

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER 15/11/2021

REGIONAL LABORATORY, R. W. D. GULZARBAGH, PATNA - 7

107 **PHYSICAL AND GRADATION TEST OF COARSE AGGREGATE**

Name of Project/Road :- Rakasiga to Kalyanpur

Name of Scheme :- MR-3034

Name of Agency :- Krishabh Nigaman Pvt. Ltd.

Nature of sample : Stone Metal GR-II

Date of Collection/Received on lab. :- 12/1/2021

Location/Chainage :- 800 m

Date of Test :- 15/11/2021

Ref :- Material sent by E.E./A.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division Patnagari

vide letter No. 115(125) S.12.2020

Agreement No / Package No. : 03/17020/2020-21

Sl. No.	A.I.V.	
	Average Test Value	Required Value(Max)
1.	22.1	40%

Sl. No	Sieve Size in (mm)	Weight of Sample Taken Kgs 29.615				Required Value			Remarks
		Weight Retained	% of Wt. Retained	% of Cum. Retained	% of Passing	Grading I	Grading II	Grading III	
1	125	—	—	—	—	100	—	—	
2	75	0.000	0.00	0.00	100	90-100	100	—	
3	63	2.147	7.25	7.25	92.75	25-60	90-100	100	
4	53	6.500	21.95	29.20	70.80	—	25-75	95-100	
5	45	16.940	57.20	86.40	13.60	0-15	0-15	65-90	
6	22.4	2.858	9.65	96.05	3.95	0-5	0-5	0-10	
7	11.2	—	—	—	—	—	—	0-5	

Rakish
L.A.
15/11/2021

[Signature]
A.D.
15/11/2021

[Signature]
A.E.
15/11/2021

[Signature]
E.E.
15/11/2021

Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh Patna - 7

Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh Patna - 7

Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh Patna - 7

Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh Patna - 7

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग
पटना-800007

पत्रांक : 104/1002

पटना/दिनांक : 15.12.2020

प्रेषक :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

सेवा में :

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमण्डल ...पालीगंज...

विषय :- जॉचफल प्रतिवेदन के संबंध में ।

प्रसंग :- A.C. Paligani vide letter no-115(अड) dt 5.12.2020

महाराज ,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में जॉचफल प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है जो निम्न प्रकार है:-

Rakasiya to Kalyanpur
Spun metal grill

अनु:-यथोक्त

विश्वासभाजन

18/12/20
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -7

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER 14/12/2019

REGIONAL LABORATORY, R.W.D. GULZARBAGH, PATNA - 7
11 D GRADING FOR GRANULAR SUB BASE MATERIAL

Name of Project/Road: Ranchi - Jharkhand
Name of Scheme: RR-100
Name of Agency: W.D. Gulzarbagh Date of Collection/Received on lab: 17.1.2020
Nature of sample: AS 8 GR 1/2 Date of Test: 18.1.2020
Location/Chainage: 907.19
Ref. Material sent by: E.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division - Patna
vide letter No: 110/24/56 2.12.2020
Agreement No./Package No.: 63/1046/2020-21

SI No	Sieve Size in (mm)	Weight of Sample Taken (g)			Required Value			Remarks
		Weight Retained	% of Wt. Retained	% of Cumulative Retained	% of Grading	Grading	Grading	
1	75	—	—	—	100	—	—	
2	53	0.000	0.000	0.000	100	100	—	
3	26.5	13464	41.75	41.75	55-75	50-80	100	
4	4.75	9240	28.65	28.65	10-30	15-35	25-45	
5	0.075	6369	19.75	19.75	<15	<15	<15	

A.I.V.		Remarks
Test Value	Required Value max (%)	
23.84	40 %	

14/12/2019
A.D.
Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh
Patna - 7

18/1/2020
A.E.
Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh
Patna - 7

18/1/2020
E.E.
Regional Laboratory
R.W.D. Gulzarbagh
Patna - 7

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग

पटना-800007

पत्रांक 103/म३

पटना/दिनांक 15.1.2021

प्रेषक

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना - 7

सेवा में

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग

कार्य प्रमण्डल, भारतगिरि...

विषय :- जॉयफल प्रतिवेदन के संबंध में।

प्रस्ताव :- A.C. Poligami vide letter no 113 (part) dt 7.12.2020

महोदय

उपरोक्त विषयक के संबंध में जॉयफल प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कारवाई हेतु भेजा जा रहा है जो निम्न प्रकार है:-

Relaxing to Kalyanpur
Station on 21.9.2021

अनु-यथावत

विरासभाऊ
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
क्षेत्रीय प्रयोगशाला, गुलजारबाग पटना -

Regional Laboratory
R.W.D. Gulljharbagh patna - 7
16/11/2021

Regional Laboratory
R.W.D. Gulljharbagh patna - 7
A.D.
16/11/2021

Regional Laboratory
R.W.D. Gulljharbagh patna - 7
A.E.
16/11/2021

Regional Laboratory
R.W.D. Gulljharbagh patna - 7
E.E.
16/11/2021

SL. NO.	SAMPLE NO.	1	2	3	4
		Wt. of mix taken before extraction (a)	509.00	510.00	512.00
		Wt. of Dry chips after extraction (b)	485.45	486.90	488.44
3		Percentage of bitumen (in the mix) [(a-b)*100] / a (%)	4.63	4.53	4.60
4		Average % bitumen	4.59		
		REMARKS	1	2	3

Ref :- Material sent by E.E./A.E. R.W.D. WORKS Division/Sub Division
 Name of Project/Road :- Kakasiga to Kalyanpur
 Name of Scheme :- M.R. 3054
 Name of Agency :- Kishori Nirmal Pvt. Ltd.
 Nature of sample :- Bitumen content for M.S.
 Location :-
 Agreement No / Package No. :
 Date of Test :- 16/11/2021
 Date of Collection/Received :- 12/11/2021
 vide letter No. 121(38) 8-12-2020
 REGIONAL LABORATORY, R. W. D. GULLJHARBAGH, PATNA - 7
 Bituminous mix
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
 Date 16/01/2021
