

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 394, अ/५०

रक्सौल, / दिनांक 18.03.2021

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभूजन,


18/3/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।


18/3/21

Raxaul

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul

Road Name- Kalwari gao to lakharura adapur reo path via dubaha gao, Contractor-M/S Ansar Construction

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Rate	Speed	OR	IRI,TEGORY	Latitude	ongitude	Event
17/3/21	18:50:31	25	0.1	210	0	2100	2440 G	26.88091	84.91493	Curve	$Y = 0 * X^2 + 0.863 * X + 628.2$
17/3/21	18:50:31	25	0.1	200	20.2	2000	2354 G	26.88157	84.91562	Normal	$X = 1930$
17/3/21	18:51:0	25	0.1	170	20.2	1700	2095 G	26.88245	84.91594	Normal	$Y = 2293$
17/3/21	18:51:5	25	0.1	280	10.1	2800	3044 G	26.8832	84.9164	Speed Breaker	
17/3/21	18:51:40	25	0.1	260	10.1	2600	2872 G	26.88394	84.91689	Curve	(R) RURAL ROAD
17/3/21	18:52:0	25	0.1	300	10.1	3000	3217 G	26.88455	84.91751	Speed Bre Good	Average Poor
17/3/21	18:52:16	25	0.1	220	20.2	2200	2526 G	26.88514	84.9182	Normal	<4000 4001-5000 >5001
17/3/21	18:52:16	25	0.1	280	30.3	2800	3044 G	26.88589	84.91867	Culvert	
17/3/21	18:54:1	25	0.1	270	30.3	2700	2958 G	26.88759	84.91973	Normal	
17/3/21	18:54:37	25	0.1	210	20.2	2100	2440 G	26.88801	84.92044	Normal	
17/3/21	18:54:37	25	0.1	230	30.3	2300	2613 G	26.88884	84.92079	Normal	
17/3/21	18:55:12	25	0.1	280	20.2	2800	3044 G	26.88937	84.9214	Curve	
17/3/21	18:55:12	25	0.057	110	20.2	1930	2293 G	26.88939	84.922	Normal	
		TOTAL IRI		34940							
		AVERAGE IRI		2687.69							

JE 17/3/21


AE 17/3/21

EXECUTIVE ENGINEER
RURAL WORK DEPARTMENT
WORKS DIVISION, RAXAUL
18.3.21

Name of Customer : M/S Ansur Construction
 Name of Work/ Road : Japur reo path via dubaha gao
 Lab Job number :
 Date : 17/03/2021
 Section No : 25

Test Date : 17-03-2021
 Machine No : 422
 Start S No : 000 PM
 Start E No : 1240
 Weather : Normal
 Start Location : 26.080907
 End Location : 64.922003
 Road Name : Japur reo path via dubaha gao
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side :
 Interval :
 UV Range : 1095 To 4000 mm/m
 Dist Range : 0 To 1.4
 Equation : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.863 \cdot X + 628.2$

File : C:\Users\BRRDA1\Downloads\Kaiwan gao to lokharura adapur reo path via dubaha gao.xls, Section No.
 Name of Customer : M/S Ansur Construction, Name of Work/ Road : Kaiwan gao to lokharura adapur reo path via

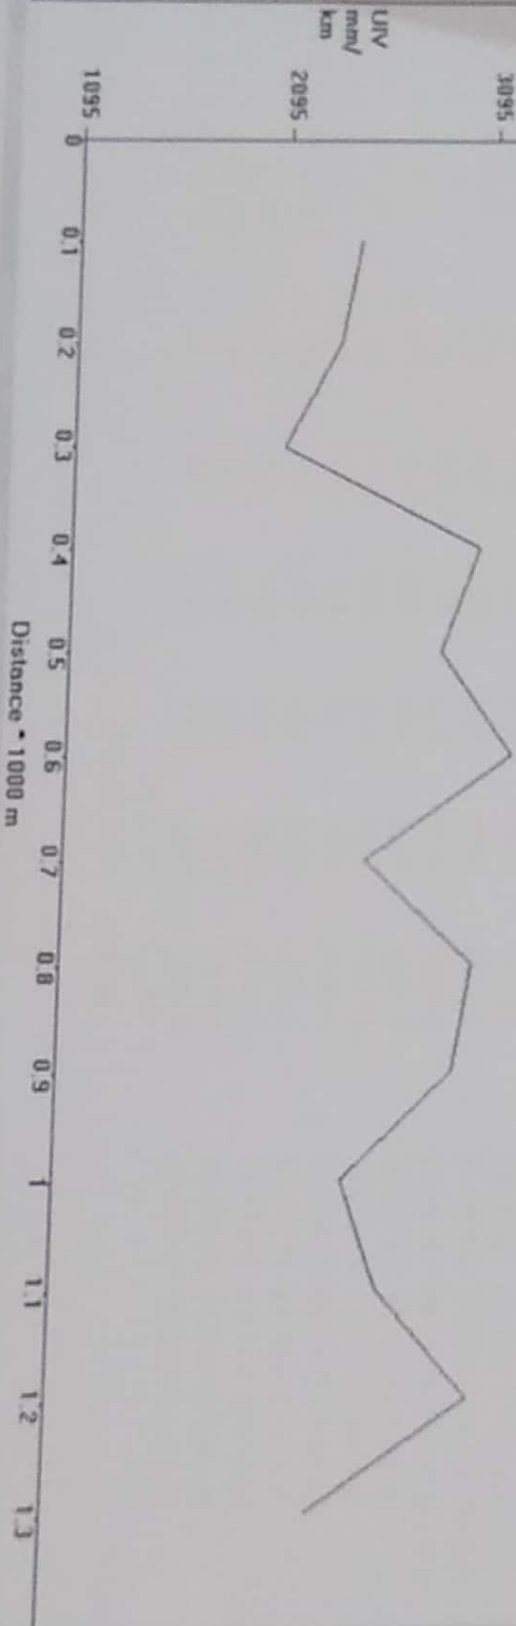

UV range (mm/m) vs Distance (1000 m)
 UV range (mm/m) vs Distance (1000 m)

17/3/21
 JE

17/3/21
 AE
