

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 394, अ/५०

रक्सौल, / दिनांक 18.03.2021

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।


महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभूजन,


18/3/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।


18/3/21

Raxaul

Executive Engineer,
Rural Works Department,
Works Division, Raxaul

ROAD NAME- SEKHWA TOLA TO BELDARWA, CONTRACTOR-M/S ANSAR CONSTRUCTION

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI in mm/km	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event	
17/3/21	8:44:43	43	0.1	210	0	2100	2205 G		26.94246	84.94498	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.998 * X + 109.5$
17/3/21	8:45:0	43	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.94325	84.9453	Curve	$X = 2100$
17/3/21	8:45:19	43	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.94401	84.9449	Curve	$Y = 2205$
17/3/21	8:45:19	43	0.1	210	20.2	2100	2205 G		26.94471	84.94547	Curve	
17/3/21	8:45:19	43	0.1	190	20.2	1900	2005 G	(R) RURAL ROAD	26.94513	84.94636	Normal	
17/3/21	8:46:0	43	0.1	280	20.2	2800	2903 G		26.94569	84.94715	Normal	Good
17/3/21	8:46:0	43	0.1	180	20.2	1800	1905 G		26.94622	84.94793	Normal	Average
17/3/21	8:46:30	43	0.1	200	30.3	2000	2105 G		26.94674	84.94936	Normal	Poor
17/3/21	8:47:0	43	0.1	170	20.2	1700	1806 G		26.94747	84.94985	Normal	
17/3/21	8:47:4	43	0.1	220	30.3	2200	2305 G		26.94827	84.95035	Normal	
17/3/21	8:47:4	43	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.94903	84.95081	Normal	
17/3/21	8:47:4	43	0.1	190	30.3	1900	2005 G		26.94987	84.95131	Normal	
17/3/21	8:48:15	43	0.1	180	20.2	1800	1905 G		26.95052	84.95204	Normal	
17/3/21	8:48:50	43	0.1	260	30.3	2600	2704 G		26.95135	84.95226	Speed Breaker	
17/3/21	8:49:0	43	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.95215	84.95276	Normal	
17/3/21	8:49:25	43	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.95298	84.95316	Speed Breaker	
17/3/21	8:49:25	43	0.1	230	20.2	2300	2404 G		26.95384	84.95338	Speed Breaker	
17/3/21	8:49:25	43	0.1	260	20.2	2600	2704 G		26.95457	84.95399	Normal	
17/3/21	8:50:0	43	0.1	220	20.2	2200	2305 G		26.9554	84.95429	Normal	
17/3/21	8:50:36	43	0.1	200	20.2	2000	2105 G		26.95627	84.95431	Normal	
17/3/21	8:50:36	43	0.1	210	30.3	2100	2205 G		26.95756	84.95439	Normal	
17/3/21	8:50:36	43	0.1	190	20.2	1900	2005 G		26.95842	84.95458	Normal	
17/3/21	8:51:11	43	0.1	190	20.2	1900	2005 G		26.95939	84.95475	Normal	
17/3/21	8:51:11	43	0.1	210	10.1	2100	2205 G		26.95941	84.95475	Normal	
		TOTAL IRI		52616								
		AVERAGE IRI		2192.33								

JE 17/3/21

AE 17/3/21

EXECUTIVE ENGINEER


RURAL WORK DEPARTMENT
WORKS DIVISION, RAXAUL

18.3.21

Name of Customer: M/S ANSAR CONSTRUCTION
 Name of Work: SEKHWA TOLA TOBELDARWA
 Road:
 Lab Job number:
 Date: 17-03-2021
 Section No. 43

Test Date:	17-03-2021	Road Name:	SEKHWA TOLA TOBELDARWA
Machine No:	387	Road Type:	(R) RURAL ROAD
Start S No:	0.000 KM	Side:	Interval
Start E No:	2.450 KM	UIV Range:	806 To 4000 1000 mm/km
Weather:	NORMAL	Dist Range:	0 To 25 01 -1000 m
Start Location:	26.94246	Equation:	$Y = 0 \cdot X^2 + 0.998 \cdot X + 109.5$
End Location:	84.954747		

File: D:\BuMP Indicator\Raaxaul\MS Ansar construction\17030856.Xls. Section No: 43. Eqn: $Y = 0 \cdot X^2 + 0.998 \cdot X + 109.5$
 Name of Customer: M/S ANSAR CONSTRUCTION, Name of Work/ Road: SEKHWA TOLA TOBELDARWA, Lab Job

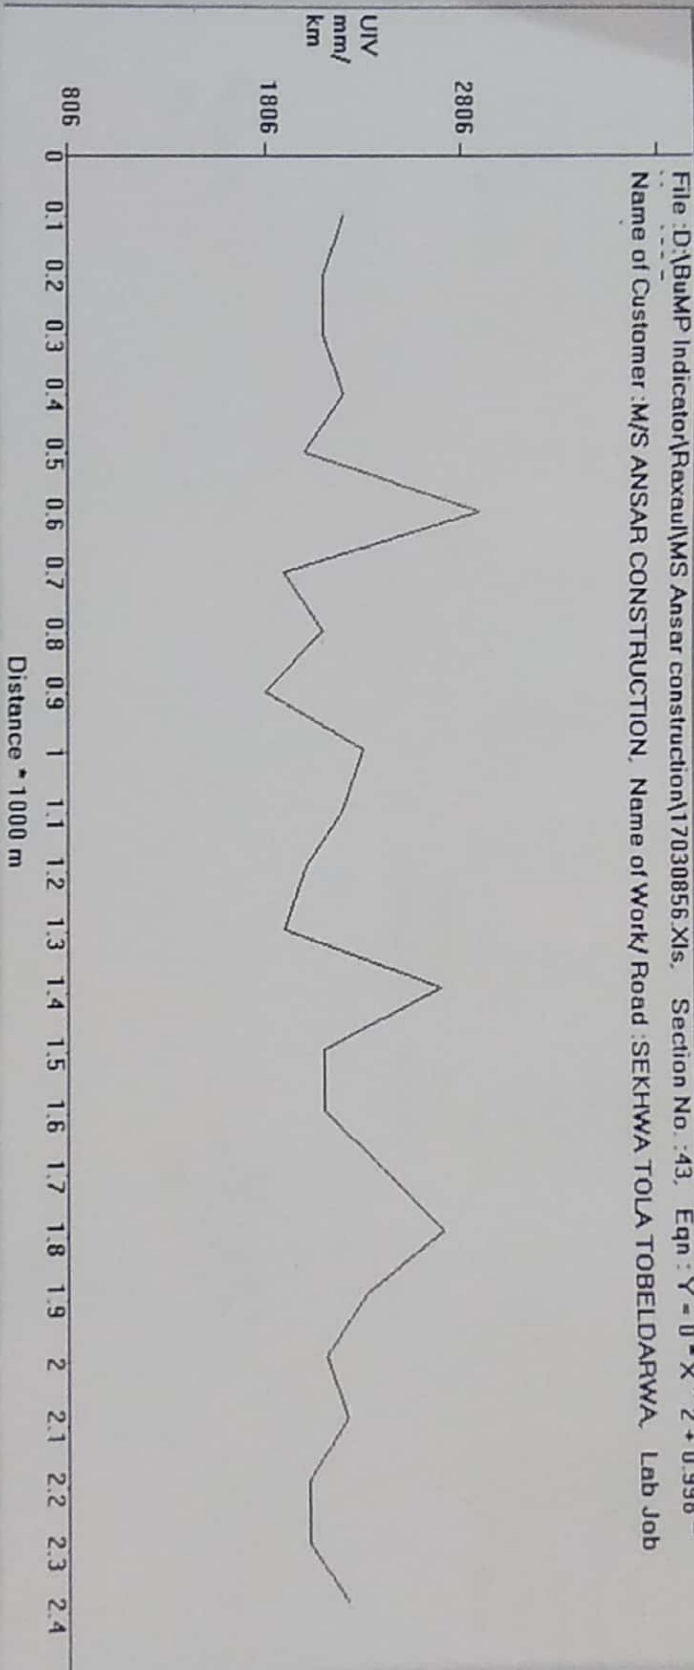

यह ग्राफ राखौल के इन्डिकेटर का है जो कि 17/3/21 को लिया गया है।
 यह ग्राफ जो राखौल के इन्डिकेटर का है जो कि 17/3/21 को लिया गया है।

17/3/21

AE 17/3/21

17/3/21
