

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महुआ।

पत्रांक.....1734...../

महुआ/दिनांक.....18...../08/2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महुआ।

सेवा में,


नोडल पदाधिकारी,
एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018,
विश्वेश्वरैया भवन,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : शीर्ष एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत पथ में कराये गए कार्य के विरुद्ध अधियाचना भेजने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष एम0आर0 3054 नई अनुरक्षण नीति 2018 अन्तर्गत पथ में कराये गए कार्य के विरुद्ध अधियाचना इस पत्र के साथ समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन,



18-08-22

कार्यपालक अभियंता

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,

महुआ।

Division Name: Rural Works Department, Works Division, Mahua

18-0872
Executive Engineer
R. W. D. Works Division, Mahua
18.08.22

Form GFR 19-A

(See Government of India's Decision (1) below Rule-150)

Form of Utilisation Certificate upto the month- 17.08.2022

STATE- BIHAR

SL. No	Name of Scheme	Sanction No. & Date With Amount (In Rs. Lacs)	Amount Received (In Rs.Lacs)	Particulars
1	Construction of Rural Roads under MR New Maintenance Policy 2018	Lt-22 Dated-08-08-2022 Amount- 81.96533	5598.06236	Certified that out of Rs. 5598.06236 Lacs of grants-in-aid sanctioned upto 12/2017 in favour of E-in-C, REO Bihar, Patna a sum of Rs.5496.89816 lacs has been utilized for the purpose of MR New Maintenance Policy 2018 Schemes as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs- 1.16420 lacs remaining unutilized at the end of the period under.
	Total:		5598.06236	



2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the gram-in-aid was sanctioned have

Kind of Checks exercised:-

- Works has been supervised by Executive Engineer/Superintending Engineer.
- Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending
- Construction materials have been tested.
- Measurements have been recorded in the MBs and test check conducted by the
- All other codal formalities have been observed.

3 **Physical Progress achived:-**

- Construction of Road Works.
- Construction of CD Works.

Divisional Account Officer
RWD. Works Division, Mahua
18-08-22Executive Engineer
RWD. Works Division, MahuaRWD
18/8/22

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम — CHEHRA KALA - KAMALPUR


योजना — एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018

कार्य प्रमंडल — महुआ।

प्रखंड — चेहराकला।

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।


क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	


20/07/22

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा-चेहराकला।


20/07/22

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, चेहराकला।


20.07.2022

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महुआ।

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
First and Final Bill					
N/W:- Chhtrakote To Karmalpur...					
Agency:- Ram Nareish Singh					
Agreement No:- 04/NBD/2020-21					
Package No:- 23					
Date of Start:- 11/05/2020					
Date of Completion:- 10/05/2021					
Actual Date of Completion:- 20/07/2022					

Abstract of cost

1. Clearing and grubbing of road land...

Vide T.M.B. P.N. (1) Item (1)

Qty = 0.74 Hect...

Rs 49496.70/Hect = Rs 36627.56

2. Construction of Sub-grade and Earthen Shoulder...

Vide T.M.B. P.N. (2) item (1/2)

Qty = 1553.40 m³

Rs 176.75/m³ = Rs 2,74,563.41

3. Construction of GSB by providing well graded Material.

Vide T.M.B. P.N. (3) item (1)

Qty = 61.35 m³

Rs 2103.35/m³ = Rs 1,29,040.5

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L.	B.	D.	
<u>20.</u>	600mm Circular...				
	Vide T.M.B. P.N. (13) item (5)				
	Qty = 4 Nos.				
	(5) Rs 3679.70/Each = Rs 14,718.80				
<u>21.</u>	600mm x 450mm Rectangular...				
	Vide T.M.B. P.N. (13) item (6)				
	Qty = 6 Nos.				
	(6) Rs 3550.58 3550.58/Each = Rs 21,303.48				
<u>22.</u>	Plantation of Tree and their Maintenance for one year...				
	Vide T.M.B. P.N. (14) Item (1)				

Qty = 185 Nos

(7) Rs 800.30/Each = Rs 1,48,055.50

Total = Rs 55,75,601.40

Add 12% G.S.T = Rs 6,69,072.17

Add 1% Labour Charge = Rs 55,756.01

Total = Rs 63,00,429.58

Less 10% Below = Rs (-) 6,30,042.96

Total = Rs 56,70,386.62

Say Rs 56,70,387.00

20/07/22 J.E. 20-07-22 20/07/22 A.E.

Name of the work: Chehrakala to Kamalpur

Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total Distance (meter)	EUMF (cm)	Speed (km/hr)	UI (mm/km)	Corrected UI (mm/km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction	Remarks
03-07-2022	09:18:59	2	0	0	0.0 cm	8.2 Km/hr	0.0 mm/km	125	0.236	Good	25.8940878 N		85.3974924 E	1	Normal
03-07-2022	09:21:54	2	100	100	17.0 cm	8.4 Km/hr	1700.0 mm/km	1670.3	2.388	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:22:12	2	100	200	17.0 cm	19.8 Km/hr	1700.0 mm/km	1670.3	2.388	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:22:38	2	100	300	27.0 cm	13.9 Km/hr	2700.0 mm/km	2579.3	3.52	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:22:54	2	100	400	11.0 cm	21.3 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:23:12	2	100	500	10.0 cm	21.0 Km/hr	1000.0 mm/km	1034	1.556	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:23:47	2	100	600	13.0 cm	10.3 Km/hr	1300.0 mm/km	1306.7	1.918	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:24:18	2	100	700	11.0 cm	11.2 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8900767 N		85.3965565 E		Normal
03-07-2022	09:24:41	2	100	800	13.0 cm	15.8 Km/hr	1300.0 mm/km	1306.7	1.918	Good	25.8844824 N		85.3945322 E		Normal
03-07-2022	09:25:11	2	100	900	4.0 cm	11.8 Km/hr	400.0 mm/km	488.6	0.797	Good	25.8843146 N		85.395537 E		Normal
03-07-2022	09:25:36	2	100	1000	8.0 cm	14.5 Km/hr	800.0 mm/km	852.2	1.31	Good	25.8840914 N		85.395692 E		Normal
03-07-2022	09:26:02	2	100	1100	12.0 cm	13.7 Km/hr	1200.0 mm/km	1215.8	1.799	Good	25.8840132 N		85.3974466 E		Normal
03-07-2022	09:26:35	2	100	1200	21.0 cm	11.0 Km/hr	2100.0 mm/km	2033.9	2.847	Good	25.8840132 N		85.3974466 E		Normal
03-07-2022	09:26:54	2	100	1300	11.0 cm	18.0 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8838149 N		85.3991861 E		Normal
03-07-2022	09:27:18	2	100	1400	17.0 cm	15.3 Km/hr	1700.0 mm/km	1670.3	2.388	Good	25.8838149 N		85.3991861 E		Normal
03-07-2022	09:27:49	2	100	1500	9.0 cm	11.2 Km/hr	900.0 mm/km	943.1	1.434	Good	25.8821097 N		85.3996439 E		Normal
03-07-2022	09:28:10	2	100	1600	9.0 cm	17.5 Km/hr	900.0 mm/km	943.1	1.434	Good	25.8821097 N		85.3996439 E		Normal
03-07-2022	09:28:32	2	100	1700	16.0 cm	16.2 Km/hr	1600.0 mm/km	1579.4	2.272	Good	25.8814059 N		85.397278 E		Normal
03-07-2022	09:28:50	2	100	1800	8.0 cm	19.8 Km/hr	800.0 mm/km	852.2	1.31	Good	25.8808775 N		85.4008112 E		Normal
03-07-2022	09:29:06	2	100	1900	8.0 cm	22.2 Km/hr	800.0 mm/km	852.2	1.31	Good	25.8805628 N		85.4016962 E		Normal
03-07-2022	09:29:35	2	100	2000	10.0 cm	12.3 Km/hr	1000.0 mm/km	1034	1.556	Good	25.8800555 N		85.4025202 E		Normal
03-07-2022	09:29:51	2	100	2100	18.0 cm	23.1 Km/hr	1800.0 mm/km	1761.2	2.504	Good	25.8794814 N		85.4033518 E		Normal
03-07-2022	09:30:08	2	100	2200	15.0 cm	20.2 Km/hr	1500.0 mm/km	1488.5	2.155	Good	25.8788901 N		85.4041681 E		Normal
03-07-2022	09:30:26	2	100	2300	11.0 cm	20.0 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8781825 N		85.4047708 E		Normal
03-07-2022	09:30:58	2	100	2400	12.0 cm	11.4 Km/hr	1200.0 mm/km	1215.8	1.918	Good	25.877471 N		85.4051752 E		Normal
03-07-2022	09:31:20	2	100	2500	13.0 cm	16.3 Km/hr	1300.0 mm/km	1306.7	1.918	Good	25.8767138 N		85.4058084 E		Normal
03-07-2022	09:31:47	2	100	2600	13.0 cm	13.1 Km/hr	1300.0 mm/km	1306.7	1.918	Good	25.8773528 N		85.4058084 E		Normal
03-07-2022	09:32:11	2	100	2700	12.0 cm	14.7 Km/hr	1200.0 mm/km	1215.8	1.799	Good	25.879201 N		85.4061365 E		Normal
03-07-2022	09:32:33	2	100	2800	18.0 cm	16.3 Km/hr	1800.0 mm/km	1761.2	2.504	Good	25.8800269 N		85.4068689 E		Normal
03-07-2022	09:32:53	2	100	2900	11.0 cm	18.3 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8809653 N		85.4073877 E		Normal
03-07-2022	09:33:28	2	100	3000	11.0 cm	10.3 Km/hr	1100.0 mm/km	1124.9	1.678	Good	25.8814269 N		85.4076853 E		Normal
03-07-2022	09:34:05	2	100	3100	25.0 cm	9.7 Km/hr	2500.0 mm/km	2397.5	3.298	Good	25.8823424 N		85.4079447 E		Normal
03-07-2022	09:34:35	2	100	3200	18.0 cm	12.1 Km/hr	1800.0 mm/km	1761.2	2.504	Good	25.8832121 N		85.4089365 E		Normal
03-07-2022	09:35:13	2	100	3300	18.0 cm	9.4 Km/hr	1800.0 mm/km	1761.2	2.504	Good	25.8834448 N		85.4089365 E		Normal
03-07-2022	09:35:50	2	100	3400	18.0 cm	9.6 Km/hr	1800.0 mm/km	1670.3	2.388	Good	25.8836356 N		85.4099436 E		Normal
03-07-2022	09:36:33	2	100	3500	17.0 cm	8.6 Km/hr	1700.0 mm/km	1670.3	2.388	Good	25.8837328 N		85.4106913 E		Normal
03-07-2022	09:37:10	2	100	3600	10.0 cm	9.5 Km/hr	1000.0 mm/km	1034	1.556	Good	25.8836794 N		85.4101114 E		Normal
03-07-2022	09:39:25	2	100	3700	10.0 cm	2.6 Km/hr	1000.0 mm/km	1034	1.556	Good					

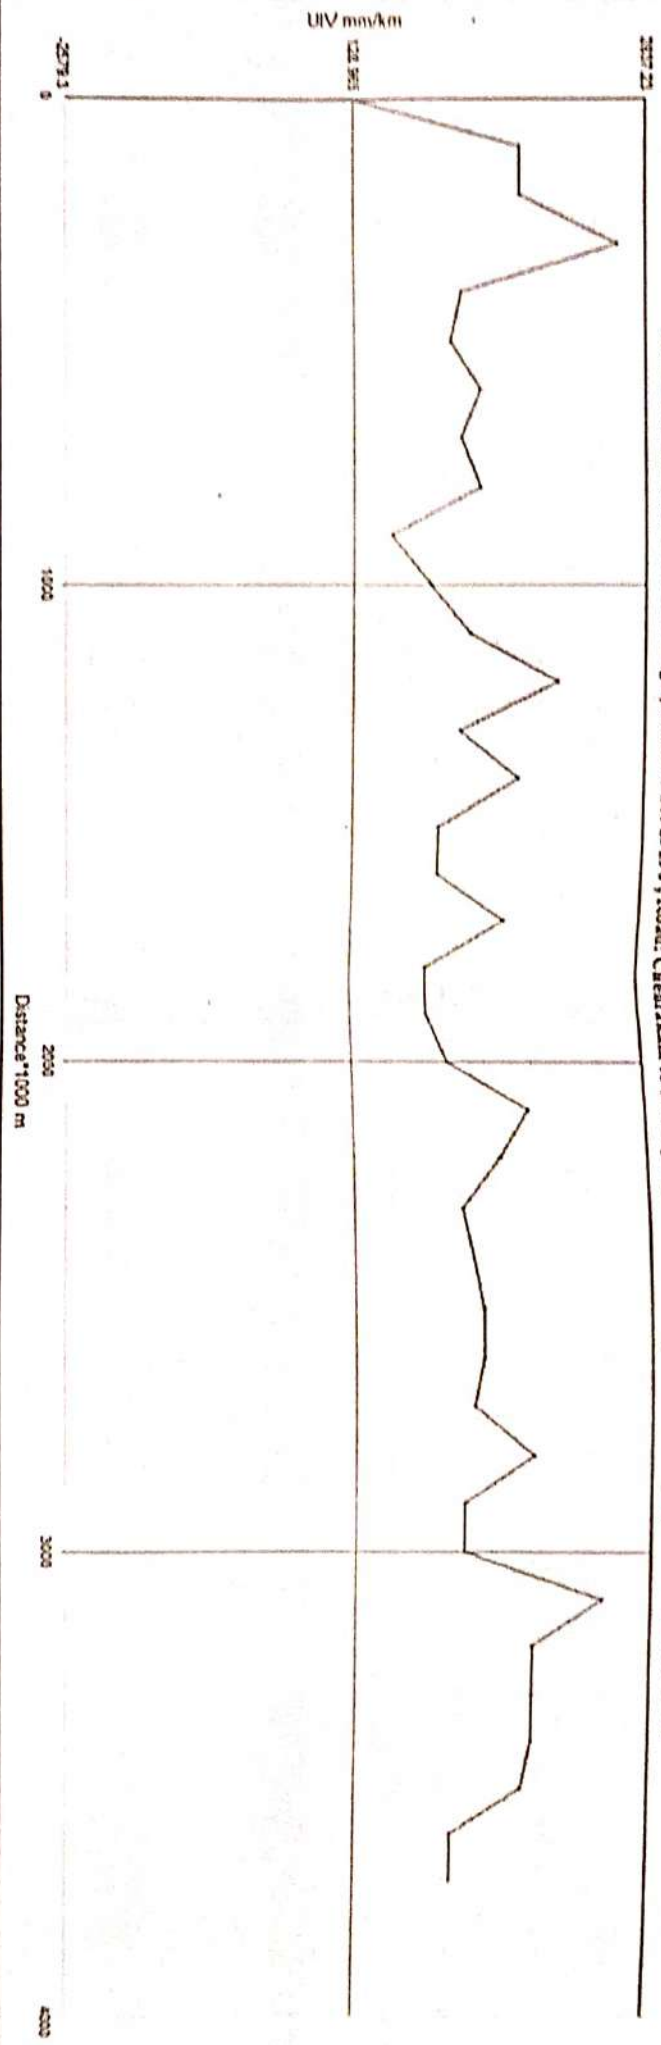
IRI Value 1930
Machine ID 19190

04/07/22
J.E.

04/07/22
J.E.

04-07-22

Name of Customer: Ram Naresh Singh, Machine no: 19190, Road: Chhatkila to Kamalpur, Date: 03-07-22, Section No: 2, Equation: $Y=0.909X+125.0$



04/07/22
J.E.

04/07/22
AE

04-07-22
