

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, महनार।

पत्रांक.....255.(अंक) महनार/दिनांक 10-03-2022

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (MR 3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
पटना, बिहार

विषय :- नई अनुरक्षण नीति-2018MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नई अनुरक्षण नीति-2018 MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के लिए संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासमाजन


10/03/22
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार।

Name of Works Division- Mahanar.

Resolution Format for Scheme Work- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter no. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion As per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In MM/Mm)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content at percentage	Previous Total Allowed Amount (In Lakh)	Up to date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In Lakh)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	R.M.V./N/0003	Lampara Chowk to Adipur Marwa	315771034285	6488/13-12-2019	1.3	31.0897	18.329	10.846	12/MBD/20-21/24-08-2020	23-May-21	-	2104	25 MM	5.036	0.000000	0.000000	16.86986	Surface Complete
2	R.M.V./N/0003	Pachauri PMD path on biobanjar chowk ghari utari chaur hoda bus stand bus stop area VDI	315771034286	6488/13-12-2019	2.5	76.834	50.094	21.633	12/MBD/20-21/24-08-2020	23-May-21	-	2589	25 MM	5.059	0.000000	0.000000	43.69330	Surface Complete
3	R.M.V./N/0005	E.O ROAD,SARA DHANERU,MACHHEL-BIRAHAPUR	31507702020	6488/13-12-2019	1.635	48.4233	30.957	14.287	15/MBD/20-21/28-08-2020	27-May-21	-	2241	25 MM	5.024	0.000000	0.000000	25.79247	Surface Complete
4	R.M.V./N/0005	Seray Dhanerua - BIRAHAPUR	31507602035	6488/13-12-2019	2.985	99.388	64.768	27.785	15/MBD/20-21/28-08-2020	27-May-21	-	2027	25 MM	5.009	0.000000	0.000000	49.62415	Surface Complete
Total					8.420	255.735	164.14800	74.55100							0.000000	0.000000	135.97978	

Divisional Accounts Officer
R.W.D.(W) Division
Mahanar.

24/10/2022

Executive Engineer
R.W.D.(W) Division
Mahanar.

24/10/2022

FORM GFR -19 -A

(see Govt. of India's decision (i) below rule 150)

Form of Utilisation Certificate as on 09.03.2022

New Maintenance Policy Through CFMS

PIU:- R.W.D. Works, Division, Mahnar

Sl. No.	Name of Scheme	Sanction No. & Date with amount (in Rs. Lakh)	Amount Received (in Rs. Lakh)	Particulars
1	2	3	4	5
1	Construction of Road Under New Maintenance Policy Scheme	1737.36276	1737.36276	Certified that out of Rs. 1737.36276 received till date in favour of Executive Engineer, R.W.D Works Division, Mahnar a sum of Rs. 1712.99965 has been utilized for the purpose of New Maintenance Policy Scheme as given in the margin for which it was sanctioned and that the balance of Rs. 24.36311 Lakh remaining unutilized at the end of the period under the time of completion
		1737.36276	1737.36276	


2 Certified that I have satisfied myself that the conditions on which the grants-in-aid was

Kind of Checks Exercised :-

- (i) Workers have been supervised by Executive Engineer/ Superintending Engineer
- (ii) Periodical inspection has been conducted by Executive Engineer/Superintending Engineer
- (iii) Construction materials have been tested.
- (iv) Measurements have been recorded in the MB's and test check conducted by the Assistant
- (v) All other codal formalities have observed

3 Physical Progress Achieved.

- (i) Construction of Road Works
- (ii) Construction of CD Works


10/3/22
Divisional Accounts Officer
Rural works Department
Works Division, mahnar


10/3/22
Executive Engineer
Rural works Department
Works Division, mahnar

name of the work: Saray Dhanesh to Bikanpur Tak

Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total Distance (meter)	BUMP (cm)	Speed/Km/Hr	Ull/mm/Km	Corrected UI (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction	Remarks
24/02/22	13:42:17	11	100	100	8.0 cm	9.8 Km/Hr	800.0 mm/Km	852.2	1.31	Good	25.7653246	N	85.3348322	E	Normal
24/02/22	13:42:33	11	100	200	5.0 cm	21.6 Km/Hr	500.0 mm/Km	579.5	0.93	Good	25.7653246	N	85.3348322	E	Normal
24/02/22	13:42:52	11	100	300	12.0 cm	19.6 Km/Hr	1200.0 mm/Km	1215.8	1.8	Good	25.7653246	N	85.3348322	E	Normal
24/02/22	14:38:51	11	100	400	10.0 cm	1.4 Km/Hr	1000.0 mm/Km	1034	1.56	Good	25.6795092	N	85.4566126	E	Normal
24/02/22	14:39:25	11	100	500	10.0 cm	10.2 Km/Hr	1000.0 mm/Km	1034	1.56	Good	25.6795092	N	85.4566126	E	Normal
24/02/22	14:39:47	11	100	600	17.0 cm	16.5 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.39	Good	25.6795092	N	85.4566126	E	Normal
24/02/22	14:40:10	11	100	700	6.0 cm	15.6 Km/Hr	600.0 mm/Km	670.4	1.06	Good	25.6795301	N	85.4597177	E	Normal
24/02/22	14:40:53	11	100	800	10.0 cm	8.2 Km/Hr	1000.0 mm/Km	1034	1.56	Good	25.6794233	N	85.4603205	E	Normal
24/02/22	14:41:13	11	100	900	19.0 cm	17.6 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.62	Good	25.6793718	N	85.4612284	E	Normal
24/02/22	14:41:48	11	100	1000	8.0 cm	10.7 Km/Hr	800.0 mm/Km	852.2	1.31	Good	25.6791754	N	85.4624186	E	Normal
24/02/22	14:42:08	11	100	1100	17.0 cm	18.0 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.39	Good	25.6790571	N	85.4634485	E	Normal
24/02/22	14:42:28	11	100	1200	20.0 cm	18.0 Km/Hr	2000.0 mm/Km	1943	2.73	Good	25.678916	N	85.4637079	E	Normal
24/02/22	14:42:47	11	100	1300	13.0 cm	18.4 Km/Hr	1300.0 mm/Km	1306.7	1.92	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:43:06	11	100	1400	11.0 cm	19.2 Km/Hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.68	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:43:25	11	100	1500	21.0 cm	18.0 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2033.9	2.85	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:43:43	11	100	1600	16.0 cm	20.6 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.27	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:45:07	11	100	1700	17.0 cm	4.5 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.39	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:45:31	11	100	1800	24.0 cm	14.7 Km/Hr	2400.0 mm/Km	2306.6	3.19	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:45:50	11	100	1900	21.0 cm	18.3 Km/Hr	2100.0 mm/Km	2033.9	2.85	Good	25.6786585	N	85.4652033	E	Normal
24/02/22	14:46:24	11	100	2000	16.0 cm	10.6 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.27	Good	25.6786585	N	85.4726419	E	Normal
24/02/22	14:46:43	11	100	2100	16.0 cm	19.4 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.27	Good	25.6786585	N	85.473794	E	Normal
24/02/22	14:47:05	11	100	2200	20.0 cm	16.3 Km/Hr	2000.0 mm/Km	1943	2.73	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:47:22	11	100	2300	12.0 cm	20.4 Km/Hr	1200.0 mm/Km	1215.8	1.8	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:47:40	11	100	2400	11.0 cm	20.2 Km/Hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.68	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:48:02	11	100	2500	11.0 cm	16.5 Km/Hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.68	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:48:18	11	100	2600	10.0 cm	21.8 Km/Hr	1000.0 mm/Km	1034	1.56	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:48:40	11	100	2700	17.0 cm	16.6 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.39	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:49:00	11	100	2800	17.0 cm	17.6 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.39	Good	25.6786585	N	85.4744806	E	Normal
24/02/22	14:52:18	11	100	2900	11.0 cm	1.8 Km/Hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.68	Good	25.6786585	N	85.4799967	E	Normal

24/02/22
14:52:18
2900

24/02/22
14:52:18
2900

24/02/22
14:52:18
2900

IRI Value
Machine ID
2027
19190

3.7499

Name of Customer: Angel Engkon Pelled, Machine no: 19190, Road: Sarray Dhasanah to Bilarangan Taluk, Date: 24/02/22, Section No: 12, Equation: $Y=0.909X+125.0$

DE 0.17045

-3.409
100

1056
Distance=1000 m

22/02/22
J.C. Pineda

22/02/22
J.C. Pineda

10/12
Jm

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम - Saray Dhanesh - Bikrampur


योजना - एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018

कार्य प्रमंडल - महनार।


प्रखंड - सरदर गुप्ति

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।

क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	


23/07/22
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा-


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,


10/03/22
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम - R.E.O ROAD, SARA DHANESH (BAGHEL) - BIKRAMPUR

योजना - एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018

कार्य प्रमंडल - महनार।

प्रखंड - सहदेई गुल्मी

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।

क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	

23/02/2022
कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा-

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार

of the work: R.E.O Saray Dhanech(Baghet) to Bilsampur Tal

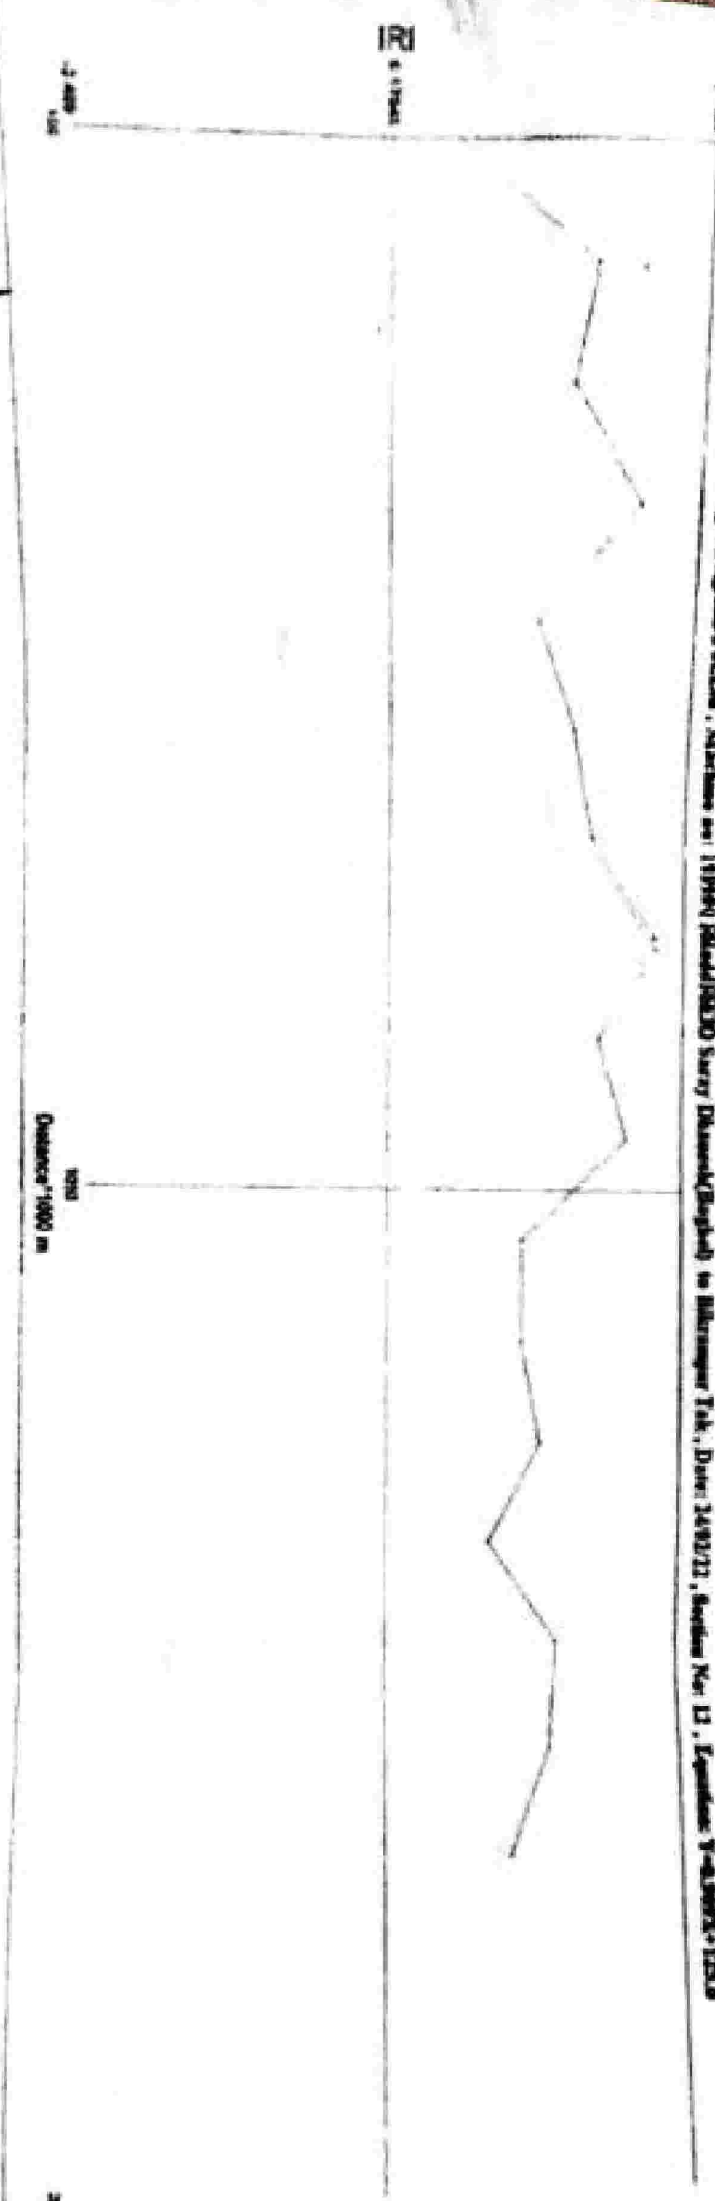
Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total Distance (meter)	BUMP (cm)	Speed/Km/Hr	UI(mm/Km)	Corrected UI (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction	Remarks
24/02/22	14:58:17	12	100	100	5.0 cm	11.5 Km/Hr	500.0 mm/Km	579.5	0.928	Good	25.6788378	N	85.4638224	E	Normal
24/02/22	14:58:57	12	100	200	18.0 cm	9.0 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.504	Good	25.6785402	N	85.4625017	E	Normal
24/02/22	14:59:17	12	100	300	16.0 cm	17.6 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.272	Good	25.6785402	N	85.4626017	E	Normal
24/02/22	14:59:36	12	100	400	23.0 cm	19.8 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2215.7	3.074	Good	25.6786894	N	85.4618845	E	Normal
24/02/22	14:59:53	12	100	500	23.0 cm	20.2 Km/Hr	2300.0 mm/Km	1306.7	1.918	Good	25.6780588	N	85.461381	E	Normal
24/02/22	15:00:18	12	100	600	17.0 cm	14.8 Km/Hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.388	Good	25.6750784	N	85.4611368	E	Normal
24/02/22	15:00:38	12	100	700	19.0 cm	17.8 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.619	Good	25.6750174	N	85.4611139	E	Normal
24/02/22	15:01:00	12	100	800	26.0 cm	16.6 Km/Hr	2600.0 mm/Km	2488.4	3.409	Good	25.6733084	N	85.460969	E	Normal
24/02/22	15:01:22	12	100	900	20.0 cm	16.2 Km/Hr	2000.0 mm/Km	1943	2.734	Good	25.6724043	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:01:47	12	100	1000	23.0 cm	14.2 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2215.7	3.074	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:02:09	12	100	1100	12.0 cm	16.8 Km/Hr	1200.0 mm/Km	1215.8	1.799	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:02:30	12	100	1200	12.0 cm	16.5 Km/Hr	1200.0 mm/Km	1215.8	1.799	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:03:07	12	100	1300	14.0 cm	9.8 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1397.6	2.037	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:03:44	12	100	1400	9.0 cm	10.2 Km/Hr	900.0 mm/Km	943.1	1.434	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:04:05	12	100	1500	16.0 cm	16.5 Km/Hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.272	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:04:29	12	100	1600	15.0 cm	15.1 Km/Hr	1500.0 mm/Km	1488.5	2.155	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal
24/02/22	15:04:50	12	100	1700	11.0 cm	17.1 Km/Hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.678	Good	25.6719255	N	85.4608545	E	Normal

IRI Value 2241
Machine ID 19190

22/02/22
10/05/22

10/05/22

Name of Customer: Royal Engineers Field, Machine no: 191949 R144330 Survey District(District) is Birmingham Td, Date: 24/02/11, Section No: 11, Episodes: Y-A-0072, 1213



22/2/22

19/11/22

pm
10/03/12

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम - Paharpur PWD path se bishanpur doma ghat uttri chor hote hue
sahdei buzurg sima tak

योजना -

एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018

कार्य प्रमंडल -

महनार।

प्रखंड =

सहजद

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा
मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।

क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	

R Singh
31/3/22

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य प्रशाखा-

R Singh
31/3/22

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,

कार्य अवर प्रमंडल,

J N
31/3/22

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार

one work: Pithampur PWD path se bishanpur doma ghat uttri chor hote hue sahel buang sima tak

Date	Time	Test No	Distance (meter)	Total		BUMP (cm)	Speed (km/hr)	UI (mm/Km)	Corrected UI (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude	Direction	Remarks
				Distance (meter)	Distance (cm)											
3/3/2022	16:50:34	8	100	100	11.0 cm	4.2 Km/hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.678	Good	25.6905279	N	N	85.5726862	E	Normal
3/3/2022	16:51:10	8	100	200	20.0 cm	10.0 Km/hr	2000.0 mm/Km	1943	2.734	Good	25.6905279	N	N	85.5726862	E	Normal
3/3/2022	16:51:31	8	100	300	18.0 cm	17.1 Km/hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.504	Good	25.6905279	N	N	85.5726862	E	Normal
3/3/2022	16:51:53	8	100	400	13.0 cm	16.3 Km/hr	1300.0 mm/Km	1306.7	1.918	Good	25.6905279	N	N	85.5726862	E	Normal
3/3/2022	16:52:19	8	100	500	17.0 cm	13.9 Km/hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.388	Good	25.6481619	N	N	85.4982233	E	Normal
3/3/2022	16:53:03	8	100	600	15.0 cm	8.1 Km/hr	1500.0 mm/Km	1488.5	2.155	Good	25.647624	N	N	85.4971399	E	Normal
3/3/2022	16:53:26	8	100	700	14.0 cm	15.7 Km/hr	1400.0 mm/Km	1397.6	2.037	Good	25.6474085	N	N	85.4963083	E	Normal
3/3/2022	16:53:46	8	100	800	19.0 cm	18.0 Km/hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.619	Good	25.647357	N	N	85.4956064	E	Normal
3/3/2022	16:54:09	8	100	900	24.0 cm	15.5 Km/hr	2400.0 mm/Km	2306.6	3.186	Good	25.6471128	N	N	85.4950724	E	Normal
3/3/2022	16:54:34	8	100	1000	16.0 cm	14.6 Km/hr	1600.0 mm/Km	1579.4	2.272	Good	25.6470919	N	N	85.493165	E	Normal
3/3/2022	16:55:36	8	100	1100	28.0 cm	5.5 Km/hr	2800.0 mm/Km	2670.2	3.631	Good	25.6471815	N	N	85.4917994	E	Normal
3/3/2022	16:56:09	8	100	1200	13.0 cm	11.2 Km/hr	1300.0 mm/Km	1306.7	1.918	Good	25.6471815	N	N	85.4917994	E	Normal
3/3/2022	16:56:35	8	100	1300	20.0 cm	13.8 Km/hr	2000.0 mm/Km	1943	2.734	Good	25.6479101	N	N	85.4907236	E	Normal
3/3/2022	16:57:03	8	100	1400	30.0 cm	12.7 Km/hr	3000.0 mm/Km	2852	3.851	Good	25.6491995	N	N	85.4908991	E	Normal
3/3/2022	16:57:36	8	100	1500	9.0 cm	10.9 Km/hr	900.0 mm/Km	943.1	1.434	Good	25.6499033	N	N	85.4910822	E	Normal
3/3/2022	16:58:17	8	100	1600	29.0 cm	9.0 Km/hr	2900.0 mm/Km	2761.1	3.741	Good	25.6505098	N	N	85.4909372	E	Normal
3/3/2022	16:58:44	8	100	1700	22.0 cm	12.9 Km/hr	2200.0 mm/Km	2124.8	2.961	Good	25.6505098	N	N	85.4909372	E	Normal
3/3/2022	17:02:32	8	100	1800	33.0 cm	1.5 Km/hr	3300.0 mm/Km	3124.7	3.178	Good	25.6508398	N	N	85.4893579	E	Normal
3/3/2022	17:03:41	8	100	1900	17.0 cm	9.8 Km/hr	1700.0 mm/Km	1670.3	2.388	Good	25.6509523	N	N	85.4875345	E	Normal
3/3/2022	17:04:43	8	100	2000	11.0 cm	5.7 Km/hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.678	Good	25.6511641	N	N	85.48594	E	Normal
3/3/2022	17:05:40	8	100	2100	18.0 cm	6.5 Km/hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.504	Good	25.6513681	N	N	85.4849939	E	Normal
3/3/2022	17:10:43	8	100	2200	11.0 cm	9.6 Km/hr	1100.0 mm/Km	1124.9	1.678	Good	25.6514463	N	N	85.4846048	E	Normal
3/3/2022	17:11:21	8	100	2300	26.0 cm	1.3 Km/hr	2600.0 mm/Km	2488.4	3.409	Good	25.6514463	N	N	85.4846048	E	Normal
3/3/2022	17:11:21	8	100	2400	18.0 cm	9.4 Km/hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.504	Good	25.6514463	N	N	85.4846048	E	Normal
3/3/2022	17:12:12	8	100	2500	19.0 cm	6.9 Km/hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.619	Good	25.6512461	N	N	85.4856119	E	Normal

13/3/22
NT

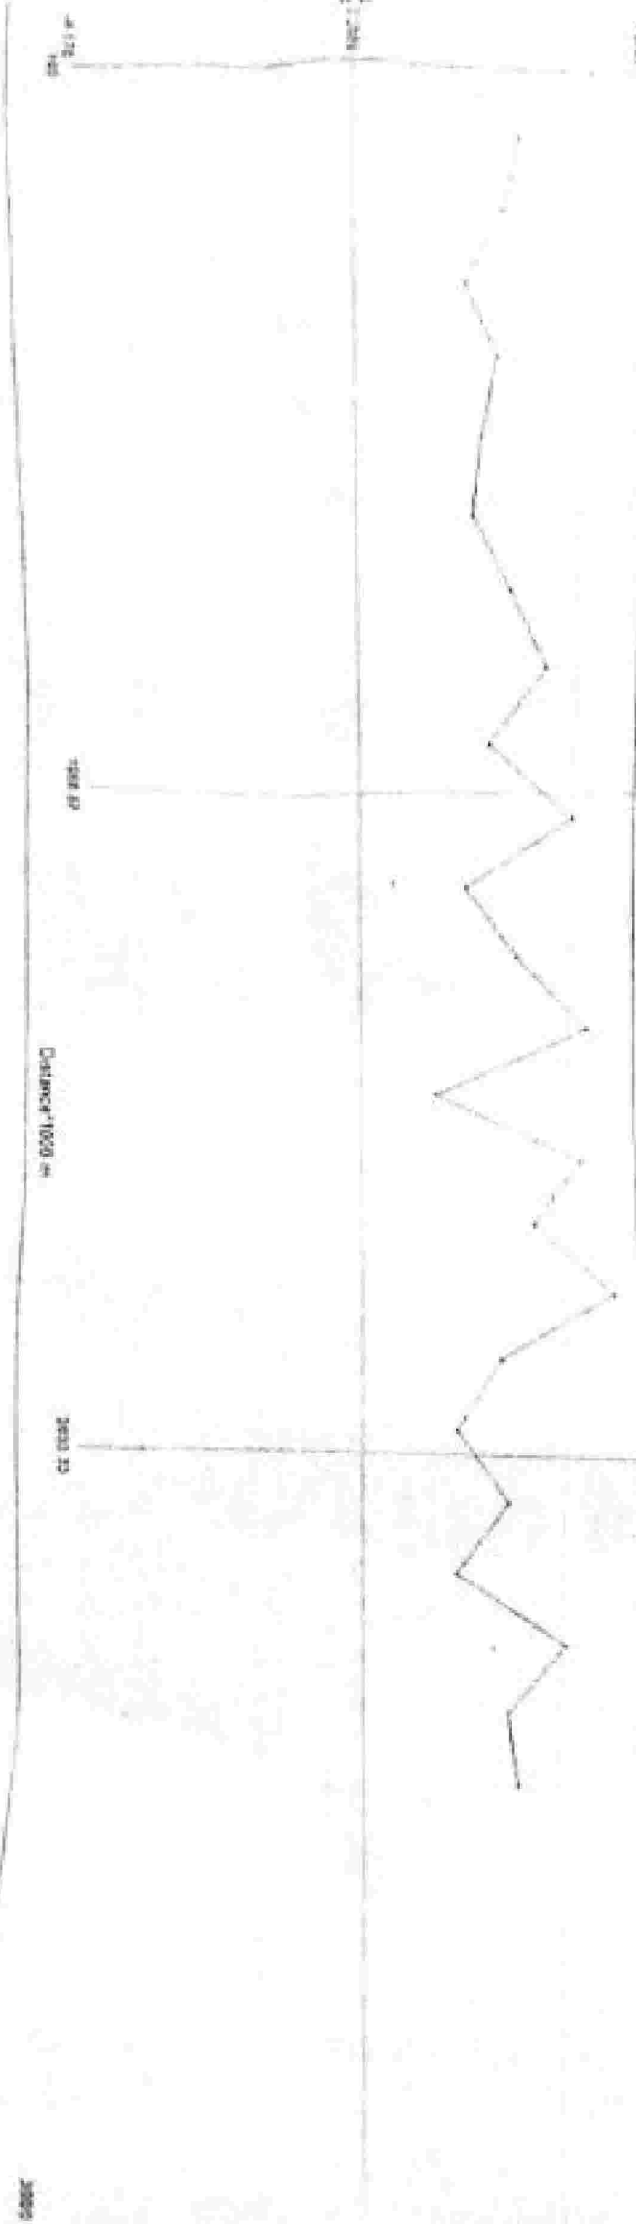
15/3/22
NT

16/3/22

IRI Value
Machine ID

2589
19190

of Customer: M S MARTI ENTERPRISES, Machine no: 19190, Road: Pakarpur PWD path se bisharpur down ghari uttar char kote hase sabdar bhangr sima tak, Date: 03/03/22, Section No: 8, Equation: $V=0.909X+124$



Rough
 13/3/22
 ME

05/03/22
 ME
 [Signature]

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम - Lavapur chowk to Alipur Hatta

योजना - एम0आर0 (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018

कार्य प्रमंडल - महनार।


प्रखंड - महनार

उक्त पथ में कराये गये सभी अवयवों के अवयववार कार्य निम्नलिखित पदाधिकारी द्वारा मापी पुस्तिका से सत्यापन किया गया।

क्र0	पदनाम	कराये गये कार्य के मापी पुस्तिका से सत्यापन की प्रतिशत	अभ्युक्ति
1	कनीय अभियंता	100 प्रतिशत	
2	सहायक अभियंता	50 प्रतिशत	
3	कार्यपालक अभियंता	10 प्रतिशत	


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा-


सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल,


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, महनार

Road Condition Report to Alipur Hatta												
Date	Test No.	Distance (meter)	Total Distance (meter)	BUMP (cm)	Speed/Km/Hr	UI (mm/Km)	Corrected UI (mm/Km)	IRI	Status	Latitude	Direction	Longitude
3/3/2022	9	100	100	23.0 cm	7.1 Km/Hr	2300.0 mm/Km	2215.7	3.07	Good	25.6014338	N	85.5067377
3/3/2022	9	100	200	14.0 cm	7.7 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1397.6	2.04	Good	25.6014338	N	85.5067377
3/3/2022	9	100	300	19.0 cm	4.5 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.62	Good	25.6014338	N	85.5067377
3/3/2022	9	100	400	10.0 cm	12.4 Km/Hr	1000.0 mm/Km	1034	1.56	Good	25.6014338	N	85.5067377
3/3/2022	9	100	500	19.0 cm	11.2 Km/Hr	1900.0 mm/Km	1852.1	2.62	Good	25.6014338	N	85.5067377
3/3/2022	9	100	600	18.0 cm	6.6 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.5	Good	25.597291	N	85.505662
3/3/2022	9	100	700	18.0 cm	4.3 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.5	Good	25.5956602	N	85.505372
3/3/2022	9	100	800	14.0 cm	6.9 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1397.6	2.04	Good	25.5948133	N	85.5050287
3/3/2022	9	100	900	12.0 cm	9.3 Km/Hr	1200.0 mm/Km	1215.8	1.8	Good	25.5945883	N	85.5049295
3/3/2022	9	100	1000	15.0 cm	9.9 Km/Hr	1500.0 mm/Km	1488.5	2.16	Good	25.5945883	N	85.5049295
3/3/2022	9	100	1100	18.0 cm	5.9 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.5	Good	25.5945883	N	85.5049295
3/3/2022	9	100	1200	18.0 cm	0.8 Km/Hr	1800.0 mm/Km	1761.2	2.5	Good	25.5917253	N	85.50319
3/3/2022	9	100	1300	14.0 cm	5.8 Km/Hr	1400.0 mm/Km	1397.6	2.04	Good	25.5927095	N	85.5037775

IRI Value
Machine ID

2304
19190

Direction 1 Remarks

Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

3/3/2022
NE

3/3/2022
10/03

Name of Contractor: **M/S MARTI ENTERPRISES**, Machine no: 10190, Road Layout check to **Alpura Hana**, Date: 01/03/22, Section No. 9, Elevation: **Y=0.500X-125.0**

Distance = 1000 m

Revised
01/03/22
JE

Ad
5/3/22
AE

fm
10/03/22
