

पत्रांक ४५४ (अकृ.)

शेखपुरा, दिनांक 27/05/2023 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

*उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 77,49,979/- (सतहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ उनासी रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 77,49,979/- (सतहत्तर लाख उनचास हजार नौ सौ उनासी रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।


अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा

प्रमाण-पत्र


पथ का नाम :- टी02-सरिका पथ।

लम्बाई :-2.438 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।

म.क.न.
29/5/23
जे


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रम०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IR1 in MN/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	MR-N/22-23, Sheikhpura/12	T02- Sarika	20803902145	Letter no.- 1519, dt.08.09.22	2.438	127.720	82.35838	24.54697	29(MBD)/ 22-23 24.02.2023	23.11.2023	---	2775.46	25	5.015	0	0	74.49979	
																	74.49979	

BB
29/05/23

Mh
29/5/23
SR

27-5-23

RWD Works Division,
Sheikhpura


Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Name of Road :- T02- Sarika
Section no.-65

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
27/5/23	11:11:8	65	0.1	270	0	2700	2724	G	25.173376	85.787129	Normal
27/5/23	11:12:33	65	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.172898	85.787683	Curve
27/5/23	11:13:14	65	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.172356	85.788851	Normal
27/5/23	11:13:46	65	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.172613	85.789999	Normal
27/5/23	11:14:21	65	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.172739	85.790844	Normal
27/5/23	11:14:51	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.172499	85.791855	Normal
27/5/23	11:15:16	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.171878	85.793664	Normal
27/5/23	11:15:49	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.171872	85.794501	Curve
27/5/23	11:16:11	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.172887	85.794624	Normal
27/5/23	11:16:52	65	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.173737	85.795255	Curve
27/5/23	11:17:13	65	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.174403	85.795375	Normal
27/5/23	11:17:49	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.174878	85.79543	Normal
27/5/23	11:18:7	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.175561	85.795421	Normal
27/5/23	11:18:55	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.176463	85.795633	Curve
27/5/23	11:19:9	65	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.177076	85.795713	Normal
27/5/23	11:19:44	65	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.178061	85.795787	Normal
27/5/23	11:20:12	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.178859	85.795872	Curve
27/5/23	11:20:45	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.179646	85.795958	Normal
27/5/23	11:21:16	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.180466	85.796284	Curve

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
27/5/23	11:21:59	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.181041	85.796471	Normal
27/5/23	11:22:18	65	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.181687	85.796668	Normal
27/5/23	11:22:57	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.182195	85.796758	Normal
27/5/23	11:23:14	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.182777	85.796828	Normal
27/5/23	11:23:56	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.184527	85.797058	Normal
Total =			2.400	Km	Avg. 2775.46						

14/5/23
6:59:59 PM
SR


Executive Engineer
R.W.D.(W) Division,
Sheikhpura

Steco Analyzer

Name of Customer : Ghanshyam Singh
Name of Work/ Road : T02- Sarika
Lab Job number : 65
Date : 27.05.2023
Section No. : 65

Test Date : 27.05.2023
Machine No : 399
Start S No :
Start E No :
Weather :
Start Location :
End Location :
Road Name : T02- Sarika
Road Type : (R) RURAL ROAD
Side :
UIV Range : 1520 To 4000 mm/km
Dist Range : 0 To 2.5 0.1 * 1000 m
Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$


Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\T02 To Sarika\27051123.xls, Section No. : 65, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$

Name of Customer : Ghanshyam Singh, Name of Work/ Road : T02- Sarika, Lab Job number : 65

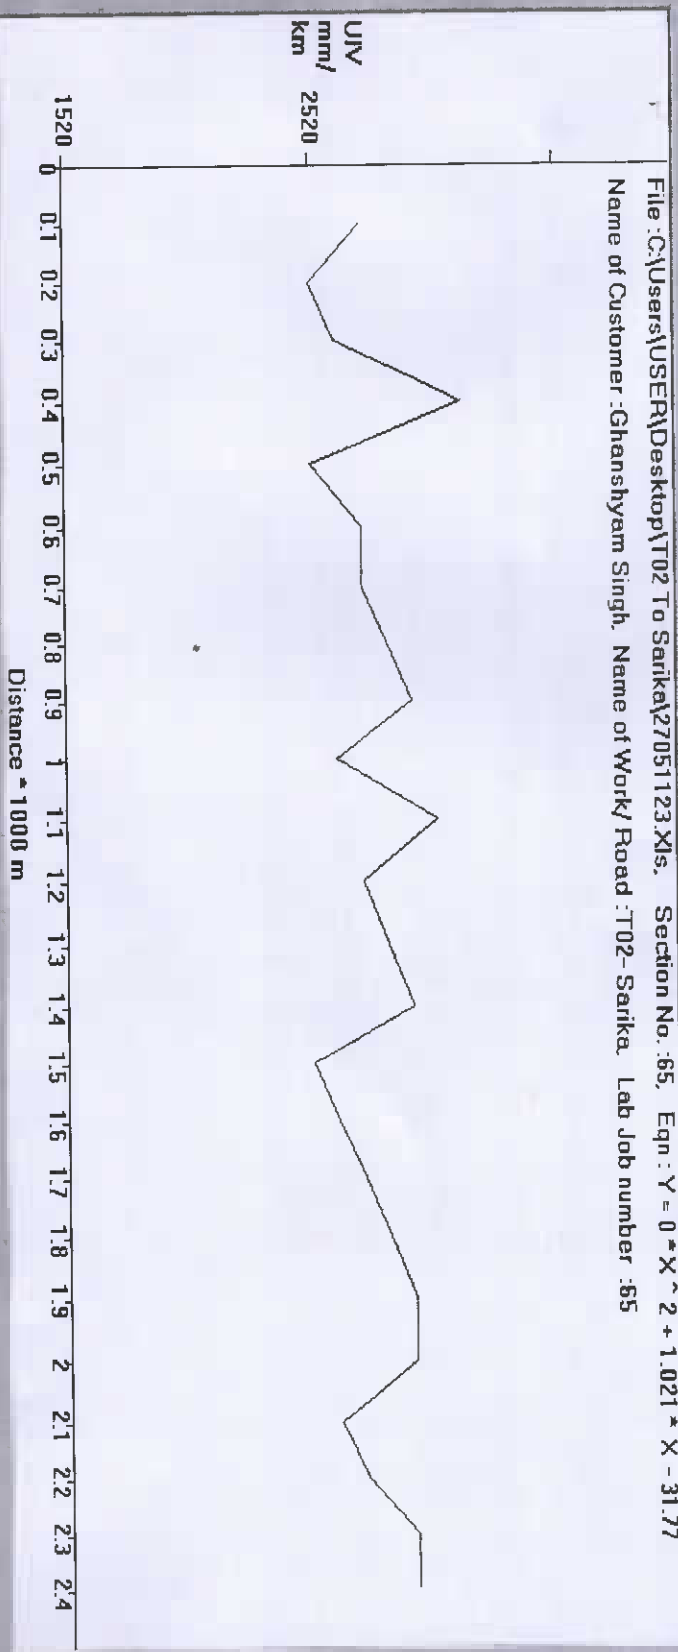

17/05/2023
SR

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Sheikhpura
