

पत्रांक 2305 (अव०) /

शेखपुरा, दिनांक 09/11/2023 /

प्रेषक:-

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 1,51,05,885/- (एक करोड़ एकावन लाख पाँच हजार आठ सौ पचासी रुपये) मात्र की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 1,51,05,885/- (एक करोड़ एकावन लाख पाँच हजार आठ सौ पचासी रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि कराये गये कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

मक
9/11/23
जे

विश्वासभाजन

ई० विमल कुमार


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- Sheikhpura Mehus RCD Road To Tanti Hathiyama RCD Road.
लम्बाई :- 2.00 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


(ई० विमल कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रम०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division: Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Amount Allotted (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Sheikhpura/03	Sheikhpura Mehus RCD Road To Tanti Hathiyama RCD Road	28391899980	Letter no.- 2328, dt.04.05.2023	2.000	193.477	151.05885	30.59503	11(MBD)/23-24 03.08.2023	02.05.2024	---	2806.2	25	5.015	0	0	151.05885	
																	151.05885	

8/5
09/11/23
D.A.O.
RWD Works Division,
Sheikhpura

14/11/23
09/11/23
Jr

10/11/23
9.11.23
Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Steco Analyzer

Name of Customer : Birendra Kumar

Name of Work/Road : Sheikhpura Mehur RCD Road

Lab Job number : 65

Date : 08.11.2023

Section No. : 65

Test Date : 08.11.2023

Road Name : Sheikhpura Mehur RCD Road

Machine No : 399

Road Type : (R) RURAL ROAD

Start S No :

Side :

Start E No :

Interval :

Weather :

UV Range : 1520 To 4000 mm/km

Dist Range : 0 To 2.1 0.1 * 1000 m

Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$


Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\Sheikhpura Mehur RCD Road To Tanti Hathiyama RCD Road\08111227.Xls. Section Name of Customer : Birendra Kumar. Name of Work/Road : Sheikhpura Mehur RCD Road To Tanti Hathiyama RCD

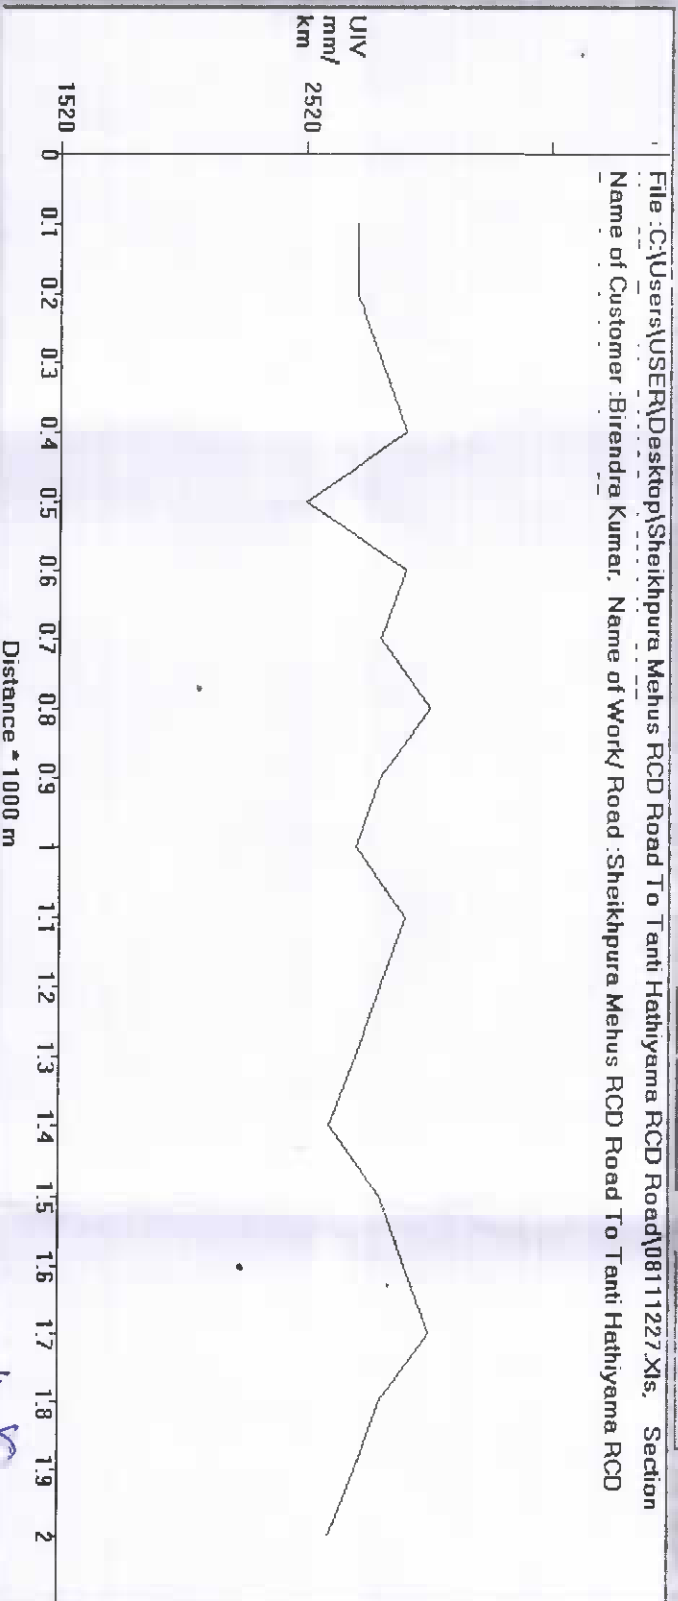

9/11/23

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Sheikhpura

Name of Road :- Sheikhupura Mehru RCD Road To Tanti Hathiya Road
Section no.-65

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
8/11/23	12:17:43	65	0.1	270	0	2700	2724	G	25.174432	85.827752	Normal
8/11/23	12:18:6	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.174093	85.826969	Normal
8/11/23	12:18:47	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.173627	85.82647	Curve
8/11/23	12:19:8	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.173802	85.825434	Normal
8/11/23	12:19:41	65	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.173955	85.8242	Normal
8/11/23	12:20:5	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.173897	85.822867	Normal
8/11/23	12:20:49	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.173359	85.822533	Normal
8/11/23	12:21:10	65	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.172461	85.821475	Curve
8/11/23	12:21:52	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.17309	85.82185	Normal
8/11/23	12:22:10	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.172172	85.821554	Curve
8/11/23	12:22:32	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.171811	85.820954	Normal
8/11/23	12:23:2	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.171762	85.820371	Normal
8/11/23	12:23:45	65	0.1	270	20.2	2700	2724	G	25.171753	85.819487	Normal
8/11/23	12:24:5	65	0.1	260	20.2	2600	2622	G	25.171669	85.818495	Normal
8/11/23	12:24:41	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.171347	85.817059	Curve
8/11/23	12:25:9	65	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.170389	85.816021	Normal
8/11/23	12:25:40	65	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.169401	85.815602	Normal

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
8/11/23	12:26:8	65	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.16815	85.815095	Normal
8/11/23	12:26:44	65	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.167095	85.814635	Normal
8/11/23	12:27:6	65	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.166265	85.814278	Normal

Total= 2.00 Km Avg. 2806.20

21/06/23
09/10/23
02

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D.(W) Division,
Sheikhpura
