

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

पत्रांक:- 1507

लखीसराय / दिनांक:- 4/9/23

प्रेषक,

ई० आशुतोष कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, लखीसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- MR 3054/ नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध में
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR 3054/ "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अन्तर्गत पथों का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पथों में किये कार्य का भुगतान हेतु कुल 362.35393 लाख (तीन करोड़ बासठ लाख पैंतीस हजार तीन सौ तिरानबे) रुपये मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जाती है।

अतः सादर अनुरोध है कि शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


(ई० आशुतोष कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

RWD Works Division, Lakhisarai

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road "New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Lakhisarai


S. N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (%)	Previous Total Amount Allotted (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23 Lakhisarai/03	pmgsy road satsanda to bhumthar tola satsanda	20804012023	1937 & 27.04.2022	0.700	33.06000	23.38820	6.06241	29/NBD/22-23 & 21.12.2022	20.09.2023		2830.33	25	5.06	0	0	23.16980	
2	MR-N/22-23 Lakhisarai/03	Lakhisarai Sheikhupura Path to Billo Dakshin Tola Pir Par	28401896177	1937 & 27.04.2022	1.350	108.28000	83.56871	8.85425	29/NBD/22-23 & 21.12.2022	20.09.2023		3204.5	25	5.05	0		73.57831	
3	MR-N/22-23 Lakhisarai/04	Lakhisarai Bypass Canal more to Ramgarh Chowk Duddi Nahar	28401896036	1937 & 27.04.2022	5.775	392.81000	288.73899	61.75715	30/NBD/22-23 & 21.12.2022	20.09.2023		3123.94	25	5.06	0	0	265.60582	


Executive Engineer
RWD Works Division Lakhisarai


04/09/23

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

प्रामाणित किया जाता है कि 3054(MR)/ नई अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत Lakhisarai Byepass Canal more to Ramgarh Chowk Duddi Nahar पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसमें कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त संख्या 765 में दर्ज सभी मदों की मापी जॉच शत प्रतिशत की गई एवं सहायक अभियंता के द्वारा इस 50 प्रतिशत की गई तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत मापी की जॉच की गई, जो गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।


04/09/23
कनीय अभियंता


04/09/23
सहायक अभियंता


04/09/23
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

Name of Road :- Lakhisarai Bypass Canal More To Ramgarh Chowk Huddi Nahar
Section no.-28

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
17/8/23	16:2:0	28	0.1	350	0	3500	2520	G	25.143981	86.088042	Normal
17/8/23	16:2:28	28	0.1	260	10.1	2600	3822	G	25.143104	86.08768	Normal
17/8/23	16:2:29	28	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.143073	86.087724	Normal
17/8/23	16:3:4	28	0.1	280	20.2	2800	3928	G	25.14239	86.087635	Normal
17/8/23	16:3:6	28	0.1	300*	20.2	3000	3031	G	25.140821	86.087017	Normal
17/8/23	16:3:8	28	0.1	340	30.3	3400	3418	G	25.140488	86.087146	Normal
17/8/23	16:4:39	28	0.1	350	30.3	3500	3520	G	25.139157	86.086751	Normal
17/8/23	16:5:52	28	0.1	320	20.2	3200	2316	G	25.137575	86.085402	Normal
17/8/23	16:5:59	28	0.1	360	10.1	3600	3112	G	25.136715	86.085232	Normal
17/8/23	16:6:0	28	0.1	270	10.1	2700	3724	G	25.136613	86.085213	Normal
17/8/23	16:6:14	28	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.135216	86.084634	Normal
17/8/23	16:6:25	28	0.1	260	10.1	2600	3622	G	25.135197	86.084615	Normal
17/8/23	16:7:0	28	0.1	270	20.2	2700	3724	G	25.13488	86.084489	Normal
17/8/23	16:7:31	28	0.1	370	10.1	3700	3520	G	25.132955	86.08369	Normal
17/8/23	16:7:35	28	0.1	300	10.1	3000	2418	G	25.132684	86.083686	Normal
17/8/23	16:8:11	28	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.131597	86.082796	Normal
17/8/23	16:8:13	28	0.1	280	10.1	2800	3214	G	25.130851	86.083263	Normal
17/8/23	16:8:41	28	0.1	280	20.2	2800	2520	G	25.13066	86.083242	Normal
17/8/23	16:9:21	28	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.129308	86.082425	Normal
17/8/23	16:9:26	28	0.1	260	20.2	2600	2622	G	25.128163	86.081822	Normal
17/8/23	16:9:57	28	0.1	300	20.2	3000	3031	G	25.126972	86.081075	Normal
17/8/23	16:10:0	28	0.1	310	20.2	3100	3214	G	25.126593	86.080995	Normal

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
17/8/23	16:10:2	28	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.126203	86.081095	Normal
17/8/23	16:10:32	28	0.1	290	20.2	2900	3929	G	25.125219	86.080498	Normal
17/8/23	16:10:36	28	0.1	270	30.3	2700	3924	G	25.124299	86.080365	Normal
17/8/23	16:11:0	28	0.1	380	20.2	3800	2929	G	25.123443	86.079969	Normal
17/8/23	16:11:7	28	0.1	390	20.2	3900	2520	G	25.121142	86.078866	Normal
17/8/23	16:11:9	28	0.1	370	20.2	3700	3816	G	25.12153	86.078964	Normal
17/8/23	16:11:42	28	0.1	380	20.2	3800	2520	G	25.12095	86.078955	Normal
17/8/23	16:12:0	28	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.12046	86.07857	Normal
17/8/23	16:12:18	28	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.119452	86.077938	Normal
17/8/23	16:12:21	28	0.1	330	10.1	3300	2316	G	25.118438	86.077773	Normal
17/8/23	16:12:28	28	0.1	370	10.1	3700	2724	G	25.117409	86.077267	Normal
17/8/23	16:13:4	28	0.1	340	10.1	3400	3418	G	25.116276	86.077174	Normal
17/8/23	16:13:39	28	0.1	290	10.1	2900	2520	G	25.115674	86.076658	Normal
17/8/23	16:14:16	28	0.1	280	10.1	2800	2418	G	25.114308	86.076133	Normal
17/8/23	16:15:0	28	0.1	270	10.1	2700	3724	G	25.113622	86.075945	Normal
17/8/23	16:16:2	28	0.1	280	10.1	2800	3827	G	25.112958	86.075603	Normal
17/8/23	16:16:11	28	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.111766	86.074998	Normal
17/8/23	16:17:0	28	0.1	270	10.1	2700	2622	G	25.111571	86.074927	Normal
17/8/23	16:17:46	28	0.1	290	10.1	2900	3716	G	25.11048	86.074359	Normal
17/8/23	16:18:0	28	0.1	330	20.2	3300	3418	G	25.109817	86.074392	Normal
17/8/23	16:18:21	28	0.1	340	10.1	3400	2418	G	25.108641	86.074034	Normal
17/8/23	16:19:7	28	0.1	310	10.1	3100	3712	G	25.1072	86.073189	Normal
17/8/23	16:19:32	28	0.1	320	10.1	3200	3214	G	25.10594	86.072759	Normal
17/8/23	16:19:35	28	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.105853	86.072749	Curve

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
17/8/23	16:20:7	28	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.105658	86.072688	Normal
17/8/23	16:20:42	28	0.1	340	10.1	3400	3418	G	25.105538	86.072756	Normal
17/8/23	16:21:17	28	0.1	310	10.1	3100	3112	G	25.10339	86.072508	Curve
17/8/23	16:21:22	28	0.1	370	20.2	3700	2724	G	25.10282	86.072476	Curve
17/8/23	16:21:59	28	0.1	380	20.2	3800	3827	G	25.102661	86.071599	Normal
17/8/23	16:22:0	28	0.1	280	20.2	2800	3827	G	25.103006	86.071326	Curve
17/8/23	16:24:3	28	0.1	290	10.1	2900	2520	G	25.103724	86.070688	Normal
17/8/23	16:24:14	28	0.1	320	10.1	3200	2929	G	25.104955	86.071133	Normal
17/8/23	16:25:11	28	0.1	290	20.2	2900	2929	G	25.105325	86.069913	Normal
17/8/23	16:26:8	28	0.1	270	20.2	2700	3724	G	25.106541	86.071042	Normal
17/8/23	16:27:0	28	0.1	290	20.2	2900	3520	G	25.106522	86.071034	Normal
		Total=	5.7	Km	Avg. 3123.94						

ATK
04/09/23
JE

UHV
04/09/23
AB

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,
Lakhisarai
04/09/23

Steco Analyzer

Name of Customer : S B Engicon Pvt. Ltd
 Name of Work/ Road : Lakhisarai Bypass Canal More 1
 Lab Job number : 28
 Date : 17/08/2023
 Section No. : 28

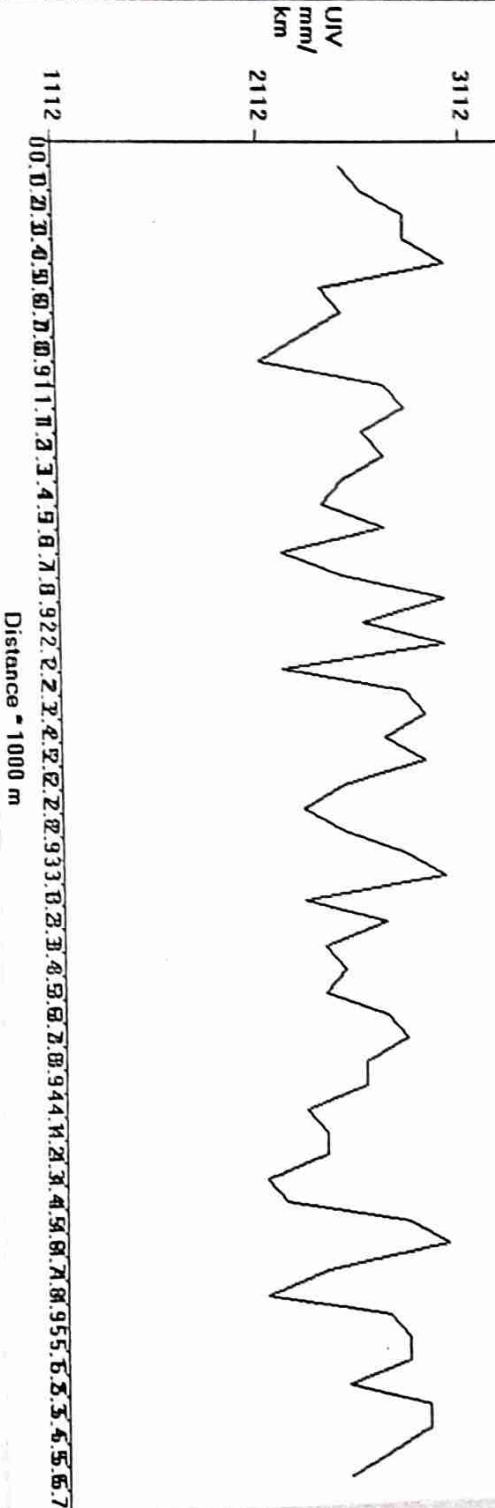
Test Date : 17/08/2023
 Machine No : 399
 Start S No :
 Start E No :
 Weather :
 Start Location :
 End Location :
 Road Name : Lakhisarai Bypass Canal More
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Side :
 U/V Range : 1112 To 4000 Interval 1000 mm/km
 Dist Range : 0 To 58 0.1 - 1000 m
 Equation : $Y = 0 \cdot X^2 + 1.021 \cdot X - 31.77$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\Kishor ji\Desktop\Lakhisarai Bypass Canal More To Ramgath Chowk Huddi Nahar
 Name of Customer : S B Engicon Pvt. Ltd., Name of Work/ Road : Lakhisarai Bypass Canal More To Ramgath Chowk



AKur
 04/09/23
 JE

U-V
 04/09/23
 AKV

AKV
 04/09/23
