

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

पत्रांक ५५३-३३०

पूर्णियाँ, दिनांक २१/०२/२०२४-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, MR(3054),
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय : शीर्ष MR (3054) मरम्मति एवं सम्पोषण योजना मद में राशि आवंटित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR (3054) मरम्मति एवं सम्पोषण योजना मद में इस प्रमंडल को संलग्न विवरणी में अंकित राशि की आवश्यकता है ।
अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि आवंटित करने की कृपा की जाय ।

अनु० - यथोक्त ।

अधियाचना की प्रति (मूल में)

विश्वासभाजन


२१/०२/२४

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।


५५३-३३०

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

प्रमाणित किया जाता है कि एम0आर0 3054 योजनान्तर्गत Panchyat Bhawan to Kama Asthan पथ में कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है एवं साथ ही कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियन्ता एवं 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियन्ता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया गया है ।


21/02/24
कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा के0 नगर


21.02.24
सहायक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, के0 नगर


21/02/24
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

Requestion Format for Scheme Head - MR (3054) under Rural Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division - RWD, Works Division, Purnea

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (in KM)	Amount of (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR- N-22-23, Purnea/09	Panchayat Bhawan to Kama Asthan	211052 L N-1406 Dated 13/01/2022		4.630	256.85800	207.34527	53.98042	114MBD/ 2022-23 dt. 30.12.22	29.09.23	---	3.501	25	5.02	0.00000	0.00000	207.25000	Comp
Total					4.630	256.85800	207.34527	53.98042							0.00000	0.00000	207.25000	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI in enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

[Signature]

Divisional Accounts Officer
RWD, Works Division, Purnea

[Signature]

Executive Engineer
RWD, Works Division, Purnea

[Signature]

Lab Job number :RWD/PURNEA

Date :21-02-2024

Name of Customer :AMIT KUMAR

Name of Work/ Road :PANCHYAT BHAWAN TO KAMA ASTHAN

Sr.no Location of Corrected U.I
test(in km) value(mm/km)


Road catagory

2	0.1	1268 G
3	0.2	1836 G
4	0.3	2972 G
5	0.4	2972 G
6	0.5	3994 G
7	0.6	2858 G
8	0.7	3313 G
9	0.8	3426 G
10	0.9	2972 G
11	1	2858 G
12	1.1	3086 G
13	1.2	2290 G
14	1.3	2858 G
15	1.4	3313 G
16	1.5	2518 G
17	1.6	1836 G
18	1.7	2063 G
19	1.8	2518 G
20	1.9	2972 G
21	2	3426 G
22	2.1	2290 G
23	2.2	2972 G
24	2.3	2177 G
25	2.4	2404 G
26	2.5	2290 G
27	2.6	1950 G
28	2.7	2290 G
29	2.8	2858 G
30	2.9	3426 G
31	3	2631 G
32	3.1	2745 G
33	3.2	2972 G
34	3.3	2518 G
35	3.4	2972 G
36	3.5	2745 G
37	3.6	2858 G
38	3.7	2063 G
39	3.8	2858 G
40	3.9	2631 G
41	4	2518 G
42	4.1	2518 G
43	4.2	2745 G
44	4.3	2631 G
45	4.4	2631 G
46	4.5	1836 G
47	4.6	2972 G

AVERAGE 2670.65


21/02/24
JS


21.02.24
HO


Executive Engineer
R.W.D. (Works) Division



Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UTV	TEGORY ROAD	IRI	Latitude ongritude	Event
21/2/24	14:41:26	71	0.1	100	0	1000	1268 G		1.87	25.71335	87.36305 Normal
21/2/24	14:41:26	71	0.1	150	30.3	1500	1836 G		2.6	25.71342	87.36382 Normal
21/2/24	14:42:1	71	0.1	250	20.2	2500	2972 G		3.99	25.71338	87.36483 Normal
21/2/24	14:42:1	71	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	25.71334	87.36571 Normal
21/2/24	14:42:36	71	0.1	340	20.2	3400	3994 G		5.19	25.71319	87.36648 Normal
21/2/24	14:44:0	71	0.1	240	10.1	2400	2858 G		3.85	25.71348	87.36769 Curve
21/2/24	14:44:22	71	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.71377	87.36697 Normal
21/2/24	14:44:22	71	0.1	290	20.2	2900	3426 G		4.53	25.71412	87.36614 Normal
21/2/24	14:45:0	71	0.1	250	30.3	2500	2972 G		3.99	25.71483	87.36439 Normal
21/2/24	14:45:32	71	0.1	240	20.2	2400	2858 G		3.85	25.71521	87.36352 Normal
21/2/24	14:45:32	71	0.1	260	20.2	2600	3086 G		4.13	25.71566	87.36273 Normal
21/2/24	14:46:0	71	0.1	190	30.3	1900	2290 G		3.16	25.71609	87.3619 Culvert
21/2/24	14:46:7	71	0.1	240	20.2	2400	2858 G		3.85	25.7165	87.36104 Normal
21/2/24	14:46:7	71	0.1	280	20.2	2800	3313 G		4.4	25.71696	87.3602 Normal
21/2/24	14:46:43	71	0.1	210	20.2	2100	2518 G		3.44	25.71745	87.35938 Normal
21/2/24	14:47:0	71	0.1	150	20.2	1500	1836 G		2.6	25.71798	87.35862 Culvert
21/2/24	14:47:18	71	0.1	170	10.1	1700	2063 G		2.88	25.71857	87.3579 Speed Breaker
21/2/24	14:47:18	71	0.1	210	20.2	2100	2518 G		3.44	25.71915	87.35721 Culvert
21/2/24	14:48:0	71	0.1	250	10.1	2500	2972 G		3.99	25.71974	87.35652 Speed Breaker
21/2/24	14:48:0	71	0.1	290	20.2	2900	3426 G		4.53	25.72025	87.35589 Normal
21/2/24	14:48:29	71	0.1	190	10.1	1900	2290 G		3.16	25.72082	87.35532 Normal
21/2/24	14:48:29	71	0.1	250	30.3	2500	2972 G		3.99	25.72154	87.35473 Normal
21/2/24	14:48:29	71	0.1	180	20.2	1800	2177 G		3.02	25.72223	87.35424 Normal
21/2/24	14:49:4	71	0.1	200	20.2	2000	2404 G		3.3	25.72298	87.35374 Normal
21/2/24	14:49:4	71	0.1	190	30.3	1900	2290 G		3.16	25.72351	87.35333 Normal
21/2/24	14:49:4	71	0.1	160	20.2	1600	1950 G		2.74	25.72405	87.35298 Normal
21/2/24	14:49:39	71	0.1	190	20.2	1900	2290 G		3.16	25.72477	87.35242 Normal
21/2/24	14:50:0	71	0.1	240	30.3	2400	2858 G		3.85	25.72549	87.35185 Normal
21/2/24	14:50:0	71	0.1	290	20.2	2900	3426 G		4.53	25.7262	87.35135 Normal
21/2/24	14:50:0	71	0.1	220	20.2	2200	2631 G		3.58	25.72696	87.35076 Normal
21/2/24	14:50:14	71	0.1	230	10.1	2300	2745 G		3.72	25.72761	87.35024 Speed Breaker
21/2/24	14:51:0	71	0.1	250	20.2	2500	2972 G		3.99	25.72842	87.34975 Normal
21/2/24	14:51:0	71	0.1	210	20.2	2100	2518 G		3.44	25.72911	87.34916 Normal
21/2/24	14:51:25	71	0.1	250	20.2	2500	2972 G		3.99	25.72964	87.34842 Normal
21/2/24	14:51:25	71	0.1	230	20.2	2300	2745 G		3.72	25.73019	87.34764 Normal
21/2/24	14:52:0	71	0.1	240	10.1	2400	2858 G		3.85	25.73074	87.3469 Speed Breaker

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor


<4000 4001-5000 >5001

$$Y = 0 \cdot X^2 + 1.136 \cdot X + 132.5$$

$$X = 2250$$

$$Y = 2628$$

21/2/24	14:52:0	71	0.1	170	20.2	1700	2063 G	2.88	25.73125	87.34614	Normal
21/2/24	14:52:36	71	0.1	240	10.1	2400	2858 G	3.85	25.7318	87.34532	Speed Breaker
21/2/24	14:52:36	71	0.1	220	20.2	2200	2631 G	3.58	25.73231	87.34465	Normal
21/2/24	14:53:0	71	0.1	210	30.3	2100	2518 G	3.44	25.73283	87.34387	Normal
21/2/24	14:53:11	71	0.1	210	20.2	2100	2518 G	3.44	25.73341	87.34308	Normal
21/2/24	14:53:11	71	0.1	230	20.2	2300	2745 G	3.72	25.73396	87.34232	Normal
21/2/24	14:53:11	71	0.1	220	20.2	2200	2631 G	3.58	25.73449	87.3416	Normal
21/2/24	14:54:0	71	0.1	220	10.1	2200	2631 G	3.58	25.73496	87.34081	Culvert
21/2/24	14:54:21	71	0.1	150	20.2	1500	1836 G	2.6	25.73565	87.34029	Normal
21/2/24	14:54:21	71	0.1	250	10.1	2500	2972 G	3.99	25.73652	87.34002	Speed Breaker
Average							2670.65				


 21.02.24
 Executive Engineer
 R.W.D (Works) Division
 PURNEA

21.02.24
 21

File :E:\28_xlsx, Section No. :71, Eqn :test

Name of Customer :AMIT KUMAR, Name of Work/ Road :PANCHYAT BHAWAN TO KAMA ASTHAN, Lab Job

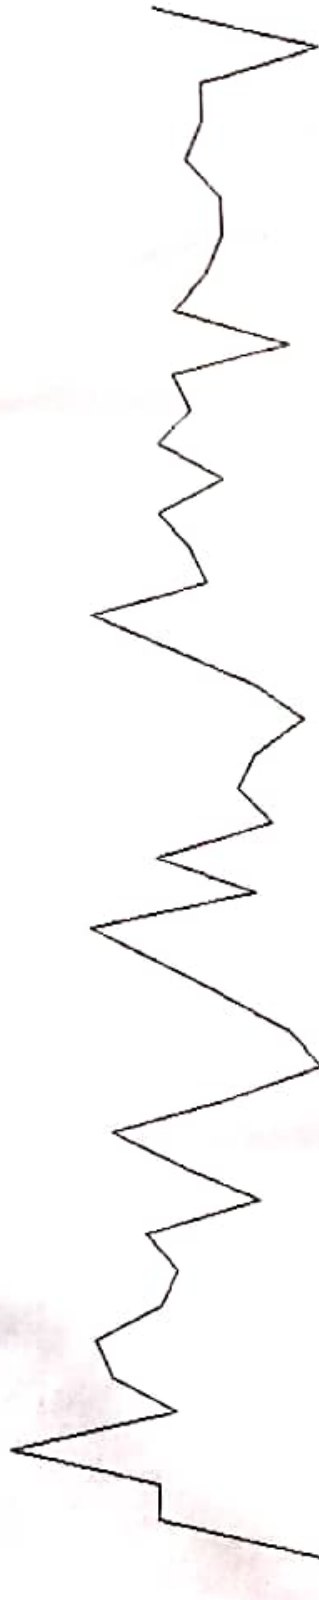
4268

3268

UIV
mm/
km

1268

268



0 0.10.20.30.40.50.60.70.80.9 1 1.11.21.31.41.51.61.71.81.9 2 2.12.22.32.42.52.62.72.82.9 3 3.13.23.33.43.53.63.73.83.9 4 4.14.24.34.44.54.6

Distance * 1000 m

[Signature]
16.07.24
R.D.

[Signature]
16.07.24
R.D.

[Signature]
Executive Engineer
R.D.D. (Water) Division
PURNEA
