

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

पत्रांक 636780

पूर्णियाँ, दिनांक 15/03/2024-

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, MR(3054),
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय : शीर्ष MR (3054) मरम्मत एवं सम्पोषण योजना मद में राशि आवंटित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR (3054) मरम्मत एवं सम्पोषण योजना मद में इस प्रमंडल को संलग्न विवरणी में अंकित राशि की आवश्यकता है ।
अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि आवंटित करने की कृपा की जाय ।

अनु० - यथोक्त ।

अधियाचना की प्रति (मूल में)

विश्वासभाजन

[Handwritten Signature]
15/03/24

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

[Handwritten Signature]
15/3/24


Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Rural Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division : RWD, Works Division, Purnea

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	Up-to-date Expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In KM)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	MR-N/22-23, Purnea/17	Jankinagar to Rupauli Ithari	211052 02129	L. N.-1447 Dated 28.02.2023	4.720	250.82000	179.89372	54.48148	19MBD/ 2023-24 dt. 12.10.2023	05.10.23	—	3.501	25	5.02	0.00000	0.00000	179.84000	Comp
2	MR-N/22-23, Purnea/17	L038 REO Road Rupauli to Dibra Road (VR38)	211052 02132	L. N.-1447 Dated 28.02.2023	5.506	319.65500	220.74494	68.68904	19MBD/ 2023-24 dt. 12.10.2023	05.10.23	—	3.501	25	5.01	0.00000	0.00000	220.70000	Comp
Total					10.226	570.47500	400.63866	123.17052							0.00000	0.00000	400.54000	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI in enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS


 Divisional Accounts Officer
 RWD, Works Division, Purnea


 Executive Engineer
 RWD, Works Division, Purnea
 15/3/24

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ।
प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि Jankinagar to Rupauli Ithari (VR38) का सभी अवयवों की जाँच शत प्रतिशत कनीय अभियंता द्वारा किया गया है। सहायक अभियंता द्वारा सभी अवयवों की 50 प्रतिशत से अधिक जाँच किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा 10 प्रतिशत अवयवों की जाँच की गई है।

कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा-बनमनखी।

सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, बनमनखी।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ।

Lab Job number :51(RWD PURNEA)

Date :14-03-2024

Name of Customer :MADAN KUMAR


Name of Work/ Road :JANKI NAGAR TO RUPOULINITHARI

Sr.no Location o Corrected U.I Road catagory
test(in km) value(mm/km)


560	0.1	1706 G
561	0.2	2205 G
562	0.3	2005 G
563	0.4	1905 G
564	0.5	1806 G
565	0.6	2704 G
566	0.7	2504 G
567	0.8	2305 G
568	0.9	2804 G
569	1	1706 G
570	1.1	1307 G
571	1.2	2105 G
572	1.3	2305 G
573	1.4	2205 G
574	1.5	2404 G
575	1.6	1706 G
576	1.7	1506 G
577	1.8	2504 G
578	1.9	2205 G
579	2	1905 G
580	2.1	1806 G
581	2.2	3203 G
582	2.3	1706 G
583	2.4	2704 G
584	2.5	1506 G
585	2.6	2205 G
586	2.7	1706 G
587	2.8	1706 G
588	2.9	2404 G
589	3	1706 G
590	3.1	2005 G
591	3.2	1307 G
592	3.3	1107 G
593	3.4	2105 G
594	3.5	3802 G
595	3.6	3303 G
596	3.7	1606 G
597	3.8	1905 G
598	3.9	2205 G
599	4	2205 G
600	4.1	1706 G
601	4.2	2205 G
602	4.3	2005 G
603	4.4	2404 G
604	4.5	1905 G
605	4.6	2205 G
606	4.7	3003 G
607	4.8	1905 G

AVERAGE


2111.29


15/3/24
SV


15/3/24
AE



File :C:\Users\BRRDA126\Desktop\bump madan ji\14031724.Xls, Section No.:23, Eqn :test
 Name of Customer :MADAN KUMAR, Name of Work/ Road :JANKI NAGAR TO RUPOULINITHARI, Lab Job number

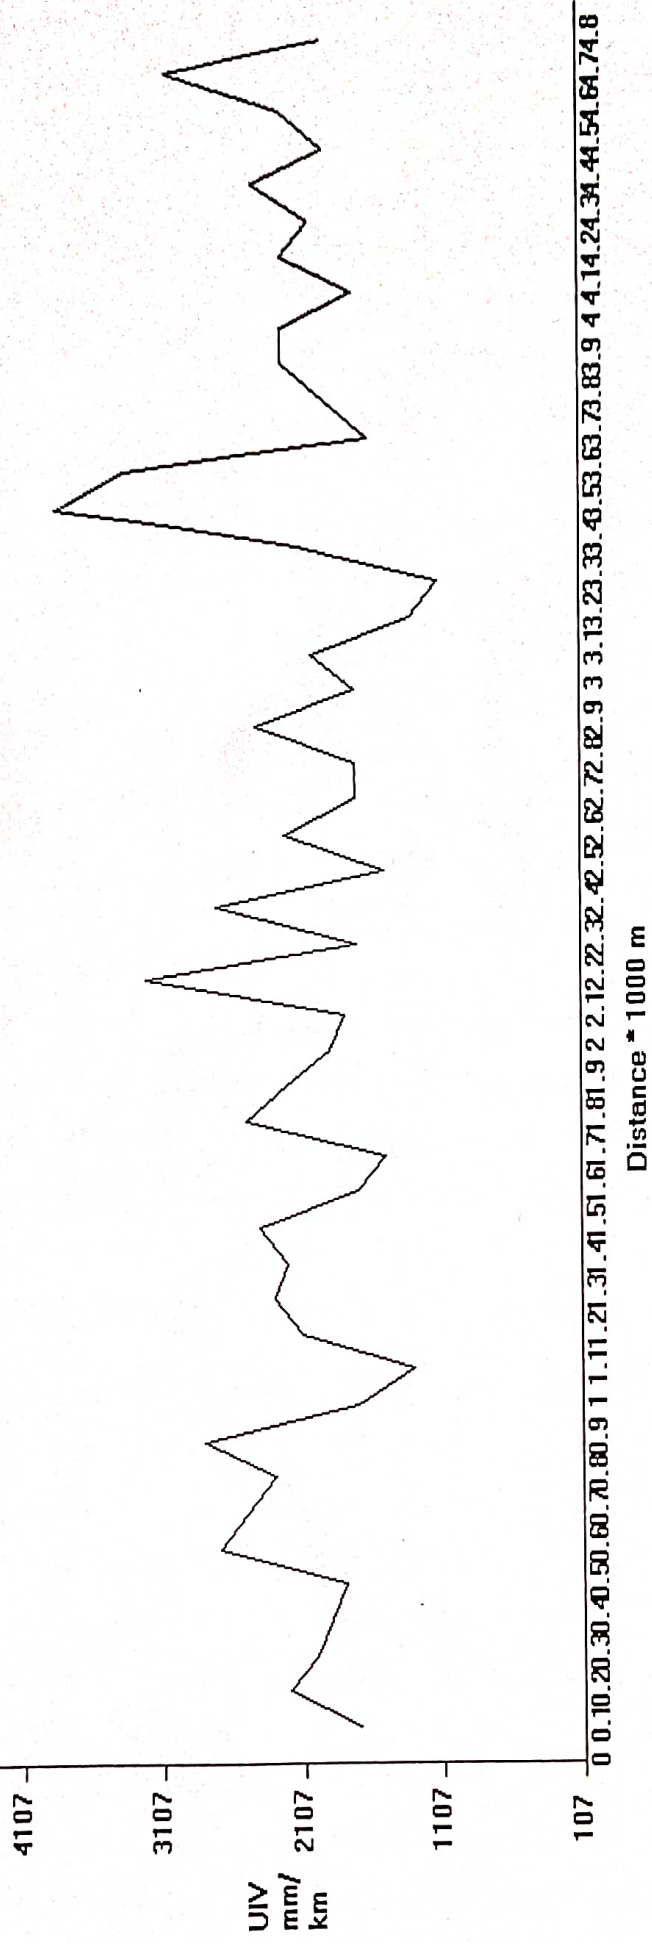

15/3/24
 Jc

15/3/24
 Jc

Date	Time	Section No.	Length In km	Bumps In mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI CATEGORY mm/km ROAD	Latitude	Longitude	Event
14/3/24	13:27:5	23	0.1	160	0	1600	1706 G	25.90251	87.8342	Normal
14/3/24	13:27:41	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.90172	87.82928	Normal
14/3/24	13:27:41	23	0.1	190	20.2	1900	2005 G	25.90095	87.82575	Culvert
14/3/24	13:28:0	23	0.1	180	20.2	1800	1905 G	25.90006	87.8239	Normal
14/3/24	13:28:16	23	0.1	170	20.2	1700	1806 G	25.89929	87.8202	Normal
14/3/24	13:28:16	23	0.1	260	30.3	2600	2704 G	25.8985	87.81565	Normal
14/3/24	13:28:51	23	0.1	240	20.2	2400	2504 G	25.89768	87.81497	Culvert
14/3/24	13:29:0	23	0.1	220	20.2	2200	2305 G	25.89711	87.81918	Curve
14/3/24	13:29:0	23	0.1	270	20.2	2700	2804 G	25.89691	87.82862	Normal
14/3/24	13:29:26	23	0.1	160	30.3	1600	1706 G	25.89672	87.83855	Normal
14/3/24	13:29:26	23	0.1	120	20.2	1200	1307 G	25.89606	87.84057	Curve
14/3/24	13:30:2	23	0.1	200	20.2	2000	2105 G	25.89528	87.83618	Culvert
14/3/24	13:30:2	23	0.1	220	20.2	2200	2305 G	25.89443	87.83248	Normal
14/3/24	13:30:2	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.89356	87.83063	Normal
14/3/24	13:30:37	23	0.1	230	20.2	2300	2404 G	25.89271	87.82995	Normal
14/3/24	13:30:37	23	0.1	160	20.2	1600	1706 G	25.89187	87.83063	Normal
14/3/24	13:31:12	23	0.1	140	20.2	1400	1506 G	25.89101	87.82995	Culvert
14/3/24	13:31:12	23	0.1	240	20.2	2400	2504 G	25.89027	87.82575	Normal
14/3/24	13:31:12	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.88951	87.82037	Normal
14/3/24	13:33:0	23	0.1	180	20.2	1800	1905 G	25.88891	87.8138	Normal
14/3/24	13:34:9	23	0.1	170	20.2	1700	1806 G	25.88831	87.80757	Normal
14/3/24	13:34:44	23	0.1	310	10.1	3100	3203 G	25.88749	87.8069	Normal
14/3/24	13:35:0	23	0.1	160	30.3	1600	1706 G	25.88665	87.80807	Normal
14/3/24	13:35:19	23	0.1	260	10.1	2600	2704 G	25.88594	87.81143	Culvert
14/3/24	13:35:19	23	0.1	140	20.2	1400	1506 G	25.88528	87.818	Normal
14/3/24	13:36:0	23	0.1	210	10.1	2100	2205 G	25.88459	87.82423	Normal
14/3/24	13:36:0	23	0.1	160	20.2	1600	1706 G	25.88383	87.82928	Normal
14/3/24	13:36:30	23	0.1	160	30.3	1600	1706 G	25.88302	87.83215	Normal
14/3/24	13:36:30	23	0.1	230	20.2	2300	2404 G	25.88225	87.83535	Normal
14/3/24	13:37:4	23	0.1	160	20.2	1600	1706 G	25.88146	87.83855	Normal
14/3/24	13:38:15	23	0.1	190	10.1	1900	2005 G	25.87981	87.8436	Normal
14/3/24	13:38:15	23	0.1	120	30.3	1200	1307 G	25.87927	87.84477	Normal
14/3/24	13:38:15	23	0.1	100	40.4	1000	1107 G	25.87881	87.84493	Normal
14/3/24	13:38:15	23	0.1	200	20.2	2000	2105 G	25.878	87.84258	Culvert
14/3/24	13:39:0	23	0.1	370	10.1	3700	3802 G	25.87719	87.84443	Normal
14/3/24	13:39:25	23	0.1	320	10.1	3200	3303 G	25.87652	87.85	Normal
14/3/24	13:39:25	23	0.1	150	20.2	1500	1606 G	25.87613	87.85858	Normal
14/3/24	13:40:0	23	0.1	180	30.3	1800	1905 G	25.87573	87.87	Normal
14/3/24	13:40:0	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.87516	87.8739	Normal
14/3/24	13:40:0	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.87448	87.88013	Normal
14/3/24	13:40:36	23	0.1	160	30.3	1600	1706 G	25.87387	87.88635	Normal
14/3/24	13:41:0	23	0.1	210	20.2	2100	2205 G	25.87301	87.88855	Culvert
14/3/24	13:41:11	23	0.1	190	20.2	1900	2005 G	25.87225	87.8843	Normal
14/3/24	13:41:11	23	0.1	230	20.2	2300	2404 G	25.87147	87.88063	Culvert
14/3/24	13:41:11	23	0.1	180	20.2	1800	1905 G	25.87061	87.87642	Normal
14/3/24	13:41:46	23	0.1	210	30.3	2100	2205 G	25.8698	87.8739	Normal
14/3/24	13:42:0	23	0.1	290	10.1	2900	3003 G	25.86893	87.87238	Normal
14/3/24	13:42:21	23	0.1	180	10.1	1800	1905 G	25.86808	87.8707	Normal
					Average	2111.29				


 15/3/24
 JE


 15/3/24
 005

