

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

पत्रांक:- 613

लखीसराय / दिनांक:- 30/03/2024

प्रेषक,

ई० आशुतोष कुमार
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, लखीसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:- MR 3054/ नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध में
आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR 3054/ "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अन्तर्गत Kajra- Jalappa Asthan to Belaunja पथ कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पथ में किये कार्य का भुगतान हेतु कुल 60.40 लाख (साठ लाख चालीस हजार) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जाती है।

अतः सादर अनुरोध है कि शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(ई० आशुतोष कुमार)
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

प्रामाणित किया जाता है कि 3054(MR)/ नई अनुरक्षण नीति 2018 योजनान्तर्गत Kajra-Jalappa Asthan to Belaunja पथ का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है, जिसमें कनीय अभियंता द्वारा मापी पुस्त संख्या 810 में दर्ज सभी मदों की मापी जॉच शत प्रतिशत की गई एवं सहायक अभियंता के द्वारा इस 50 प्रतिशत की गई तथा कार्यपालक अभियंता के द्वारा 10 प्रतिशत मापी की जॉच की गई, जो गुणवत्ता पूर्ण एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।


30/3/2024
कनीय अभियंता


30/3/2024
सहायक अभियंता


30/3/24
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

RWD Works Division, Lakhisarai

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Manitenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Lakhisarai

S.N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to -date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Lakhisarai/21	Kajra-Jalappa Asthan to Belaunja	28401900938	2722/24 05.23	3.000	162.34000	110.99788	38.04279	54/MBD/2023-24 & 30.12.2023	29.09.2024		2599	25	5.06	0	0	60.40000	

[Signature]
30/3/24
ae

[Signature]
30/3/24
gR

[Signature]
30/3/24
Executive Engineer
RWD Works Division Lakhisarai

Name of Road - Kajra - Jalappa Asthan to Belaunja

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
30/ 3/ 24	14: 15: 0	11	0.1	190	10.1	1900	1925	G	25.167101	86.246243	Normal
30/ 3/ 24	14: 15: 0	11	0.1	200	10.1	2000	2045	G	25.166689	86.246428	Normal
30/ 3/ 24	14: 15: 0	11	0.1	220	20.2	2200	2215	G	25.168242	86.246426	Normal
30/ 3/ 24	14: 16: 0	11	0.1	160	10.1	1600	1635	G	25.167678	86.246392	Normal
30/ 3/ 24	14: 16: 0	11	0.1	230	20.2	2300	2315	G	25.167447	86.246362	Normal
30/ 3/ 24	14: 16: 0	11	0.1	180	10.1	1800	1845	G	25.167386	86.246349	Normal
30/ 3/ 24	14: 17: 0	11	0.1	210	10.1	2100	2115	G	25.166674	86.246153	Normal
30/ 3/ 24	14: 17: 0	11	0.1	240	20.2	2400	2435	G	25.166047	86.246071	Normal
30/ 3/ 24	14: 17: 0	11	0.1	250	30.3	2500	2575	G	25.160903	86.245244	Normal
30/ 3/ 24	14: 17: 0	11	0.1	260	30.3	2600	2615	G	25.160004	86.245019	Normal
30/ 3/ 24	14: 17: 0	11	0.1	350	30.3	3500	3515	G	25.15897	86.24488	Normal
30/ 3/ 24	14: 18: 0	11	0.1	290	30.3	2900	2925	G	25.158458	86.244731	Normal
30/ 3/ 24	14: 18: 0	11	0.1	200	10.1	2000	2045	G	25.157616	86.244635	Normal
30/ 3/ 24	14: 18: 0	11	0.1	170	10.1	1700	1725	G	25.156783	86.244421	Normal
30/ 3/ 24	14: 18: 0	11	0.1	210	20.2	2100	2115	G	25.156214	86.244446	Normal
30/ 3/ 24	14: 18: 0	11	0.1	230	20.2	2300	2315	G	25.154749	86.243946	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	340	20.2	3400	3435	G	25.153428	86.243887	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	280	10.1	2800	2845	G	25.152546	86.243686	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	300	20.2	3000	3045	G	25.152244	86.243754	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	330	20.2	3300	3315	G	25.150938	86.243412	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	360	30.3	3600	3615	G	25.172941	86.246725	Normal
30/ 3/ 24	14: 19: 0	11	0.1	320	40.4	3200	3245	G	25.172829	86.246754	Normal
30/ 3/ 24	14: 20: 0	11	0.1	240	10.1	2400	2435	G	25.172168	86.246859	Normal
30/ 3/ 24	14: 20: 0	11	0.1	330	40.4	3300	3315	G	25.171073	86.24671	Normal
30/ 3/ 24	14: 20: 0	11	0.1	260	20.2	2600	2615	G	25.17059	86.246703	Normal
30/ 3/ 24	14: 20: 0	11	0.1	280	30.3	2800	2845	G	25.170032	86.246656	Normal
30/ 3/ 24	14: 21: 0	11	0.1	310	10.1	3100	3115	G	25.169547	86.246539	Normal
30/ 3/ 24	14: 21: 0	11	0.1	290	20.2	2900	2925	G	25.168479	86.246373	Normal
30/ 3/ 24	14: 21: 0	11	0.1	220	40.4	2200	2245	G	25.168391	86.246328	Normal
30/ 3/ 24	14: 22: 0	11	0.1	260	10.1	2600	2635	G	25.167841	86.246245	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$$

$$X = 0$$

$$Y = -32$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5000

[Signature]
30/3/24
oe

[Signature]
30/3/24
AR

[Signature]
30/3/24
Executive Engineer
RWD Works Division
Lakhisarai

Name of Customer : Subesh Kumar
Name of Work/ Road : Kakra Jaleppa Asthan to Belaunja
Lab Job number : 11
Date : 30-03-2024
Section No. : 11

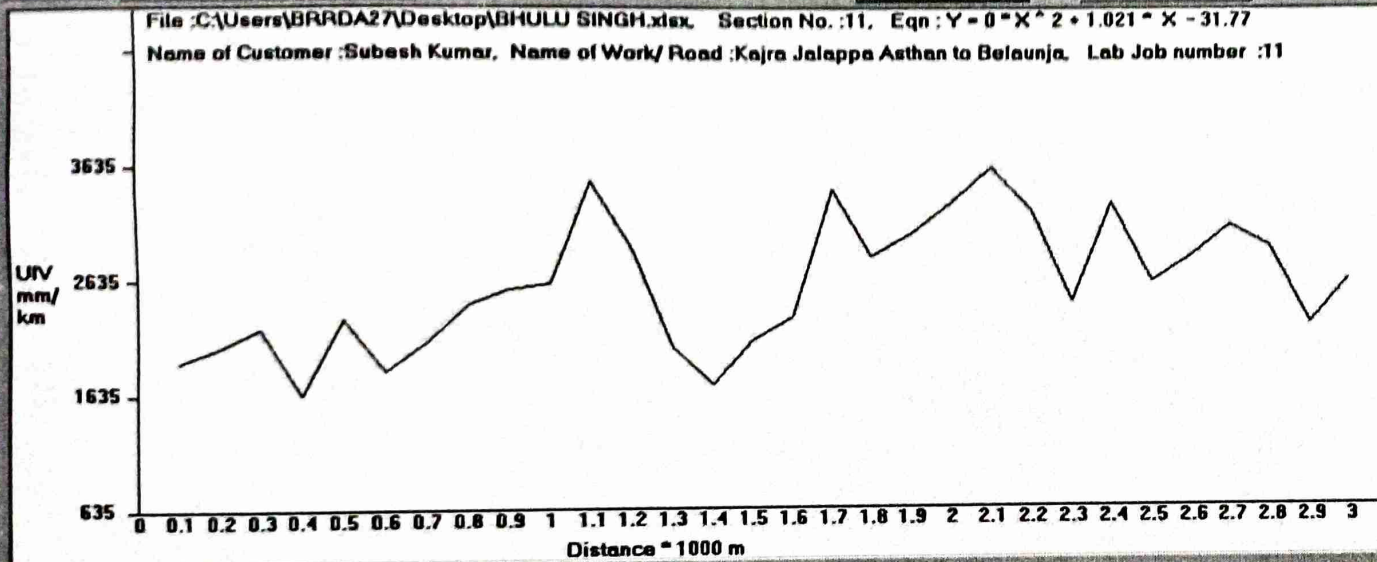
Test Date : 30-03-2024 Road Name : Kakra Jaleppa Asthan to Belaunja
Machine No : 385 Road Type : (R) RURAL ROAD
Start S No : Side : Interval
Start E No :
Weather : UV Range : 635 To 5000 1000 mm/km
Start Location : Dist Range : 0 To 3.1 0.1 * 1000 m
End Location : Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$

Print

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View



30/3/24
AE

30/03/24
AGZ

30/3/24
Executive Engineer
RWD Works Division Lakhisarai
