

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल शिवहर।

पत्रांक:- ७६३ (अनू) /शिवहर

दिनांक:- 27/4/24

प्रेषक,

ई० मनोज कुमार,
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शिवहर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।


विषय :-MR (3054) नई अनुरक्षण नीति 2018 के तहत पथ के अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक के संबंध में सूचित करना है कि कार्य प्रमंडल-शिवहर के अंतर्गत MR (3054) New Maintenance Policy 2018 के तहत करायें गये कार्यों के भुगतान हेतु राशि की अधियाचना विहित प्रपत्र में समर्पित की जा रही है।

अनु०- यथोक्त।

विश्वासभाजन



(ई० मनोज कुमार)
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शिवहर।

Requisition Format for Scheme Head-MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division- RWD, Works Division-Sheohar.

Sl. No.	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	Length (in km)	Administrative Approval		Agreement Initial Rectification with Surfacers Renewal (in lakh)	5 Years Routine Maintenance (in lakh)	Agreement No. Date	Date of Completion as per agreement	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Total Alotted Amount (in lakh)	expenditure as per MIS (in Lakh)	against work done (in lakh)	Remarks
						Amount (in lakh)	5 Years Routine Maintenance (in lakh)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/2019-20 Sheohar/05	Munshi Chowk to Vrindawan	316811036059	6284/02.12.2019	2.40	48.14200	18.99300	57.54742	16.77482	MBD/MR/06 of 2020-21 04.12.2020	03.09.2021	3118.94	25	5%	39.90000	39.90000	8.54412	Completed
2	MR-N/2023-24 Sheohar/05	Dustara to ghorha	NEA22000692	6120/04.12.2023	0.50	25.68100	3.25400	26.5045	3.23687	MBD/MR-3054/19 of 2023-24 16.03.2024	15.12.2024	3381	25	5%	0	0	26.50000	Completed
Total						48.14200	18.99300	57.54742	16.77482						0	0	35.04412	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in Excel) of recorded IRI is enclosed.

2. Up - to date Physical Progress has been uploaded in MIS.

3. Certificate enclosed

(Signature)

Executive Engineer,
RWD, Works Div. Sheohar


27/04/24





कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल शिवहर।

प्रमाण-पत्र

विभागीय आदेशानुसार सत्यापित किया जाता है कि शीर्ष 3054 (नई अनुरक्षण नीति 2018) अंतर्गत मुंशी चौक से वृंदावन पथ का मरम्मत कार्य की जाँच 100 प्रतिशत संबंधित कनीय अभियंता, 50 प्रतिशत संबंधित सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है।


कनीय अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा, तरियानी।
15.12.2023


15-12-2023
सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, तरियानी।


15.12.2023
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, शिवहर।

Name of Customer: AJAY KUMAR
 Name of Work: munshi chowk se brindawan
 Road: 104
 Lab Job number: 08-06-2023
 Date: 17
 Section No. 17

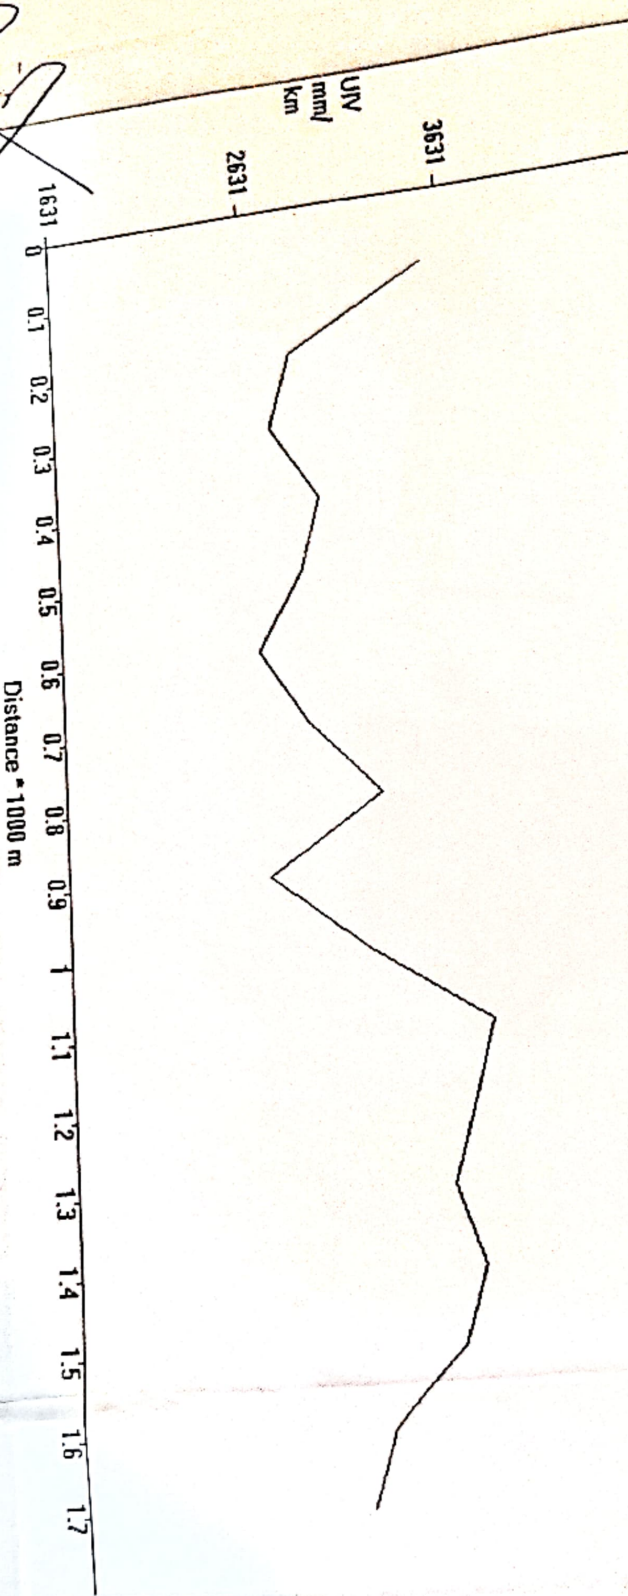
Test Date: 08-06-2023
 Machine No: 423
 Road Type: (R) RURAL ROAD
 Start S No: MUNSHI CHC
 Side: Interval
 Start E No: BRINDAWAN
 Weather: NORMAL
 UIV Range: 1631 To 5000 mm/km
 Dist Range: 0 To 1.8 0.1 * 1000 m
 Start Location: 0.00 KM
 End Location: 1.700 KM
 Equation: $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File: D:\BUMP REPORT\MUNSHI CHOWK SE BRINDAWAN\08061231.Xls, Section No.: 17, Egn: $Y = 0 * X^2 +$
 Name of Customer: AJAY KUMAR, Name of Work: Road :munshi chowk se brindawan, Lab Job number :104



15.12.2023
 15.12.2023

15.12.2023
 15.12.2023

15.12.2023

NAME OF THE ROAD - MUNSHI CHOWK SE BRINDAWAN
CONTRACTOR NAME - AJAY KUMAR, ROAD LENGTH-1.7 KM

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Rate	Speed	OR	UIV	CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Ev ₉₀
8/6/23	12:21:0	17	0.1	300	10.1	3000	3540 G			4.7	26.39668	85.28493	Normal
8/6/23	12:21:11	17	0.1	240	30.3	2400	2858 G			3.9	26.39714	85.28409	Normal
8/6/23	12:21:45	17	0.1	230	20.2	2300	2745 G			3.7	26.39768	85.28325	Normal
8/6/23	12:22:10	17	0.1	250	30.2	2500	2972 G			4	26.39853	85.2834	Normal
8/6/23	12:22:51	17	0.1	240	20.2	2400	2858 G			3.9	26.39939	85.28337	Normal
8/6/23	12:23:08	17	0.1	220	10.1	2200	2631 G			3.6	26.40011	85.28278	Normal
8/6/23	12:23:40	17	0.1	240	20.2	2400	2858 G			3.9	26.40081	85.28217	Normal
8/6/23	12:24:15	17	0.1	270	20.2	2700	3199 G			4.3	26.4015	85.28158	Curve
8/6/23	12:24:50	17	0.1	220	30.2	2200	2631 G			3.6	26.40208	85.28079	Normal
8/6/23	12:25:10	17	0.1	260	30.2	2600	3086 G			4.1	26.40236	85.2799	Normal
8/6/23	12:25:50	17	0.1	310	30.2	3100	3654 G			4.8	26.40306	85.27928	Normal
8/6/23	12:26:20	17	0.1	300	20.2	3000	3540 G			4.7	26.40378	85.27872	Normal
8/6/23	12:26:55	17	0.1	290	20.2	2900	3426 G			4.5	26.40451	85.27815	Normal
8/6/23	12:27:10	17	0.1	300	20.2	3000	3540 G			4.7	26.40518	85.27739	Normal
8/6/23	12:28:20	17	0.1	290	20.2	2900	3426 G			4.5	26.40598	85.27699	Curve
8/6/23	12:29:0	17	0.1	260	20.2	2600	3086 G			4.1	26.40672	85.27655	Normal
8/6/23	12:29:20	17	0.1	250	10.2	2500	2972 G			4	26.40726	85.27572	Normal

IRI	53022
AVERAGE IRI	3118.9

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

X = 2500
Y = 2972

(R) RURAL ROAD
Average Good
4001-5000 >5001 Poor

Handwritten signature
15.12.2023

Handwritten signature
15-12-2023
AE

Handwritten signature
15.12.2023
