

पत्रांक.....429 (अनु)/

शेखपुरा, दिनांक.....19/03/2025/

प्रेषक:-

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 39,70,483/- (उनचालीस लाख सत्तर हजार चार सौ तेरासी रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 39,70,483/- (उनचालीस लाख सत्तर हजार चार सौ तेरासी रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन


(ई० विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा

प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- L034-T01 To Panaypur.

लम्बाई :-1.050 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


18/3/25

कनीय अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रशाखा,
शेखपुरासराय


19/03/25

सहायक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्यअ०प्रमं०,
शेखपुरासराय


19/3/25

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MNV/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content including waste plastic (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24-Sheikhpura/09, RM/SH/SHE/24/0006	L034-T01 To Panaypur	20803902171	Letter no.- 6120, dt.04.12.2023	1.050	72.600	40.43262	8.56082	08/MBD/2024-25 18.10.2024	17.07.2025	---	2365.5	25	5.015	0	0	39.70483	
																	39.70483	

18/12/25
J.E

19/01/25
D.E

RWD Works Division,
Sheikhpura

Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Name of Customer : Anand Kumar
 Name of Work/ Road : L034-T01 To Panaypur
 Lab Job number : 13
 Date : 17.03.2025
 Section No. : 13


Test Date : 17.03.2025
 Road Name : L034-T01 To Panaypur
 Machine No : 484
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No :
 Start E No :
 Side :
 Weather :
 UV Range : 1260 To 4000 Interval 1000 mm/km
 Dist Range : 0 To 1.1
 Start Location :
 End Location :
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\L034-T01 To Panaypur 1050m\17121317.xls, Section No. : 13, Eqn : $Y = 0 * X^2 +$
 Name of Customer : Anand Kumar, Name of Work/ Road : L034-T01 To Panaypur, Lab Job number : 13

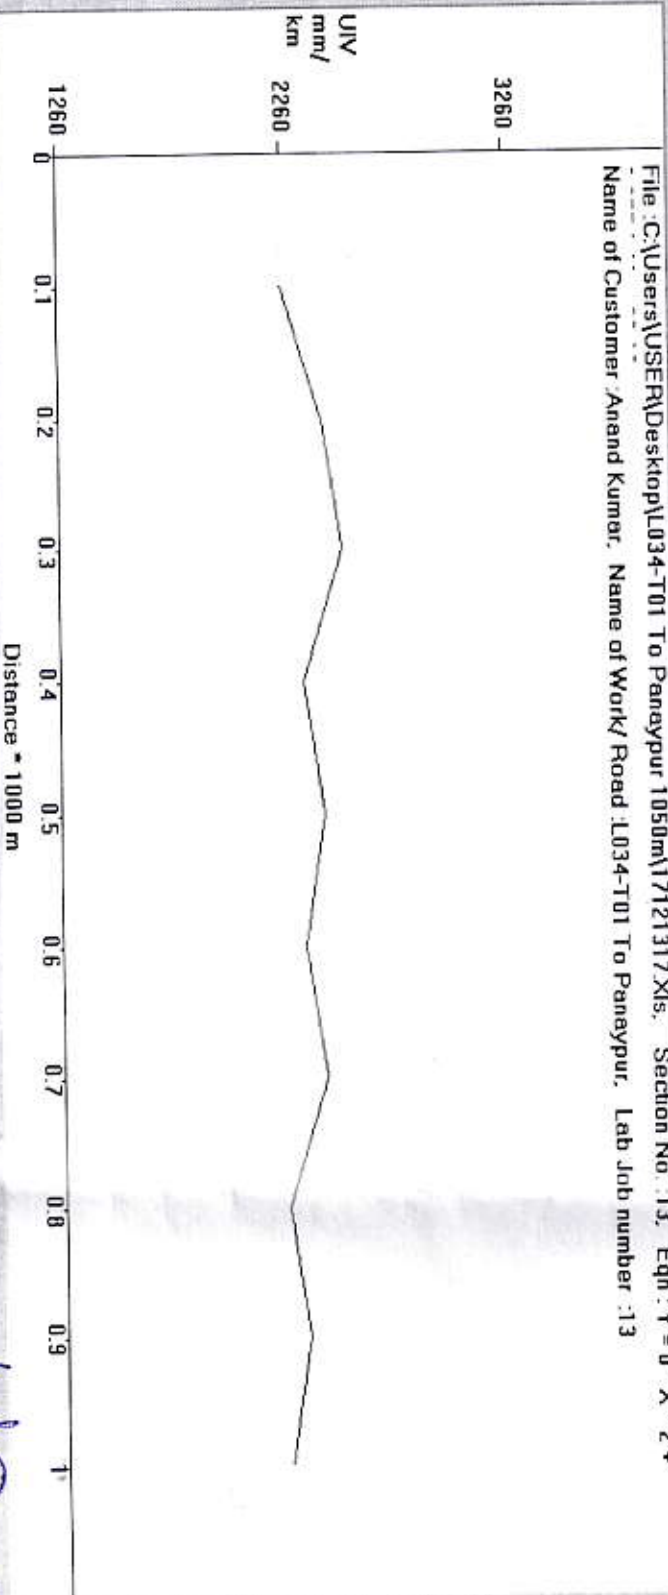

18/3/25
 J.E

19/03/25
 J.E

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Sneikhpura

Name of Road :- L034-T01 To Panaypur
Section no.-13

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
17/3/25	13:13:8	13	0.1	250	0	2500	2260	G	25.148421	85.724735	Normal
17/3/25	13:13:41	13	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.148421	85.724734	Normal
17/3/25	13:14:3	13	0.1	280	10.1	2800	2523	G	25.148422	85.724734	Normal
17/3/25	13:14:45	13	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.148422	85.724735	Normal
17/3/25	13:15:6	13	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.163676	85.729325	Normal
17/3/25	13:15:41	13	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.139793	85.72195	Curve
17/3/25	13:16:5	13	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.145443	85.725477	Normal
17/3/25	13:16:38	13	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.145443	85.725477	Normal
17/3/25	13:17:4	13	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.149807	85.722912	Normal
17/3/25	13:17:46	13	0.1	250	10.1	2500	2260	G	25.135854	85.726439	Normal
Total=			1.00	Km	Avg. 2365.50						

18/3/25
g.E

19/3/25
atc

19.3.25
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,
Sheikhpura
