

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

पत्रांक:-

1019

लखीसराय / दिनांक:- 19-08-2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, लखीसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी
नई अनुरक्षण नीति 2018 (MR 3054),
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय:-

MR 3054/ "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध
में आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि MR 3054/ "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अन्तर्गत T04 to Amarapur पथ का कार्य पूर्ण हो चुका है। उक्त पथ में किये कार्य के भुगतान हेतु 59.05521 लाख (उनसठ लाख पांच हजार पांच सौ इक्कीस रुपये) मात्र के भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में तैयार कर समर्पित की जाती है।
अतः सादर अनुरोध है कि शीघ्र आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


19.08.2021
कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय

RWD Works Division, Lakhisarai

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Manitenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Lakhisarai

S.N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (%)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MIR-N/19-20 Lakhisara i/06	TOS to Amarpur	20803902105	3105 & 19.07.2019	2.887	96.09400	67.12300	24.80065	19/MBO/2020-21 & 05.08.2020	25.05.2021		3527	25	5.09	0	()	59.05521	Surface 2.540 Km Completed

[Signature]
19-08-2021

Executive Engineer
RWD Works Division Lakhisarai

Name of Road :- T04 Amarapur (Total Length:-2.887 KM but Constructed Length :-2.540 KM)											
Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
23/6/21	14:54:6	7	0.1	300	0	3000	2961 G	ROAD	25.13645	86.171212	Normal
23/6/21	14:54:6	7	0.1	300	20.2	3000	2961 G		25.13726	86.170858	Normal
23/6/21	14:54:41	7	0.1	340	20.2	3400	3333 G		25.13815	86.170673	Normal
23/6/21	14:55:0	7	0.1	340	20.2	3400	3333 G		25.13906	86.170605	Normal
23/6/21	14:55:0	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.13999	86.170437	Normal
23/6/21	14:55:17	7	0.1	380	20.2	3800	3705 G		25.14088	86.170522	Normal
23/6/21	14:55:17	7	0.1	390	20.2	3900	3798 G		25.14181	86.170757	Normal
23/6/21	14:56:0	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.14272	86.17079	Normal
23/6/21	14:56:0	7	0.1	300	30.3	3000	2961 G		25.14365	86.17074	Normal
23/6/21	14:56:27	7	0.1	400	20.2	4000	3891 G		25.14451	86.170522	Normal
23/6/21	14:56:27	7	0.1	380	20.2	3800	3705 G		25.14537	86.170218	Normal
23/6/21	14:57:2	7	0.1	400	20.2	4000	3891 G		25.14626	86.169865	Normal
23/6/21	14:57:2	7	0.1	340	30.3	3400	3333 G		25.14716	86.16968	Normal
23/6/21	14:57:2	7	0.1	380	20.2	3800	3705 G		25.14806	86.169628	Normal
23/6/21	14:58:0	7	0.1	340	20.2	3400	3333 G		25.1487	86.17012	Normal
23/6/21	14:58:13	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.14958	86.170268	Normal
23/6/21	14:58:49	7	0.1	390	20.2	3900	3798 G		25.15049	86.170302	Normal
23/6/21	14:59:0	7	0.1	300	30.3	3000	2961 G		25.15135	86.17042	Normal
23/6/21	14:59:24	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.15227	86.170522	Normal
23/6/21	14:59:44	7	0.1	300	30.3	3000	2961 G		25.1532	86.17066	Normal
23/6/21	15:00:05	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.15411	86.17074	Normal
23/6/21	15:00:21	7	0.1	390	20.2	3900	3798 G		25.15501	86.17088	Normal
23/6/21	15:00:49	7	0.1	380	20.2	3800	3705 G		25.15607	86.17099	Normal
23/6/21	15:01:00	7	0.1	350	20.2	3500	3426 G		25.15701	86.17103	Normal
23/6/21	15:01:24	7	0.1	370	20.2	3700	3612 G		25.15807	86.17121	Normal
23/6/21	15:01:54	7	0.05	350	10.1	3500	3426 G		25.15899	86.17129	Normal

$$Y = 0 * X^2 + 0.930 * X + 171.2$$

$$X = 3500$$

$$Y = 3426$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

<4000 4001-5000 >5001

19.08.2021

E.E.
RWD works Division
Lakhisarai

Name of Customer: Jyandhi Ki and Co. Sonar Pvt. Ltd.
 Name of Work/Road: T04 to Amarpur
 Lab Job number:
 Date: 6/23/2021
 Section No.: 7


Test Date: 6/23/2021 Road Name: T04 to Amarpur
 Machine No.: 411 Road Type: (R) RURAL ROAD
 Start S No.: Side: Interval:
 Start E No.:
 Weather:
 Start Location: 0 To 27 01 1000 m
 End Location: 2540 Equation: $Y = 0 \cdot X^2 + 0.930 \cdot X + 171.2$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View

File: C:\OFFICIAL\Lehkarisari Bump\Amarpur\23061505.xls, Section No.: 7, Eqn: $Y = 0 \cdot X^2 + 0.930 \cdot X + 171.2$


Name of Customer: Name of Work/Road: Lab Job number:

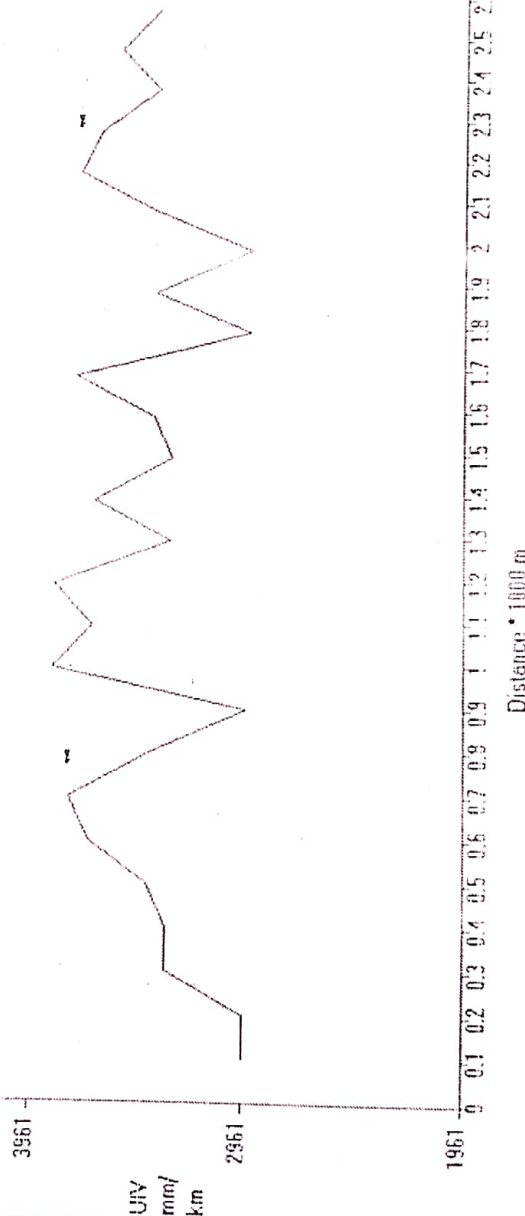

19.08.2021
 E.C. Roads
 RWD, Lakshona
 Div. Lakshona

बिहार सरकार
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, लखीसराय

प्रामाणित किया जाता है कि 3054(MR)/ नई अनुरक्षण नीति 2018 के अन्तर्गत निर्मित T04 to Amarpur पथ की कुल लम्बाई 2.887 कि०मी० है, जिसमें से केवल 2540 मीटर में Surface का कार्य पूर्ण हो सका क्योंकि आगे आरेखन उपलब्ध नहीं है। केवल निर्मित लम्बाई 2540 मीटर के लिए राशि की अधियाचना की जा रही है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल लखीसराय
