


RURAL WORKS DEPARTMENT

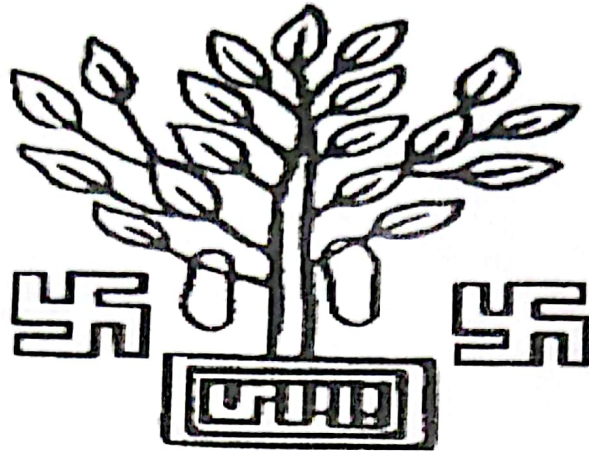

GOVERNMENT OF BIHAR

NAME OF ROAD:- RESTORATION OF ROAD FROM SIMRAHA TO AHMADPUR

DIVISION:- R.W.D, WORKS DIVISION, FORBESGANJ

CIRCLE:- R.W.D, WORK CIRCLE, KISHANGANJ

BLOCK:- FORBESGANJ

ESTIMATED COST

909059.00

ग्रामीण कार्य विभाग
बिहार, सरकार

पत्रांक - मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/07/2021

प्रेषक,

पंकज कुमार पाल (भा0प्र0से0)
सचिव

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,

विषय-

बाढ़ अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों/पुलियों को यातायात लायक (Motorable) करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेश दिया जाता है कि प्रमंडल अन्तर्गत सभी अभियंता बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पथों का शत प्रतिशत निरीक्षण करेंगे। पथों/पुलियों के क्षतिग्रस्त भाग से पानी उतरते ही उसे यातायात लायक बनाने की कारवाई एवं Motorable किये जाने से पहले तथा Motorable कार्य के बाद का Real time, Geo tagged photographs को MIS पर तत्क्षण अपलोड किया जाना सुनिश्चित करेंगे। इन कार्यों को कराने हेतु कार्यपालक अभियंता पूर्ण रूप से जिम्मेवार होंगे। कार्य न कराने की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की बाध्यता होगी।

विश्वासभाजन
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक- मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी अधीक्षण अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे लगातार अनुश्रवण एवं निरीक्षण करते हुए क्षतिग्रस्त भाग को अतिशीघ्र यातायात लायक बनवाने की कारवाई सुनिश्चित करेंगे।

सचिव

ज्ञापांक-मु0अ0-4 (मु0) विविध कार्य-23-60/2020 - 1937

पटना, दिनांक 07/7/2021

प्रतिलिपि:-सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं लगातार अनुश्रवण करने हेतु प्रेषित।

सचिव

Inspection Report for Flood Damage Work

1. Name of PIUs

: EE RWD Forbesganj

2. Name Of Block / Road

: Forbesganj / Simraha to Ahmadpur.

A. For Road

1. Damage Location / Chainage

: 24/56614, 87330585

2. Damage Length

: 117m

3. Nature Of Damage

: Flood damage depth 4 to 5m

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

: Local Sand, BrickLak, bamboo pile, Rebar

ii) Equipment / Tools Being Used In Restoration Works

: Tractor JCB, Roller Bamboo piles machine

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

: filling all cuts properly in damage area

iv) Restored Length

: 117m

B. For Bridge

1. Damage Location / Chainage

:

2. Damage Length

:

3. Nature Of Damage

:

4. Details Of Restoration

:

i) Material Being Used In Restoration

:

N/A

ii) Equipment / Tools Being Used in Restoration Works

:

iii) Procedure Taken Up In Restoration Works

:

iv) Restored Length

:

"S"

Signature of JE / AE / EE

Signature

(Name Of Inspector)

प्रतिवेदन

प्रस्तुत प्राक्कलन ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज अंतर्गत

फा. (विभाग) प्रखंड के पथ सीमराहा के अहमदपूर

..... जो विभागीय Online Monitoring System MIS पर अपलोड है के बाद 2021 से क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण यातायात लायक Motorable हेतु बनाया गया है। इस कार्य को कराने का निर्देश ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-मु0अ0-4(मु0) विविध कार्य-23-60/2020-1937/पटना, दिनांक-07.07.2021 से प्राप्त है। इस पत्र के Real time geo-tagged Photograph को कार्य के दौरान अपलोड करते हुए (Motorable) कार्य कराना सुनिश्चित करने का निर्देश प्राप्त है।

उक्त निर्देश के आलोक में सीमराहा नदी/नदी उपधार एवं अतिवृष्टि से आए बाढ़ के कारण इस पथ के Road Way के क्षतिग्रस्त हो जाने से सुरक्षित आवागमन हेतु Motorable कार्य कराया गया है। नेपाल तराई से निकलने वाली इस नदी के तेज धार एवं अतिवृष्टि से इस पथ में कटाव की स्थिति बनी। Motorable कार्य में आवश्यकता अनुसार Bamboo Pilling/Pitching of E.C Bags filled with local sand/ Local Sand Filling/ Brick bats का इस्तेमाल किया गया है। Motorable कार्य कराकर यातायात बहाल कर दिया गया है। निर्देशानुसार कराये गये Geo-tagged Photograph real time के साथ MIS पर अपलोड है। MIS की छायाप्रति, अपलोडेड फोटोग्राफ की छायाप्रति दर विश्लेषण एवं विभागीय आदेशों की छायाप्रति प्राक्कलन में संलग्न की जा रही है। प्राक्कलन में प्रयुक्त दर अद्धतन है।

प्राक्कलन की यथा शीघ्र अनुमोदन अपेक्षित है ताकि अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

Alm
25/8/21

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रशाखा-

25/8/21

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर प्रमंडल-

25/8/21

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, फारबिसगंज

Abstract of Cost

Name of Work:- Estimate for Repairing/Restoration/ Making Motorable Roads
Damaged during Flood In JULY 2021 In ARARIA District

Name of Roads: Restoration of Road From Simraha to Ahmadpur

BLOCK:- FORBESGANG

DISTRICT:-ARARIA

Divison:- RWD, Works Division, FORBESGANJ

Circle:-RWD, Works Circle, Kishanganj

Cost of RESTORATION

Rs.

909059.00

TOTAL COST OF RESTORATION Rs.

909059.00

Say Rs.

909059.00


25/8/21
J.E


25/8/21
A.E


25/8/21
E.E.

Technically Sanctioned for Rs = 9,09,059.00 (Rupees Nine Lacs
Nine thousand five hundred and fifty Nine) only.


28/4/22
Superintending Engineer
RWD (W) Circle-Kishanganj

सिमेंट अड्डा



म
25/8/21
R



(m
 28/8/21
 11/2
