

पत्रांक 2300 (30)

शेखपुरा, दिनांक 9.11.2023 /

प्रेषक:-

ई0 विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 1,51,29,754/- (एक करोड़ एकावन लाख उनत्तीस हजार सात सौ चौवन रुपये) मात्र की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 1,51,29,754/- (एक करोड़ एकावन लाख उनत्तीस हजार सात सौ चौवन रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि कराये गये कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

अनु0:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन



(ई0 विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमण्डल,

शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23, Sheikhpura-11	Const. of road from Belchhi more Husainabad to Beldariya Tola & Paswan Tola.	20803903085	Letter no- 1796, dt.20.03.2023	3.625	218 290	156.53695	47.69399	16(MBD)/ 23-24 14.07.2023	13.04.2024	---	2849.31	25	5.015	0	0	151.29754	
																	151.29754	

D.A.O.
RWD Works Division,
Sheikhpura

Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

9/11/23
9/11/23


प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- Const. of road from Belchhi more Husainabad to Beldariya Tola Via
Milki Tola & Paswan Tola.

लम्बाई :- 3.625 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त
पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में
निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक
अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं
विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार
100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं
50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य
का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


(ई० विमल कुमार)
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

Name of Road:-Belchhi more Husainabad To Beldariya Tola Via Milki Paswan Tola.

Section no.-63

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
8/11/23	11:15:8	63	0.1	240	0	2400	2418	G	25.103225	85.851197	Normal
8/11/23	11:15:42	63	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.102663	85.851012	Normal
8/11/23	11:16:18	63	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.101689	85.851017	Normal
8/11/23	11:16:39	63	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.100752	85.850898	Normal
8/11/23	11:17:0	63	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.099862	85.850674	Normal
8/11/23	11:17:29	63	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.099293	85.850119	Normal
8/11/23	11:17:44	63	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.098654	85.850027	Normal
8/11/23	11:18:4	63	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.101815	85.850403	Normal
8/11/23	11:18:54	63	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.101974	85.849538	Curve
8/11/23	11:19:10	63	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.102025	85.84863	Normal
8/11/23	11:19:40	63	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.102031	85.847905	Normal
8/11/23	11:20:14	63	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.102085	85.846958	Normal
8/11/23	11:20:50	63	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.102096	85.846199	Normal
8/11/23	11:21:10	63	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.101995	85.845393	Normal
8/11/23	11:21:55	63	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.101817	85.844478	Curve
8/11/23	11:22:10	63	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.101565	85.843576	Normal
8/11/23	11:22:32	63	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.100884	85.843417	Normal
8/11/23	11:23:0	63	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.100762	85.841002	Curve
8/11/23	11:23:45	63	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.100545	85.843182	Normal

hm
9.11.2023
92

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
8/11/23	11:24:0	63	0.1	290	20.2	2900	2929	G	25.100067	85.840628	Normal
8/11/23	11:24:43	63	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.100782	85.842069	Normal
8/11/23	11:25:0	63	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.099371	85.84071	Curve
8/11/23	11:25:41	63	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.098387	85.840976	Speed Breaker
8/11/23	11:26:12	63	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.097577	85.840917	Normal
8/11/23	11:26:47	63	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.096857	85.840743	Normal
8/11/23	11:27:2	63	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.096178	85.840443	Normal
8/11/23	11:27:42	63	0.1	310	20.2	3100	3133	G	25.095423	85.84024	Normal
8/11/23	11:28:17	63	0.1	300	20.2	3000	3031	G	25.094546	85.839828	Normal
8/11/23	11:28:48	63	0.1	300	20.2	3000	3031	G	25.093598	85.839725	Normal
8/11/23	11:29:17	63	0.1	250	20.2	2500	2520	G	25.093052	85.839816	Normal
8/11/23	11:29:53	63	0.1	270	20.2	2700	2724	G	25.092265	85.839769	Normal
8/11/23	11:30:11	63	0.1	300	20.2	3000	3031	G	25.091536	85.8398	Normal
8/11/23	11:30:48	63	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.090149	85.839442	Normal
8/11/23	11:31:12	63	0.1	290	20.2	2900	2929	G	25.089601	85.839355	Normal
8/11/23	11:31:48	63	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.087383	85.838768	Normal
8/11/23	11:32:3	63	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.086766	85.838611	Normal
Total =			3.600	Km	Avg. 2849.31						

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,
Sheikhpura

9.11.23


9.11.23

Steco Analyzer

Name of Customer : Sanjay Kumar Technocrate Pvt
 Name of Work : Belchi more Husainabad To B.
 Road :
 Lab Job number : 63
 Date : 08.11.2023
 Section No. : 63

Test Date : 08.11.2023
 Road Name : Belchi more Husainabad To E
 Machine No : 399
 Road Type : (R) RURAL ROAD
 Start S No :
 Side :
 Start E No :
 Interval
 Weather :
 UV Range : 1418 To 4000 1000 mm/km
 Dist Range : 0 To 3.7 0.1 * 1000 m
 Start Location :
 End Location :
 Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$

Name of Customer : Sanjay Kumar Technocrate Pvt. Ltd. Name of Work/ Road : Belchi more Husainabad To

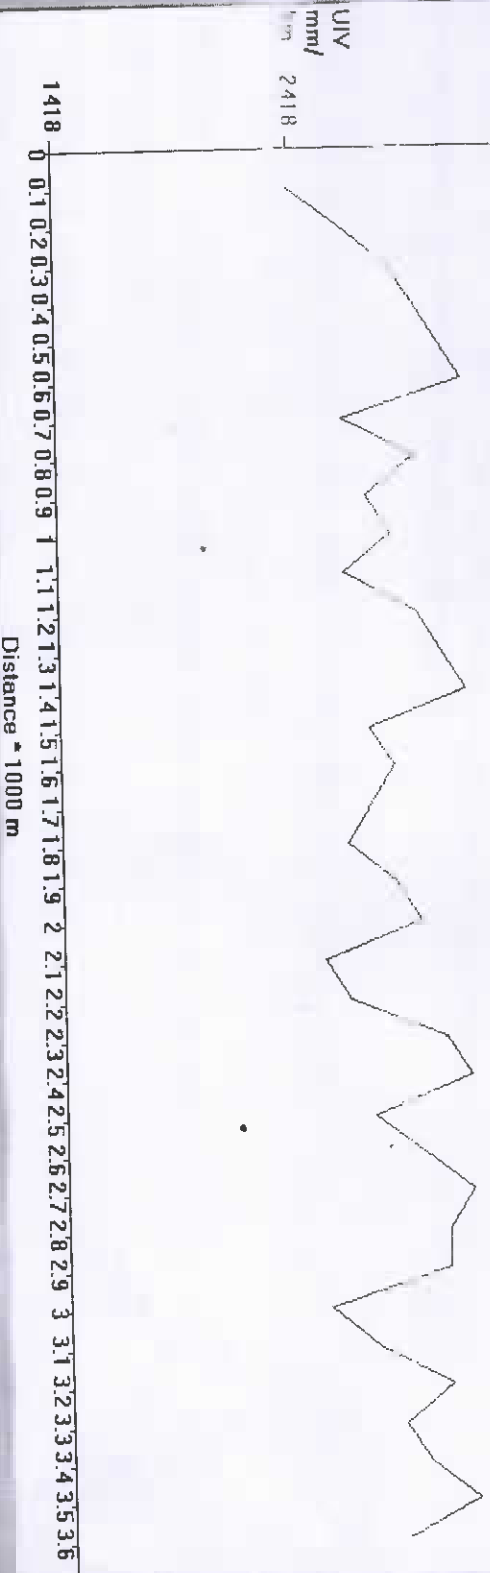

Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Sheikhpura
