

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

पत्रांक 451/अनु०

रक्सौल, / दिनांक 05-04-21

प्रेषक :-

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, रक्सौल।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-सचिव,
बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेन्सी,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 के तहत आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गैर योजना शीर्ष-3054 अन्तर्गत बिहार ग्रामीण पथ अनुक्षण नीति-2018 संलग्न सूची के अनुसार आवंटन अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित किया जाता है।

अनुलग्नक :- संलग्न सूची

1. पथों का आवंटन अधियाचना प्रपत्र।

विश्वासभाजन,


31/3/2021

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य, प्रमंडल, रक्सौल।
Sejae
05-04-21

Requisition of Allotment under Head MR HEAD-3054 Under Bihar Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)


Raxaul

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Contractor Name	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No. & Date	A.A.		Agreement Value		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/Km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent	Previous Total Allotted Amount	up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done. (in Lakh)	Remarks
						Length (in Km)	Total (Amount) (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Yrs Routine Maintenance (in Lakh)										
1	MR-N/19-20/Raxaul /15	NH-28 A to Senariya	M/S Ganpati Construction	31708502012	होशो-4 (गो) 3054-04-117-2 019, 5128/वृत्त, दिनांक-24.09. 2019	1.102	38.703	24.76400	10.9537	184 SBD/2020-21	18-09-2021	-	3460	25mm	5	0	0	24.76400	Work in Progress


Executive Engineer,
 Rural Works Department,
 Works Division, Raxaul
 05.04.21

Name of Customer : M/S Ganpati Construction
 Name of Work/ Road : NH-28 A to Senuariya
 Lab Job number : 2403-2021
 Date : 24/3/21
 Section No. : 28

Test Date :	24-03-2021	Road Name :	NH-28 A to Senuariya
Machine No :	422	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	0.00 KM	Side :	
Start E No :	1.10 KM	Interval	
Weather :	Normal	UV Range :	1440 To 5000 1000 mm/km
Start Location :	26.948430	Dist Range :	0 To 1.2 0.1 * 1000 m
End Location :	26.944813	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 0.863 * X + 628.2$

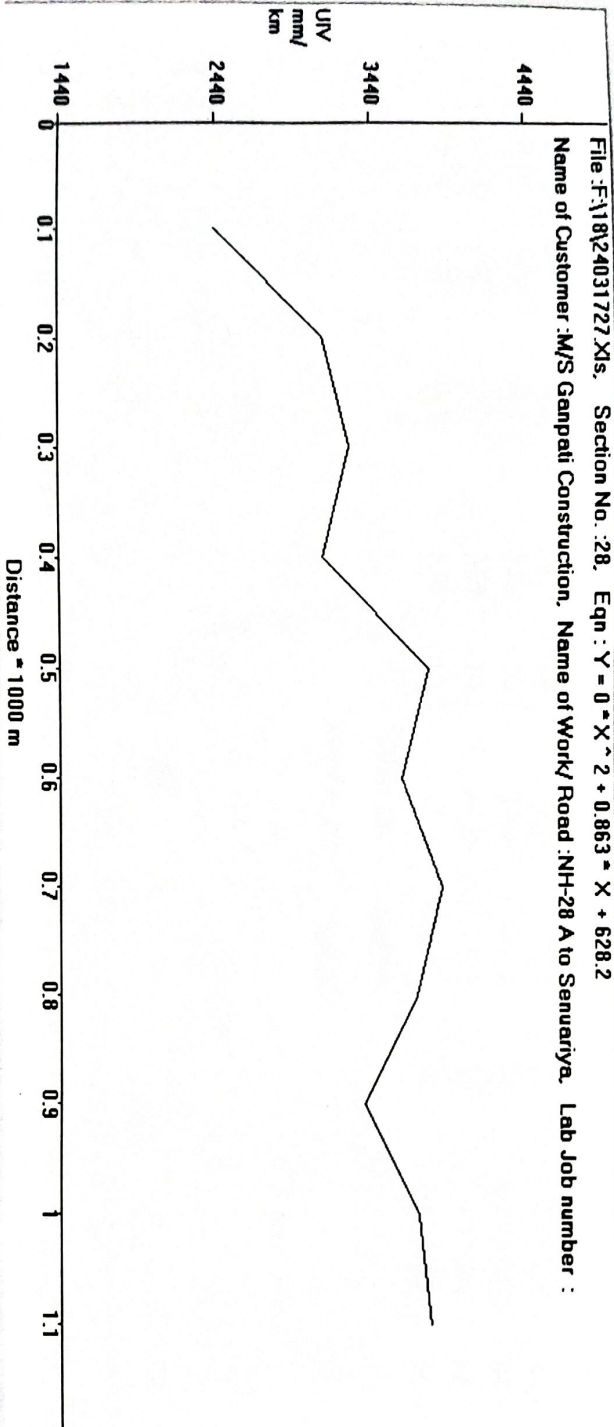


यह रीडिंग मजबूत है मरम्मत करी शुरू हो चुका है।
 यह रीडिंग मरम्मत करी लिए होय गरी है।

24/3/21
 JE/Raxaul

DRP

Road Name-NH-28 A to Senuariya , Contractor -M/S Ganpati Construction

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event	
24/3/21	16:53:35	28	0.1	210	0	2100	2440	G	26.94843	84.840723	Normal	$Y = 0 * X^2 + 0.863 * X + 628.2$
24/3/21	16:55:33	28	0.1	290	0	2900	3130	G	26.94697	84.838988	Normal	$X = 3700$
24/3/21	16:56:8	28	0.1	310	20.2	3100	3303	G	26.94747	84.838248	Normal	$Y = 3821$
24/3/21	16:56:8	28	0.1	290	20.2	2900	3130	G	26.94799	84.837473	Curve	
24/3/21	16:56:8	28	0.1	370	10.1	3700	3821	G	26.94759	84.836885	Curve	(R) RURAL ROAD
24/3/21	16:56:43	28	0.1	350	20.2	3500	3648	G	26.94676	84.836447	Curve	Good
24/3/21	16:57:19	28	0.1	380	10.1	3800	3907	G	26.94595	84.836077	Speed Breaker	Average
24/3/21	16:57:19	28	0.1	360	10.1	3600	3735	G	26.94519	84.835538	Normal	Poor
24/3/21	16:58:0	28	0.1	320	10.1	3200	3389	G	26.94497	84.834662	Normal	
24/3/21	16:58:29	28	0.1	360	10.1	3600	3735	G	26.94491	84.833652	Speed Breaker	
24/3/21	16:59:4	28	0.1	370	10.1	3700	3821	G	26.94481	84.833332	Speed Breaker	
		TOTAL IRI					38059					
		AVERAGE I					3460					


 J.E.
 Raxaul

AE


 EXECUTIVE ENGINEER
 RURAL WORK DEPARTMENT
 WORKS DIVISION, RAXAUL
 05.04.21

$Y = 0 * X^2 + 0.863 * X + 628.2$
 $X = 3700$
 $Y = 3821$
 (R) RURAL ROAD
 Good Average Poor
 <4000 4001-5000 >5001
