

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, हाजीपुर

पत्रांक:- 1592(अनु)

/दिनांक:- 18.8.2024

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-
सचिव, बिहार, ग्रामीण पथ विकास अभिकरण,
पटना।

विषय:- शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति मद का अधियाचना के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति मद योजनान्तर्गत इस प्रमंडल अंतर्गत चल रहे पथों के निर्माण कार्यों हेतु कुल 73.87159 लाख रुपये आवंटन की आवश्यकता है।

अतः अनुरोध है कि उक्त मांग की गयी राशि उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु: - अधियाचना विहित प्रपत्र में।

विश्वासभाजन

9/8/24

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल,
हाजीपुर।

Notification format for Scheme Head - MR (3054) Under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division - RWD Works Division, Hajipur		Project ID as per MIS		Administrative Approval (AA) Letter No & Date		Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No/ Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percent	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date Expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
Sl No	Package No	Name of Road	MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)	Length (in KM)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification With Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance (in Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Batch no- R/W V.A.Hajaj 2004	Essampur Basdev to Lakhan Saray Tej Singh Path	316751035002	3352/01.08.19	3.75	109.33	73.95676	35.29140	52 MBD/ 2020-21 dt- 09.09.2020	07.08.2021	07.08.21	1554.32	25.00	5.03	0.00	0.00	73.87159		
																	73.87159		

1 Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI is enclosed.
2 Up-to-date Physical Progress has been Uploaded in MIS.

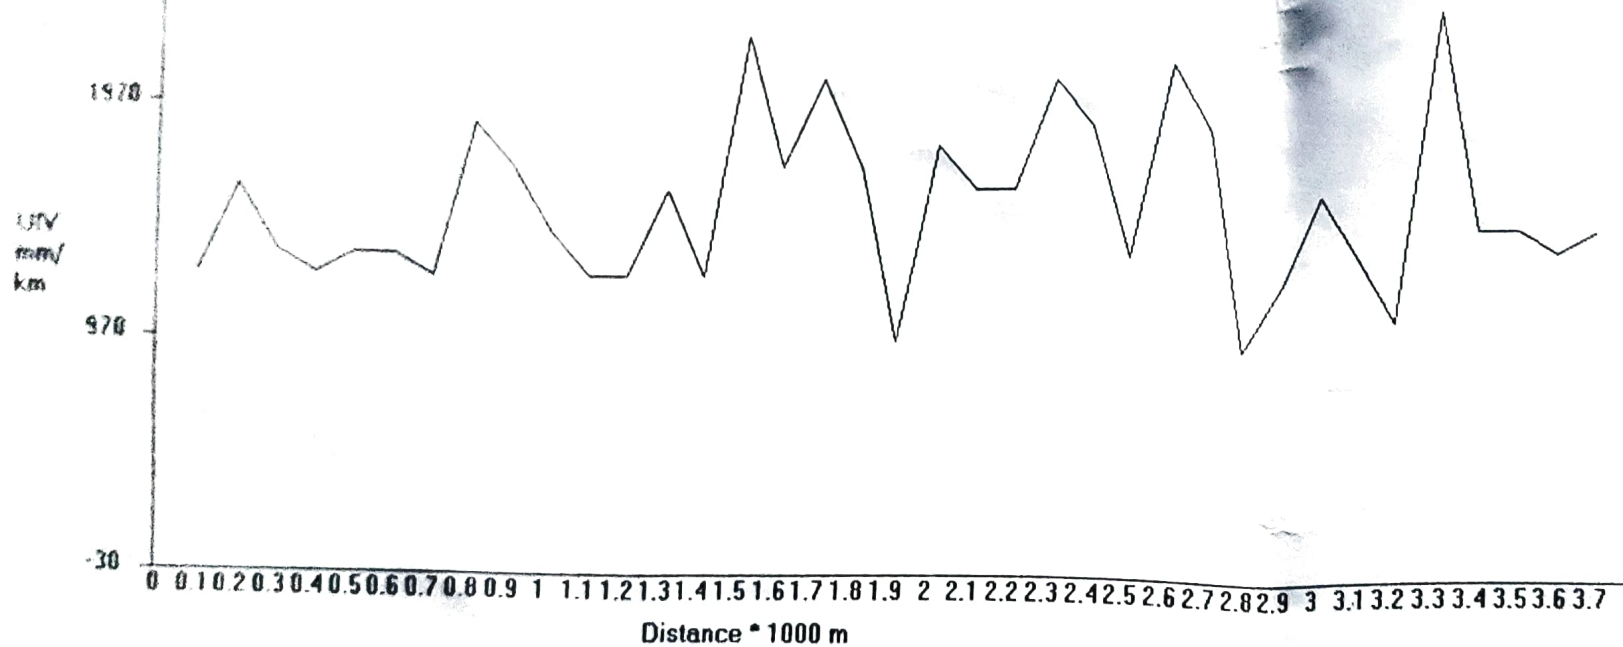

Executive Engineer
RWD, Works Division,
Hajipur.

Date	Time	Section No	Length in km	Bumps in mm	Name of Road - Bisanpur basdev to lakhan saray tej singh path	Speed Rate mm/km	OR mm/km	IRI ROAD CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
7/8/21	16:51:0	45	0.1	100	0	1000	1252 G	25.91896	85.236852	Normal	Y = 0 * X ^ 2 + 0.94 * X + 312.18 X = 1200 Y = 1440
7/8/21	16:51:0	45	0.1	140	20.2	1400	1628 G	25.91875	85.237878	Normal	
7/8/21	16:51:29	45	0.1	110	20.2	1100	1346 G	25.91855	85.23882	Normal	
7/8/21	16:52:4	45	0.1	100	20.2	1000	1252 G	25.91831	85.239813	Curve	
7/8/21	16:52:39	45	0.1	110	10.1	1100	1346 G	25.91788	85.240588	Normal	(R) RURAL ROAD Good Average Poor <4000 4001-5000 >5001
7/8/21	16:52:39	45	0.1	100	20.2	1000	1252 G	25.91774	85.241548	Normal	
7/8/21	16:52:39	45	0.1	170	30.3	1700	1910 G	25.91739	85.242407	Normal	
7/8/21	16:53:0	45	0.1	150	30.3	1500	1722 G	25.91727	85.2434	Normal	
7/8/21	16:53:15	45	0.1	120	20.2	1200	1440 G	25.91709	85.244427	Normal	
7/8/21	16:53:15	45	0.1	100	20.2	1000	1252 G	25.9166	85.244965	Normal	
7/8/21	16:53:50	45	0.1	100	20.2	1000	1252 G	25.91578	85.244662	Normal	
7/8/21	16:54:0	45	0.1	140	20.2	1400	1628 G	25.91481	85.244595	Normal	
7/8/21	16:54:25	45	0.1	100	20.2	1000	1252 G	25.91392	85.244713	Normal	
7/8/21	16:54:25	45	0.1	210	30.3	2100	2286 G	25.91299	85.244645	Normal	
7/8/21	16:54:25	45	0.1	150	20.2	1500	1722 G	25.91212	85.244595	Normal	
7/8/21	16:54:25	45	0.1	190	30.3	1900	2098 G	25.91116	85.24468	Normal	
7/8/21	16:55:1	45	0.1	150	10.1	1500	1722 G	25.9104	85.24508	Normal	
7/8/21	16:55:36	45	0.1	70	20.2	700	970 G	25.90966	85.245723	Normal	
7/8/21	16:55:36	45	0.1	160	20.2	1600	1816 G	25.90926	85.24507	Normal	
7/8/21	16:56:0	45	0.1	140	20.2	1400	1628 G	25.90906	85.244073	Curve	
7/8/21	16:56:11	45	0.1	140	20.2	1400	1628 G	25.90817	85.243955	Normal	
7/8/21	16:56:11	45	0.1	190	20.2	1900	2098 G	25.90729	85.24377	Normal	
7/8/21	16:56:46	45	0.1	170	20.2	1700	1910 G	25.90654	85.243803	Normal	
7/8/21	16:57:0	45	0.1	110	10.1	1100	1346 G	25.90619	85.24473	Normal	
7/8/21	16:57:22	45	0.1	200	20.2	2000	2192 G	25.90554	85.245252	Normal	
7/8/21	16:57:22	45	0.1	170	20.2	1700	1910 G	25.90533	85.246245	Normal	
7/8/21	16:58:0	45	0.1	70	10.1	700	970 G	25.90522	85.247222	Speed Breaker	
7/8/21	16:58:0	45	0.1	100	10.1	1000	1252 G	25.90438	85.247037	Normal	
7/8/21	16:58:32	45	0.1	140	20.2	1400	1628 G	25.90353	85.24678	Normal	
7/8/21	16:59:0	45	0.1	110	10.1	1100	1346 G	25.90268	85.24678	Normal	
7/8/21	16:59:7	45	0.1	80	20.2	800	1064 G	25.90173	85.246985	Normal	
7/8/21	16:59:7	45	0.1	220	20.2	2200	2380 G	25.90084	85.24707	Normal	
7/8/21	16:59:43	45	0.1	120	20.2	1200	1440 G	25.89995	85.247373	Normal	
7/8/21	17:0:18	45	0.1	120	10.1	1200	1440 G	25.89942	85.248013	Normal	
7/8/21	17:0:18	45	0.1	110	10.1	1100	1346 G	25.89925	85.24847	Normal	
7/8/21	17:50:18	45	0.1	120	10.1	1200	1440 G	25.89892	85.24863	Normal	

AVG IRI = 1554.32


Executive Engineer
 R.W.D. Work Division
 Hejipur

File C:\Users\BRRDA41\Desktop\STECO\07081700.Xls, Section No. :45, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 0.94 \cdot X + 312.18$
 Name of Customer :Rajeev Kumar, Name of Work/ Road :Bisanpur basdev to lakhon saray tej singh path, Lab Job



[Signature]
 18/10
 Executive Engineer
 R.W.D. Work Division
 Hajipur
