

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, अरवल

पत्रांक.....209..... अरवल/दिनांक.....18-02-2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरवल

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (MR 3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
पटना, बिहार

विषय :-


नई अनुरक्षण नीति-2018MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नई अनुरक्षण नीति-2018 MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के लिए संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वास भाजन


कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, अरवल।

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy - 2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division- Arwal.

Sl No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter no. & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)			Agreement No. & Date	Date of Completion As per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (In MM/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content percentage	Previous Total Allocated Amount (In Lakh)	Up to date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with surface Renewal (In Lakh)	5 Years Routine Maintenance (In Lakh)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	RM/AR/R W/19/0007	Sahar Telpa - Kharasin	10603102065	3356/01.08.2019	3.37	94.79	63.54300	24.0341	31/MBD/M R- NEW/2020-2021	21.06.2021	12.02.2021	2646	25.00 MM	5.000 %	0.00	0.00	63.54300	Complete	
2		Mehandia Usari Road - Abgila	10603102013	3356/01.08.2019	2.54	74.27	50.82600	33.4722		21.06.2021	12.02.2021	2610	25.00 MM	5.000 %	0.00	0.00	50.82600	Complete	
		Total			5.910	169.060	114.36900	57.506									114.36900		

[Signature]
In-charge Accounts Officer
R.W.D.(W) Division
Arwal

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D.(W) Division
Arwal

Name Of Road Sahar Telpa - Kharasin

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	ROAD				
12/2/21	14:17:0	79	0.1	310	10.2	3100	3654 G	4.8	25.129182	84.661918	Normal
12/2/21	14:17:14	79	0.1	210	30.3	2100	2518 G	3.44	25.12863	84.662727	Normal
12/2/21	14:17:14	79	0.1	300	10.1	2600	2920 G	3.98	25.127815	84.66271	Normal
12/2/21	14:17:49	79	0.1	290	30.3	2900	3426 G	3.53	25.126997	84.663232	Normal
12/2/21	14:18:0	79	0.1	220	30.3	2200	2631 G	3.58	25.12607	84.663248	Normal
12/2/21	14:18:0	79	0.1	180	40.4	1800	2177 G	3.02	25.125268	84.663552	Normal
12/2/21	14:18:24	79	0.1	230	30.3	2300	2745 G	3.72	25.124632	84.664258	Normal
12/2/21	14:18:24	79	0.1	260	40.4	2600	3086 G	3.13	25.123755	84.664747	Normal
12/2/21	14:18:24	79	0.1	220	30.3	2200	2631 G	3.58	25.12291	84.66513	Normal
12/2/21	14:19:0	79	0.1	280	30.3	2800	3313 G	3.4	25.122012	84.665318	Normal
12/2/21	14:19:0	79	0.1	300	20.2	3000	3540 G	3.66	25.121312	84.66473	Normal
12/2/21	14:19:0	79	0.1	180	30.3	1800	2177 G	3.02	25.120535	84.66502	Normal
12/2/21	14:20:0	79	0.1	200	30.3	2000	2404 G	3.3	25.119572	84.664932	Normal
12/2/21	14:20:10	79	0.1	200	30.3	2000	2404 G	3.3	25.11882	84.664343	Speed Breaker
12/2/21	14:21:0	79	0.1	190	40.4	1900	2290 G	3.16	25.118273	84.663652	Normal
12/2/21	14:21:0	79	0.1	160	30.3	1600	1950 G	2.74	25.117385	84.663147	Normal
12/2/21	14:21:20	79	0.1	240	20.2	2400	2858 G	3.85	25.116603	84.662777	Normal
12/2/21	14:21:20	79	0.1	190	30.3	1900	2290 G	3.16	25.11563	84.66234	Speed Breaker
12/2/21	14:22:0	79	0.1	200	20.2	2000	2404 G	3.3	25.114875	84.661918	Normal
12/2/21	14:22:0	79	0.1	150	30.3	1500	1836 G	2.6	25.114058	84.661463	Normal
12/2/21	14:22:31	79	0.1	110	30.3	1100	1382 G	2.02	25.113507	84.662222	Normal
12/2/21	14:23:31	79	0.1	120	30.3	1200	1495 G	2.16	25.112903	84.66308	Normal
12/2/21	14:23:6	79	0.1	230	20.2	2300	2745 G	3.72	25.112473	84.663922	Normal
12/2/21	14:23:6	79	0.1	220	30.3	2200	2631 G	3.58	25.112305	84.664915	Normal
12/2/21	14:23:6	79	0.1	300	20.2	3000	3540 G	4.66	25.112342	84.665875	Normal
12/2/21	14:23:42	79	0.1	300	30.3	3000	3540 G	3.66	25.112618	84.666868	Normal
12/2/21	14:24:0	79	0.1	220	30.3	2200	2631 G	3.58	25.112692	84.667878	Normal
12/2/21	14:24:16	79	0.1	160	30.3	1600	1950 G	2.74	25.112552	84.668872	Normal
12/2/21	14:24:16	79	0.1	280	20.2	2800	3313 G	4.4	25.112063	84.669763	Normal
12/2/21	14:24:16	79	0.1	200	30.3	2000	2404 G	3.3	25.111507	84.670538	Normal
12/2/21	14:24:51	79	0.1	160	40.4	1600	1950 G	2.74	25.111223	84.671565	Normal
12/2/21	14:25:0	79	0.1	270	30.3	2700	3199 G	3.26	25.11097	84.672542	Speed Breaker
12/2/21	14:26:2	79	0.1	280	10.1	2800	3313 G	4.4	25.109587	84.672777	Normal
Total Length			3.3								

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 2218$$

$$Y = 2646$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

55.26.21
E" E

20.11.21
A.E

15/10/2021
J.E

Name of Customer : RT Construction Co
 Name of Work/ Road : Sahar Telpa - Kharasin
 Lab Job number : 79
 Date : 12/02/2021
 Section No. : 79


Test Date :	12-02-2021	Road Name :	Sahar Telpa - Kharasin
Machines No :	377	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	1121	Side :	Left
Start E No :	1152	Weather :	Normal
Interval :		UIV Range :	332 To 5000
Start Location :	25 12963 84 56	Dist Range :	0 To 34
End Location :	25 103587 84 1	Equation :	$Y = 0 \cdot X^2 + 1136 \cdot X + 1325$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph Map View

File : C:\Users\BRRPDA132\Desktop\12021428 Xls. Section No 79. Eqn $Y = 0 \cdot X^2 + 1136 \cdot X + 1325$
 Name of Customer : R K Construction Co. Name of Work/ Road : Sahar Telpa - Kharasin. Lab Job number : 79

4382
3382
2382
1382
382

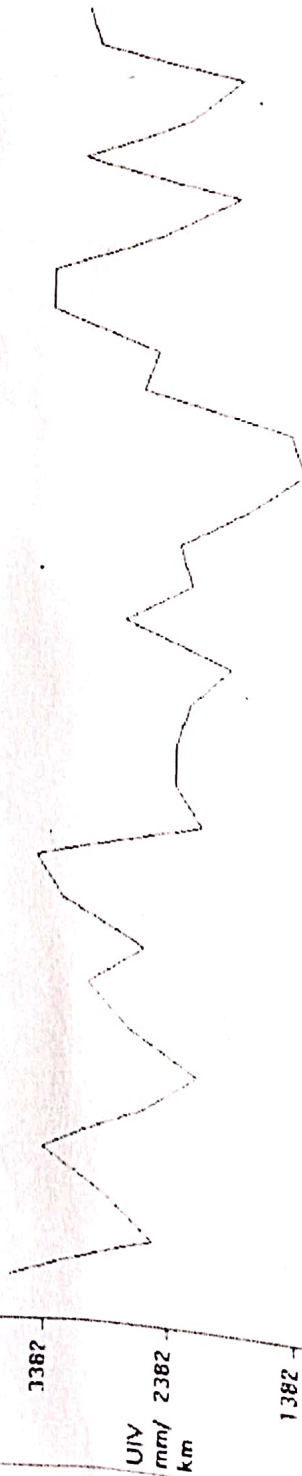

0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33
 Distance * 1000 m

[Signature]
 13/02/2021
 J.C

[Signature]
 17.2.21
 A.E

[Signature]
 18.2.21
 A.E
