

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, झाझा (जमुई)।

मोबाइल न०- 8986915861 ईमेल- rwdjhajha0@gmail.com

पत्रांक- 45 / झाझा दिनांक- 07.1.2021

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल झाझा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
"नई अनुरक्षण नीति 2018" (3054-MR)
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- 3054(MR)/ "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अंतर्गत कराये गए निम्न कार्यों के विरुद्ध में आवंटन उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।


महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि 3054(MR) / "नई अनुरक्षण नीति 2018" के अंतर्गत (1) Nakta to sanghara via jhumarbad (2) Jhajha -Chakai PWD Road to Chakai Near Chahabacha Road. (3) Salaia - Gobraha (4) Telwa Bazar-Birajpur Road to Gadi Telwa Road via Nawadih Ghasitari. (5) Ekdara more to Fatehpur Road. (6) Baghwa - Madhopur-Salaiya PMGSY Road एवं (7) Chakai-Deoghar PWD Road to Ghormo Asram (Sahana kothi) chakai-Kiyajori Road का Surface कार्य पूर्ण हो चुका है। कार्यों के विरुद्ध भुगतान हेतु आवंटन की अधियाचना विहित प्रपत्र में भर कर की जाती है।

अतः सादर अनुरोध है कि आवंटन उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन


07.1.2021

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, झाझा।

RWD Works Division, Jhajha (Dist :- Jamui)

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Manitenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:- Jhajha

S.N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of (RI) in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/19-20 JHA/JHA/11	Salaia - Gobraha	20804102075	1846 & 24.06.2019	4.18	138.345	81.58005	34.76647	34/MBD/MR N/2019-20 & 23.01.2020	22.10.2020	30.12.2020	3124	25	5.02	0	0	81.58005	Surface Completed
2	MR-N/19-20 JHA/JHA/20	Telwa Bazar-Birajpur Road to Gadi Telwa Road via Nawadih Ghasitari.	20804103008	3688 & 29.08.2019	2.90	103.135	69.9556	25.61502	58/MBD/MR N/2020-21 & 17.08.2020	16.05.2021	02.01.2021	3474	25	5.01	0	0	69.9556	Surface Completed

[Signature]
5-1-2021

Executive Engineer
RWD Works Division, Jhajha

Road Name :- Salala To Gobraha (Length:- 4.180 K.M)

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	UIV	CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event
5/1/21	15:19:15	59	0.1	270	0	2700	2682	ROAD	3.64	24.76089	86.363585	Normal
5/1/21	15:19:15	59	0.1	340	10.1	3400	3333	G	4.42	24.76007	86.363335	Normal
5/1/21	15:19:51	59	0.1	360	20.2	3600	3519	G	4.64	24.75914	86.363047	Normal
5/1/21	15:20:00	59	0.1	220	10.1	2200	2217	G	3.07	24.75826	86.362677	Normal
5/1/21	15:20:26	59	0.1	380	20.2	3800	3705	G	4.86	24.75743	86.362288	Normal
5/1/21	15:20:26	59	0.1	360	30.3	3600	3519	G	4.64	24.7566	86.361868	Normal
5/1/21	15:21:00	59	0.1	230	20.2	2300	2310	G	3.19	24.75576	86.361447	Normal
5/1/21	15:21:11	59	0.1	190	30.3	1900	1938	G	2.72	24.75505	86.360842	Normal
5/1/21	15:21:37	59	0.1	210	20.2	2100	2124	G	2.96	24.75438	86.36008	Normal
5/1/21	15:22:11	59	0.1	140	20.2	1400	1473	G	2.13	24.75388	86.359225	Normal
5/1/21	15:22:11	59	0.1	190	20.2	1900	1938	G	2.72	24.75336	86.3584	Normal
5/1/21	15:22:46	59	0.1	400	20.2	4000	3891	G	5.07	24.75273	86.357677	Normal
5/1/21	15:23:00	59	0.1	360	10.1	3600	3519	G	4.64	24.75194	86.35712	Normal
5/1/21	15:23:21	59	0.1	380	10.1	3800	3705	G	4.86	24.75114	86.3567	Normal
5/1/21	15:23:21	59	0.1	300	20.2	3000	2961	G	3.98	24.75031	86.356278	Normal
5/1/21	15:23:21	59	0.1	290	20.2	2900	2868	G	3.86	24.74944	86.355875	Normal
5/1/21	15:24:00	59	0.1	340	30.3	3400	3333	G	4.42	24.74854	86.355505	Normal
5/1/21	15:24:32	59	0.1	400	20.2	4000	3891	G	5.07	24.74766	86.355168	Speed Breaker
5/1/21	15:25:00	59	0.1	340	20.2	3400	3333	G	4.42	24.7468	86.35483	Normal
5/1/21	15:25:07	59	0.1	360	20.2	3600	3519	G	4.64	24.74594	86.354562	Normal
5/1/21	15:25:43	59	0.1	320	30.3	3200	3147	G	4.2	24.74506	86.354343	Normal
5/1/21	15:26:00	59	0.1	380	10.1	3800	3705	G	4.86	24.7442	86.354123	Normal
5/1/21	15:26:18	59	0.1	310	30.3	3100	3054	G	4.09	24.74326	86.353787	Normal
5/1/21	15:26:18	59	0.1	340	20.2	3400	3333	G	4.42	24.74245	86.353	Normal
5/1/21	15:26:18	59	0.1	320	30.3	3200	3147	G	4.2	24.74168	86.352878	Normal
5/1/21	15:27:00	59	0.1	320	30.3	3200	3147	G	4.2	24.74079	86.352575	Normal
5/1/21	15:27:00	59	0.1	290	30.3	2900	2868	G	3.86	24.7399	86.35244	Normal
5/1/21	15:27:00	59	0.1	340	30.3	3400	3333	G	4.42	24.73896	86.352322	Normal
5/1/21	15:27:28	59	0.1	250	30.3	2500	2496	G	3.41	24.73804	86.352188	Normal
5/1/21	15:27:28	59	0.1	280	30.3	2800	2775	G	3.75	24.73708	86.35207	Normal
5/1/21	15:27:28	59	0.1	320	30.3	3200	3147	G	4.2	24.73616	86.351952	Normal
5/1/21	15:28:40	59	0.1	360	10.1	3600	3519	G	4.64	24.73526	86.35182	Normal
5/1/21	15:28:40	59	0.1	390	20.2	3900	3798	G	4.97	24.73433	86.3517	Normal
5/1/21	15:28:39	59	0.1	360	20.2	3600	3519	G	4.64	24.73343	86.351347	Normal
5/1/21	15:29:14	59	0.1	310	30.3	3100	3054	G	4.09	24.73332	86.352172	Normal
5/1/21	15:29:14	59	0.1	390	20.2	3900	3798	G	4.97	24.73308	86.353163	Normal
5/1/21	15:29:14	59	0.1	330	30.3	3300	3240	G	4.31	24.73276	86.354107	Normal
5/1/21	15:30:00	59	0.1	250	30.3	2500	2496	G	3.41	24.73229	86.354948	Normal
5/1/21	15:30:25	59	0.1	310	30.3	3100	3054	G	4.09	24.73181	86.355842	Normal
5/1/21	15:31:00	59	0.1	360	20.2	3600	3519	G	4.64	24.73143	86.35673	Normal
5/1/21	15:31:00	59	0.1	390	20.2	3900	3798	G	4.97	24.73098	86.357625	Normal
5/1/21	15:31:00	59	0.085	360	20.2	3600	3519	G	4.64	24.73041	86.35845	Normal

$$Y = 0 \cdot X^2 + 0.930 \cdot X + 171.20$$

$$X = 5100$$

$$Y = 4914$$

(R) RURAL ROAD
Good Average Poor
<4000 4001-5000 >5001

07.01.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division. Jhriha


Name of Customer:	SaShiCo Pvt Ltd
Name of Work/Road:	SaSa To Gobraha
Lab Job number:	
Date:	1/5/2021
Section No.	59

Test Date:	1/5/2021	Road Name:	SaSa To Gobraha
Machine No:	411	Road Type:	(R) RURAL ROAD
Start S No:		Side:	
Start E No:		Interval:	
Weather:		UV Range:	473 To 5000 mm/km
Start Location:	4180	Dist Range:	0 To 43 0.1 * 1000 m
End Location:	0	Equation:	$Y = 0 \cdot X^2 + 0.930 \cdot X + 171.20$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

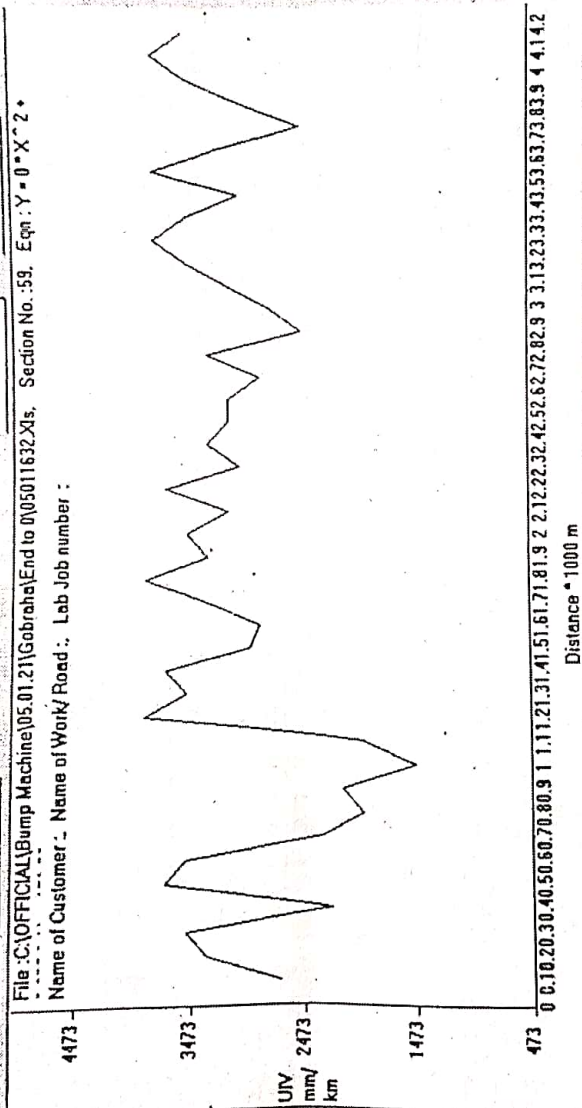

07.01.2021
Executive Engineer
Rural Works Department
Jharkhand
Works Division
