

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय

पत्रांक 517 (31-3) /

लखीसराय, दिनांक 05/04/2023/

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, लखीसराय।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोशांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 57,37,493/- (संतावन लाख सैंतीस हजार चार सौ तिरानवे रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 57,37,493/- (संतावन लाख सैंतीस हजार चार सौ तिरानवे रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।

- अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।
2. IRI Value Report
3. Map
4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन
31-3-23
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
लखीसराय

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, लखीसराय


प्रमाण-पत्र


पथ का नाम :-शाहनगर से नन्दनामा पथ।

लम्बाई :-2.286 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


31/03/23
कनीय अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रशाखा
रामगढ़ चौक


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
लखीसराय

Name of Road :- Saahnagar To Nandnama
Section no.-62

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
31/3/23	9:13:10	62	0.1	280	0	2800	2827	G	25.095424	86.084564	Normal
31/3/23	9:13:49	62	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.094034	86.084237	Normal
31/3/23	9:14:2	62	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.092919	86.083793	Curve
31/3/23	9:14:39	62	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.090733	86.083815	Normal
31/3/23	9:15:1	62	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.090568	86.084335	Curve
31/3/23	9:15:44	62	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.089803	86.084511	Normal
31/3/23	9:16:4	62	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.088571	86.084315	Normal
31/3/23	9:16:40	62	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.086796	86.084745	Normal
31/3/23	9:17:0	62	0.1	310	20.2	3100	3133	G	25.086472	86.085713	Normal
31/3/23	9:17:14	62	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.085948	86.086286	Curve
31/3/23	9:18:0	62	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.08551	86.085987	Curve
31/3/23	9:18:39	62	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.084724	86.085769	Normal
31/3/23	9:19:5	62	0.1	300	20.2	3000	3031	G	25.084369	86.087612	Normal
31/3/23	9:19:45	62	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.084191	86.088263	Normal
31/3/23	9:20:6	62	0.1	260	10.1	2600	2622	G	25.084054	86.088834	Curve
31/3/23	9:20:33	62	0.1	270	20.2	2700	2724	G	25.083599	86.08973	Curve
31/3/23	9:21:5	62	0.1	280	20.2	2800	2827	G	25.083405	86.090216	Normal
31/3/23	9:21:47	62	0.1	240	20.2	2400	2418	G	25.083258	86.090946	Normal
31/3/23	9:22:10	62	0.1	250	10.1	2500	2520	G	25.083059	86.091627	Normal
31/3/23	9:22:48	62	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.083024	86.091871	Curve
31/3/23	9:23:1	62	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.082967	86.092261	Normal
31/3/23	9:23:52	62	0.1	270	10.1	2700	2724	G	25.082895	86.092637	Normal
31/3/23	9:24:17	62	0.08	250	10.1	3125	3158	G	25.08282	86.09278	Normal
Total =			2.28	Km	Avg. 2778.78						

AK
31/03/23
JE

[Signature]
Executive Engineer
R.W.D.(W) Division,
Lakhisarai

Name of Customer :	Sri Nishikant Kumar
Name of Work/ Road :	Saahnagar To Nandnama
Lab Job number :	62
Date :	31.03.2023
Section No.	62

Test Date :	31.03.2023	Road Name :	Saahnagar To Nandnama
Machine No :	399	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :		Side :	
Start E No :		Interval	
Weather :		UIV Range :	1418 To 4000 mm/km
Start Location :		Dist Range :	0 To 2.4 0.1 -1000 m
End Location :		Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$

Print

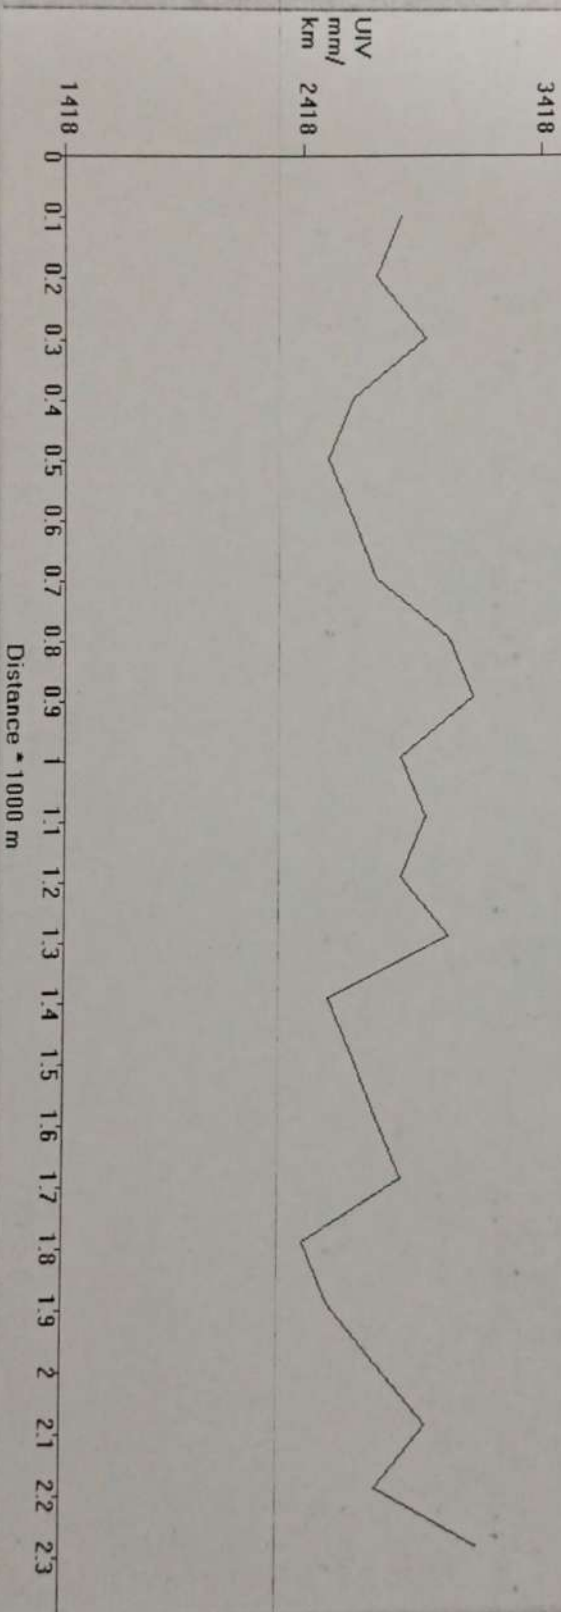
Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\Saahnagar To Nandnama2286m\31030924.Xls, Section No. : 62, Eqn : $Y = 0 * X^2 +$

Name of Customer : Sri Nishikant Kumar, Name of Work/ Road : Saahnagar To Nandnama, Lab Job number : 62



AKW
31/03/23
JE


Signature

RWD Works Division, Lakhisarai

Requisition Format for Scheme Head- MIR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Lakhisarai

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MIR-N/19-20, Lakhisarai/18	Saahinagar To Nandnana	28401033817	Letter no.- 6455 dt.13.12.2019	2.286	74.647	57.37493	23.05012	32/MBD/2022-23 09.01.2023	10/9/2023	---	2778.78	25	5.050	0	0	57.37493	
																	57.37493	


 Executive Engineer
 RWD Works Division,
 Lakhisarai
