

पत्रांक 151 (अनु०) /

शेखपुरा, दिनांक 02/02/2023 /

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 69,12,300/- (उनहत्तर लाख बारह हजार तीन सौ रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 69,12,300/- (उनहत्तर लाख बारह हजार तीन सौ रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।


अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा
02/02/23

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S.N	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23, Sheikhpura-03	Sheikhpura Sikandra Road To Mane REO Road	20803904008	Letter no.-2011, dt.02.05.2022	1.430	96.430	70.16209	12.07396	10/M80/2022-23 13.09.2022	12.06.2023	---	2972.71	25	5.020	0	0	69.12300	
																	69.12300	

D.A.Q.
RWD Works Division,
Sheikhpura

2-2-2023
AE

2-2-2023
S.E.

Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura


प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- शेखपुरा सिकन्दरा पथ से माने आर0ई0ओ0 पथ।


लम्बाई :-1.430 कि0मी0

बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


2.2.2023

कनीय अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रशाखा
चेवाड़ा


02-02-2023

सहायक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, का0अ0प्रमं0
चेवाड़ा



कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा0का0वि0, कार्य प्रमं0
शेखपुरा

Name of Road :-Sheikhpura Sikandra Road To Mane

Section no.-72

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR	IRI	CATEGORY	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	mm/km	ROAD			
2/2/23	8:3:0	72	0.1	290	0	2900	2929	G	25.116253	85.893802	Normal
2/2/23	8:3:29	72	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.116112	85.893866	Normal
2/2/23	8:3:44	72	0.1	310	10.1	3100	3133	G	25.115906	85.893615	Normal
2/2/23	8:4:4	72	0.1	320	10.1	3200	3235	G	25.115865	85.890397	Normal
2/2/23	8:4:4	72	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.115864	85.890266	Normal
2/2/23	8:4:40	72	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.115493	85.888851	Normal
2/2/23	8:5:0	72	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.115459	85.887351	Normal
2/2/23	8:5:14	72	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.115448	85.886648	Normal
2/2/23	8:6:0	72	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.115387	85.885525	Normal
2/2/23	8:6:0	72	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.114845	85.884646	Normal
2/2/23	8:6:25	72	0.1	290	10.1	2900	2929	G	25.113664	85.883514	Normal
2/2/23	8:7:0	72	0.1	280	10.1	2800	2827	G	25.112898	85.883451	Normal
2/2/23	8:7:0	72	0.1	290	*10.1	2900	2929	G	25.112862	85.883099	Normal
2/2/23	8:7:0	72	0.1	300	10.1	3000	3031	G	25.112565	85.882501	Normal
Total =			1.4			Avg.	2972.71				

Executive Engineer

R.W.D.(W) Division,

Sheikhpura

22/2/23
H
H

Signature

Steco Analyzer

Name of Customer : Nishikant Kumar

Name of Work/Road : Sheikhupura Sikandra Road To 1

Lab Job number : 72

Date : 02.02.2023

Section No. : 72

Test Date : 02.02.2023

Road Name : Sheikhupura Sikandra Road To

Machine No : 399

Road Type : (R) RURAL ROAD

Start S No :

Side :

Start E No :

Interval :

Weather :

UIV Range : 1827 To 4000 mm/km

Dist Range : 0 To 1.5 = 1000 m


Equation : $Y = 0 * X^2 + 1.021 * X - 31.77$

Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\Sheikhupura Sikandra Road To Mane\02020807.Xls, Section No.: 72, Eqn : $Y = 0 * X$
 Name of Customer : Nishikant Kumar, Name of Work/Road : Sheikhupura Sikandra Road To Mane RDO Road, Lab

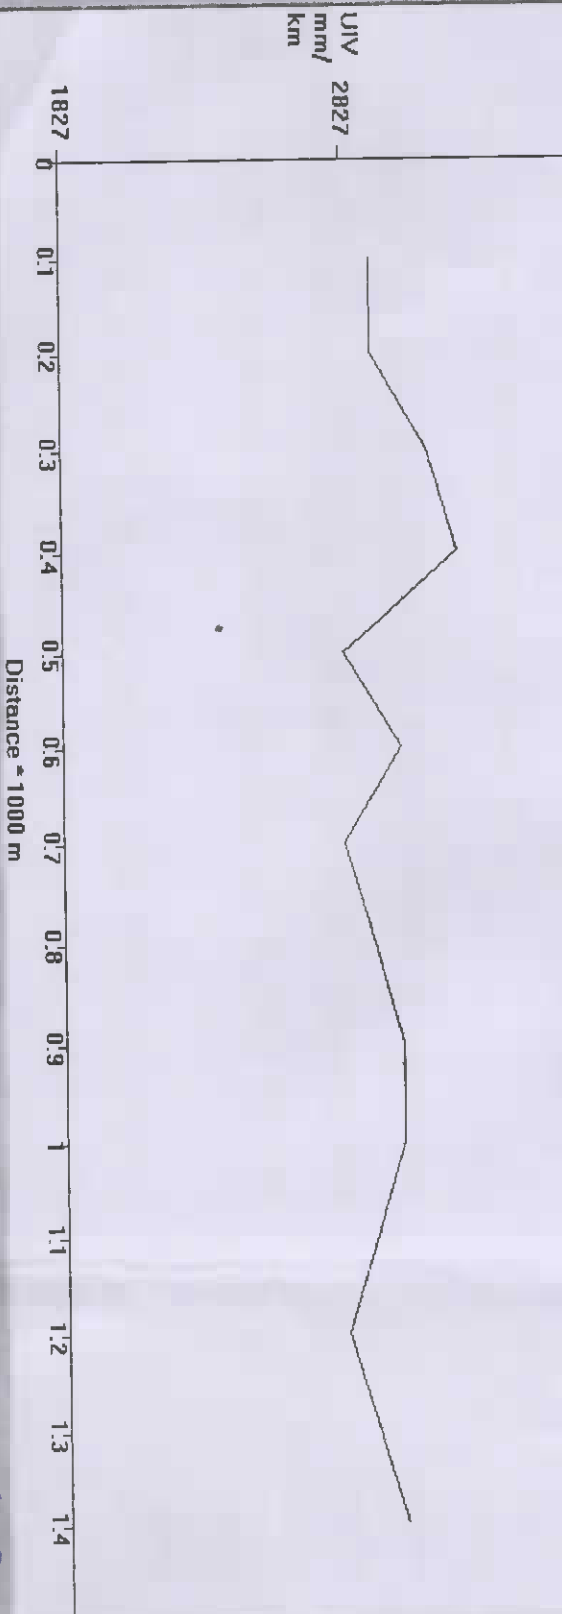

Executive Engineer
 RWD Work Division
 Sheikhupura

20/2/23
 20/2/23
