

पत्रांक 810 (अनु०) /

शेखपुरा, दिनांक 03/06/2024 /

प्रेषक:-

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:-

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 42,09,679/- (बेयालिस लाख नौ हजार छः सौ उनासी रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 42,09,679/- (बेयालिस लाख नौ हजार छः सौ उनासी रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।


अनु०:-1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन


(ई० विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता

ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,

शेखपुरा
31/5/24


प्रमाण-पत्र

पथ का नाम :- Sikandra Sheikhpura Road To Asthwan Beldaria.

लम्बाई :-1.465 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुसूचना नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


03-06-2024
सहायक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्यअ०प्रमं०,
चेवाड़ा


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IMI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allocated Amount (in Lakh)	Up-to-date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Sheikhpura/05	Sikandra Sheikhpura Road To Asthwan Beldaria	20803912023	Letter no.- 6120, dt.04.12.2023	1.465	74.425	49.52563	15.64941	26/MBD/23-24 14.03.24	13.12.2024	---	2623.64	25	5.015	0	0	42.09679	
																	42.09679	

AE
03-06-2024
AE

AE
03/06/24
D.A.O.
RWD Works Division,
Sheikhpura

AE
03.06.24
Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura

Name of Road :- Sikandra Sheikhpura Road To Asthawan Beldaria
Section no.-49

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
3/6/24	9:48:2	49	0.1	270	0	2700	2436	G	25.046008	85.95978	Normal
3/6/24	9:48:46	49	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.045877	85.960641	Normal
3/6/24	9:49:6	49	0.1	300	10.1	3000	2699	G	25.04566	85.961711	Normal
3/6/24	9:49:47	49	0.1	260	10.1	2600	2348	G	25.045545	85.962729	Normal
3/6/24	9:50:5	49	0.1	290	10.1	2900	2611	G	25.04549	85.963516	Normal
3/6/24	9:50:48	49	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.045351	85.964637	Normal
3/6/24	9:51:7	49	0.1	290	10.1	2900	2611	G	25.045243	85.965484	Normal
3/6/24	9:51:43	49	0.1	310	10.1	3100	2786	G	25.045137	85.966118	Normal
3/6/24	9:52:12	49	0.1	320	10.1	3200	2874	G	25.045096	85.966553	Curve
3/6/24	9:52:43	49	0.1	300	10.1	3000	2699	G	25.045965	85.966792	Normal
3/6/24	9:53:13	49	0.1	300	10.1	3000	2699	G	25.045933	85.967348	Curve
3/6/24	9:53:46	49	0.1	320	10.1	3200	2874	G	25.046239	85.968058	Normal
3/6/24	9:54:25	49	0.1	290	10.1	2900	2611	G	25.046205	85.968815	Normal
3/6/24	9:54:49	49	0.1	300	10.1	3000	2699	G	25.046077	85.970086	Normal
Total=			1.4	Km	Avg. 2623.64						

AE
03-06-2024

AE
Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,
Sheikhpura



Steco Analyzer

Name of Customer : Mother India Construction Pvt. L
Name of Work/ Road : Sikandra Sheikhpura Road To
Lab Job number : 49
Date : 03.06.2024
Section No. : 49

Test Date : 03.06.2024
Machine No : 484
Start S No :
Start E No :
Weather :
Start Location :
End Location :
Road Name : Sikandra Sheikhpura Road To
Road Type : (R) RURAL ROAD
Side :
Interval :
UIV Range : 1348 To 4000 mm/km
Dist Range : 0 To 1.5 * 1000 m
Equation : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$

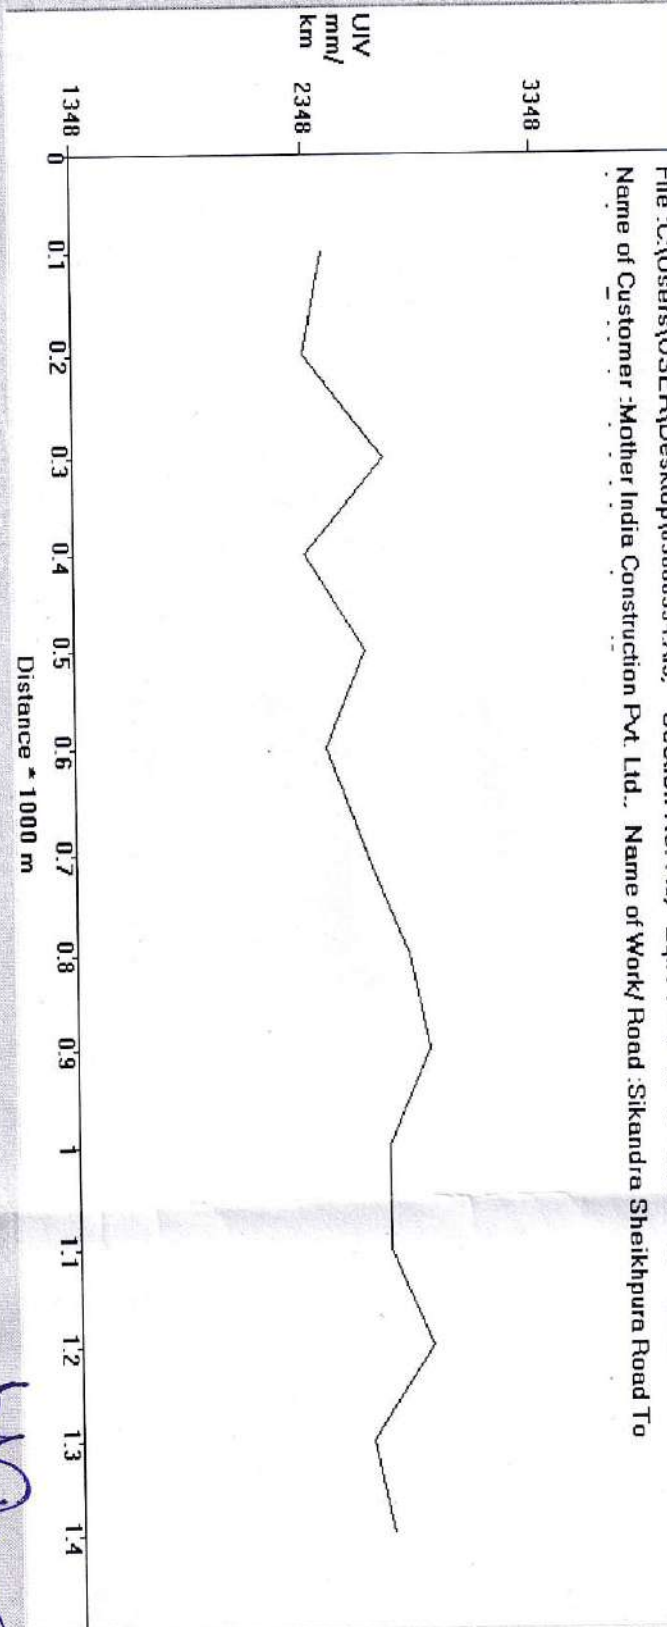
Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\03060954.Xls. Section No. : 49. Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$

Name of Customer : Mother India Construction Pvt. Ltd. Name of Work/ Road : Sikandra Sheikhpura Road To



03-06-2024
AE

Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Sheikhpura
