

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर।

Email ID:-ee.daudnagar@gmail.com

Mob:- 8986915846

पत्रांक.....420..... दाउदनगर। / दिनांक.....19/3/24.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दाउदनगर।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी (MR 3054)
ग्रामीण कार्य विभाग
पटना, बिहार

विषय :- नई अनुरक्षण नीति-2018 MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के विरुद्ध आवंटन उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि नई अनुरक्षण नीति-2018 MR (3054) योजना के अंतर्गत पथ में कराये गये कार्य के लिए संवेदक को भुगतान करने हेतु अधियाचना विहित प्रपत्र में भरकर आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित की जाती है।

अनु :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

मार्ग/151
19-3-24
कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, दाउदनगर।
18/03/24
Sanan
1803.24

OFFICE OF EXECUTIVE ENGINEER, RURAL WORKS DEPARTMENT, WORKS DIVISION, Daudnagar
Requisition Format for Scheme Head- MR(3054) under Bihar Rural Road Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)
 Name of Works Division:- Daudnagar

Sl no.	Package No	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (AA) Letter No & Date	Administrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Allotted Amount (In Lakh)	up-to-date expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In km)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	RM/AU/DAU/23/0007	Ahirari - Chatar	10602802018	1286/24.02.2023	3.218	166.157	130.35939	28.89565	07MBD/MR2023-24 09.09.2023	08.06.2024	17.03.2024	3251	25MM	5.000%	130.00	0.00	130.00	Comp.
TOTAL																130.00		

Saran
 18.03.24
 Divisional Accounts Officer
 Rural Works Department, works
 Division, Daudnagar

27/03/24
 18/03/24
 Executive Engineer
 Rural Works Department
 Works Division, Daudnagar

Name Of Road:- Ahirari - Chatar

Date	Time	Section	Length	Bumps	Speed	OR		CATEGORY	IRI	Latitude	Longitude	Event
		No.	in km	in mm	Rate	mm/km	UIV	ROAD				
17/03/24	8:17:23	106	0.1	330	30.3	2900	3426	G	4.8	24.914267	84.441101	Speed Breaker
17/03/24	8:20:18	106	0.1	260	30.3	2500	2972	G	3.58	24.914249	84.44283	Normal
17/03/24	8:21:0	106	0.1	230	30.3	2100	2518	G	5.06	24.914037	84.444095	Normal
17/03/24	8:21:0	106	0.1	250	30.3	2400	2858	G	3.85	24.914254	84.444818	Normal
17/03/24	8:21:0	106	0.1	260	30.3	2900	3426	G	3.99	24.915046	84.445175	Normal
17/03/24	8:21:29	106	0.1	220	30.3	3200	3922	G	3.53	24.915748	84.445389	Normal
17/03/24	8:21:29	106	0.1	340	20.2	2100	2518	G	3.44	24.916138	84.446217	Normal
17/03/24	8:21:29	106	0.1	210	30.3	2400	2858	G	3.99	24.915982	84.44695	Bridge
17/03/24	8:21:29	106	0.1	310	30.3	2300	2745	G	3.99	24.915372	84.449306	Normal
17/03/24	8:22:0	106	0.1	250	30.3	2800	3313	G	4.53	24.915053	84.450868	Normal
17/03/24	8:22:4	106	0.1	210	30.3	3300	3817	G	3.85	24.915667	84.45148	Normal
17/03/24	8:22:4	106	0.1	260	30.3	2500	2972	G	3.85	24.915903	84.451887	Normal
17/03/24	8:22:4	106	0.1	330	30.3	2900	3426	G	3.53	24.915594	84.453132	Normal
17/03/24	8:22:39	106	0.1	290	30.3	2500	2972	G	3.13	24.915405	84.45374	Speed Breaker
17/03/24	8:22:39	106	0.1	290	20.2	2800	3313	G	3.72	24.915084	84.455101	Normal
17/03/24	8:22:39	106	0.1	260	30.3	3200	3767	G	3.85	24.914766	84.456531	Normal
17/03/24	8:23:0	106	0.1	300	40.4	3400	3908	G	3.53	24.914766	84.456531	Speed Breaker
17/03/24	8:23:15	106	0.1	290	40.4	2900	3426	G	3.99	24.914549	84.457165	Normal
17/03/24	8:23:15	106	0.1	260	40.4	2600	3086	G	3.4	24.914295	84.458526	Normal
17/03/24	8:23:15	106	0.1	300	20.2	3000	3540	G	4.93	24.914081	84.459777	Normal
17/03/24	8:23:15	106	0.1	270	20.2	2700	3199	G	5.33	24.913995	84.460279	Normal
17/03/24	8:23:50	106	0.1	290	20.2	2900	3426	G	3.68	24.913826	84.461107	Curve
17/03/24	8:24:0	106	0.1	280	20.2	2800	3313	G	3.88	24.914289	84.461321	Normal
17/03/24	8:24:0	106	0.1	260	30.3	2600	3086	G	3.53	24.914389	84.46162	Normal
17/03/24	8:24:25	106	0.1	310	30.3	3100	3654	G	3.19	24.914358	84.462922	Normal
17/03/24	8:24:25	106	0.1	310	20.2	3100	3654	G	3.85	24.914274	84.46337	Normal
17/03/24	8:24:25	106	0.1	260	30.3	2600	3086	G	2.45	24.914051	84.464163	Normal
17/03/24	8:24:25	106	0.1	300	30.3	3000	3540	G	2.88	24.913891	84.465109	Speed Breaker
17/03/24	8:24:25	106	0.1	200	40.4	2000	2404	G	3.3	24.913252	84.467328	Normal
17/03/24	8:25:0	106	0.1	290	30.3	3110	3426	G	0.25	24.913127	84.467875	Normal
17/03/24	8:25:0	106	0.1	290	30.3	2900	3220	G	0.25	24.912975	84.46881	Normal

Total Length 3.1

J.E 18/3/2024

Neeraj
A.E 18/3/2024

21/3/24
193.4
E.E

$$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$$

$$X = 2758$$


$$Y = 3251$$

(R) RURAL ROAD

Good Average Poor

<4000 4001-5000 >5001

File : C:\Users\DELL\Desktop\14568089.xlsx, Section No. : 106, Eqn : $Y = 0 \cdot X^2 + 1.136 \cdot X + 132.5$
 Name of Customer : TRADEWELL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED, Name of Work/ Road : Ahirari - Chatar.

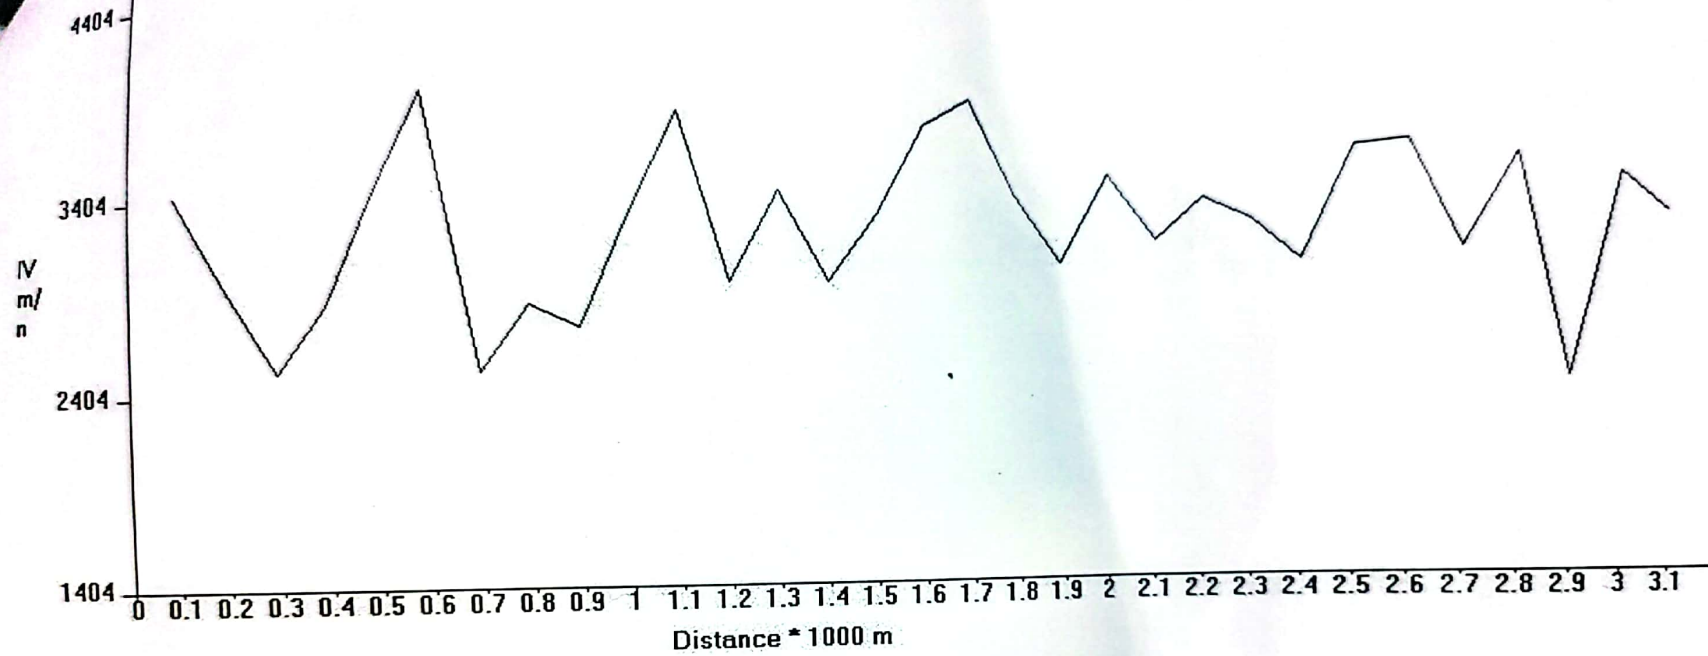

[Signature]
 18/3/2024
 J.E

[Signature]
 18/3/2024
 A.E

18/3/24
 18/3/24
 18/3/24

TRADEWELL CONSTRUCTION

Ahirari - Chatar

106

17-03-2024

105


Test Date :	17-03-2024	Road Name :	Ahirari - Chatar
Machine No :	398	Road Type :	(R) RURAL ROAD
Start S No :	703	Side :	Obra
Start E No :	733	UIV Range :	1404 To 5000 Interval 1000 mm/km
Weather :	Normal	Dist Range :	0 To 32 0.1 * 1000 m
Start Location :	21.91456 84.	Equation :	$Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$
End Location :	24.912975 84.		

Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\DELL\Desktop\14568089.xlsx. Section No. : 106. Eqn : $Y = 0 * X^2 + 1.136 * X + 132.5$
Name of Customer : TRADEWELL CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED. Name of Work/ Road : Ahirari - Chatar.

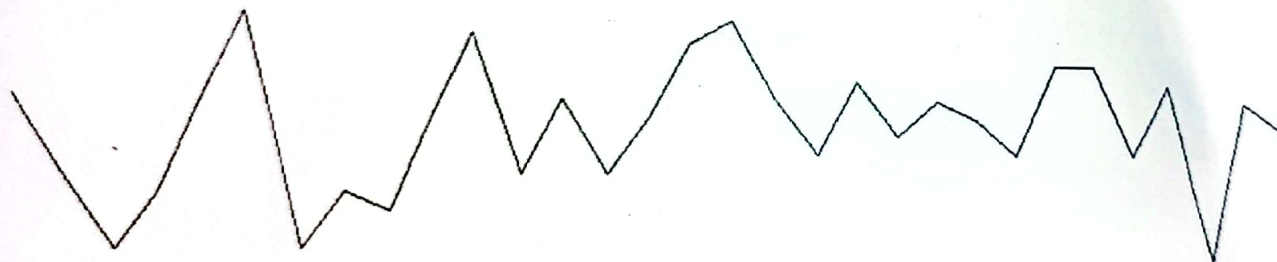

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3 3.1
Distance * 1000 m

18/3/2024
1.E

Neeraj
A.E. 18/3/2024

18/3/2024
E 10
