

पत्रांक.....745 (अनु०) /

शेखपुरा, दिनांक.....21/05/2024 /

प्रेषक:—

ई० विमल कुमार,
कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी,
3054 (M.R.) कोषांग,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:—

शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु अधियाचना के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि विहित प्रपत्र में संलग्न विवरणी के अनुसार शीर्ष 3054 नई अनुरक्षण नीति-2018 अन्तर्गत Initial Rectification and Surface Renewal कराये गए कार्य हेतु राशि रुपये 29,53,454 /— (उनतीस लाख तिरपन हजार चार सौ चौवन रुपये) मात्र राशि की आवश्यकता है।

अतः कार्यहित में अनुरोध है कि उक्त अधियाचित राशि रुपये 29,53,454 /— (उनतीस लाख तिरपन हजार चार सौ चौवन रुपये) मात्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय। ताकि कराये जा रहे कार्यों का विपत्र भुगतान किया जा सके।


अनु०:—1. अधियाचना प्रपत्र।

2. IRI Value Report

3. Map

4. प्रमाण पत्र।

विश्वासभाजन


(ई० विमल कुमार)

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा


21-05-2024
A.E.


प्रमाण-पत्र


पथ का नाम :- T02 Karande To Dhari Schedule Cast Tola.

लम्बाई :-0.900 कि०मी०

बिहार ग्रामीण पथ अनुसूचना नीति-2018 अन्तर्गत कराये गये कार्य के विरुद्ध उक्त पथ के अधियाचना हेतु विभागीय पत्रांक-5047 दिनांक 23.12.2021 के अनुपालन में निम्नलिखित शर्त को प्रमाणित किया जाता है :-

1. यह कि अधियाचित पथ के मापी पुस्त पर कनीय अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता द्वारा दर्ज किया गया है कि कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है।
2. यह कि अधियाचित पथ में कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी को संबंधित कनीय अभियन्ता द्वारा एवं 50प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी संबंधित सहायक अभियन्ता एवं 10प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियन्ता द्वारा किया जा चुका है।


21-05-2024
सहायक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्यअ०प्रमं०,
चेवाड़ा


कार्यपालक अभियन्ता
ग्रा०का०वि०, कार्य प्रमं०
शेखपुरा

RWD Works Division, Sheikhpura

Requisition Format for Scheme Head- MR (3054) Under Bihar Rural Road " New Maintenance Policy 2018" (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Division:-Sheikhpura

S. N.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Administrative Approval (A.A) Letter No. & Date	Administrative Approval (A.A)		Agreement Amount (in Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI in MM/KM	Thickness of Bitumen Layer (in MM)	Value of Bitumen Content (in %)	Previous Total Allotted Amount (in Lakh)	Up-to - date expenditure as per MIS (in Lakh)	Requisition against work done (in Lakh)	Remarks
					Length (K.M)	Amount (in Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (in Lakh)	5 Year Routine Maintenance										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/23-24 Sheikhpura/05	T02 Karande To Dhari Schedule Cast Tola	20803913022	Letter no.- 6120, dt.04.12.2023	0.900	49.280	34.74652	8.62379	26/MBD/ 23-24 14.03.24	13.12.2024	---	2581.78	25	5.015	0	0	29.53454	
																	29.53454	

AE
24-05-2024

24/05/24
D.A.O.
RWD Works Division,
Sheikhpura

24/5/24
Executive Engineer
RWD Works Division,
Sheikhpura



Steco Analyzer

Name of Customer :	Mother India Construction Pvt. L
Name of Work Road :	T02 Karande To Dhari Schedul
Lab Job number :	45
Date :	20.05.2024
Section No. :	45

Test Date :	20.05.2024
Machine No. :	484
Start S No. :	
Start E No. :	
Weather :	
Start Location :	
End Location :	
Road Name :	T02 Karande To Dhari Schedul
Road Type :	(R) RURAL ROAD
Side :	
UIV Range :	1436 To 4000
Dist Range :	0 To 1
Equation :	$Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$
Interval	1000 mm/km

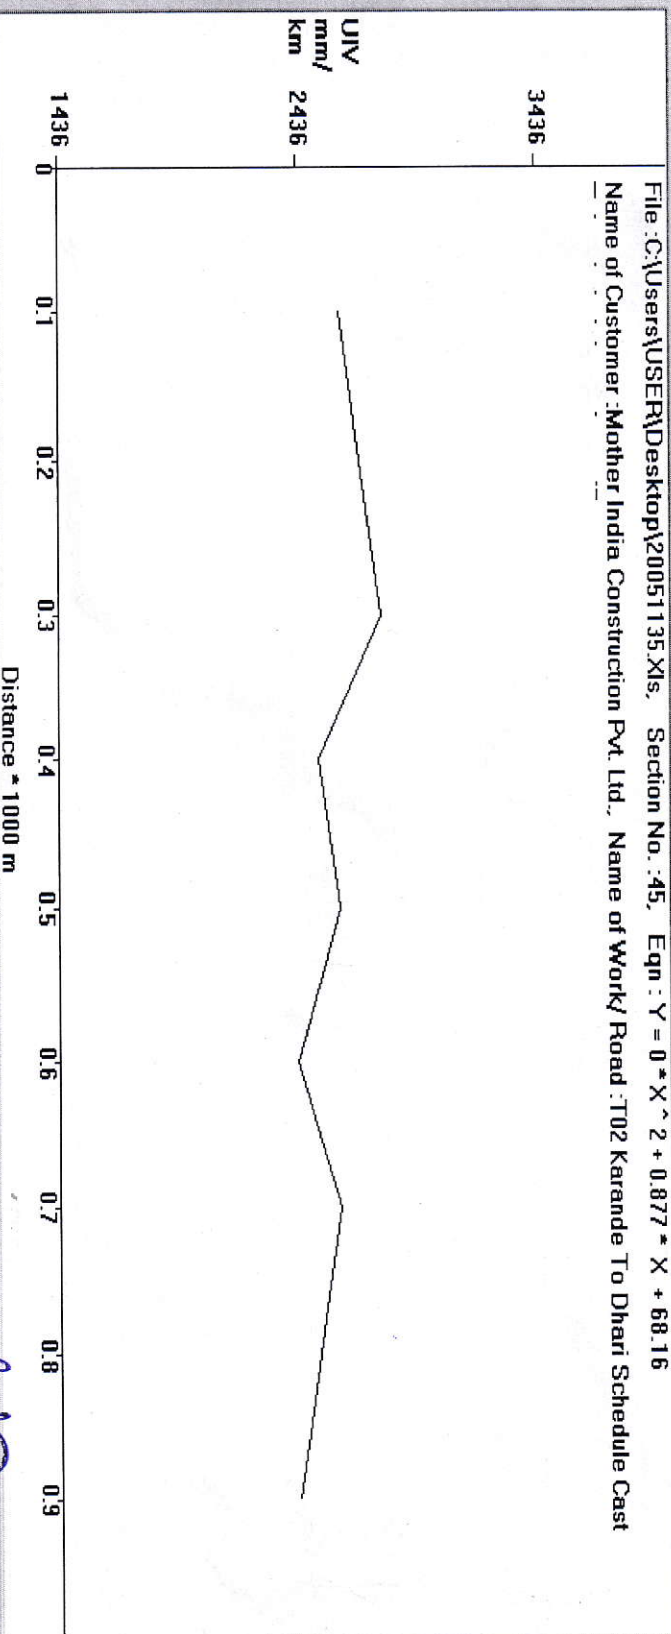
Print Generate Report and Graph

Redraw Graph

Map View

File : C:\Users\USER\Desktop\20051135.Xls, Section No. : 45, Eqn : $Y = 0 * X^2 + 0.877 * X + 68.16$

Name of Customer : Mother India Construction Pvt. Ltd., Name of Work/ Road : T02 Karande To Dhari Schedule Cast



Executive Engineer
Rural Works Department
Works Division, Sheikhpura

21-05-2024
AE.

Name of Road :- T02 Karande To Dhari Schedule Cast Tola
Section no.-45

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	CATEGORY ROAD	Latitude	Longitude	Event
20/5/24	11:31:11	45	0.1	290	0	2900	2611	G	25.037065	85.937652	Normal
20/5/24	11:31:46	45	0.1	300	10.1	3000	2699	G	25.03697	85.938103	Normal
20/5/24	11:32:9	45	0.1	310	10.1	3100	2786	G	25.036829	85.938755	Normal
20/5/24	11:32:49	45	0.1	280	10.1	2800	2523	G	25.03648	85.940602	Normal
20/5/24	11:33:6	45	0.1	290	10.1	2900	2611	G	25.036189	85.941797	Normal
20/5/24	11:33:49	45	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.035902	85.942684	Normal
20/5/24	11:34:6	45	0.1	290	10.1	2900	2611	G	25.035663	85.94371	Curve
20/5/24	11:34:44	45	0.1	280	10.1	2800	2523	G	25.035081	85.944176	Curve
20/5/24	11:35:10	45	0.1	270	10.1	2700	2436	G	25.034661	85.944227	Normal
Total=			0.900	Km	Avg.			2581.78			

AE.
21-05-2024

Executive Engineer
R.W.D. (W) Division,
Sheikhpura
