कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

पत्रांक 2685 /37 पूर्णियाँ, दिनांक 18/10/2023

प्रेषक,

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ ।

सेवा में,

नोडल पदाधिकारी, MR(3054),
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय : शीर्ष MR (3054) मरम्मति एवं सम्पोषण योजना मद में राशि आवंटित करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शीर्ष MR (3054) मरम्मति एवं सम्पोषण योजना मद में इस प्रमंडल को संलग्न विवरणी में अंकित राशि की आवश्यकता है ।

अतः अनुरोध है कि अधियाचित राशि आवंटित करने की कृपा की जाय ।

अनु0 – यथोक्त ।
अधियाचना की प्रति (मूल में)

विश्वासभाजन
18/10/23
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ।
18/10/23

Requisition Format for Scheme Head - MR (3054) under Rural Maintenance Policy-2018 (Initial Rectification and Surface Renewal)

Name of Works Division : RWD, Works Division, Purnea

Sl. No.	Package No.	Name of Road	Project ID as per MIS	Adiministrative Approval (AA) Letter No. & Date	Adiministrative Approval (AA)		Agreement Amount (In Lakh)		Agreement No. & Date	Date of Completion as per Agreement	Actual Date of Completion	Value of IRI (in mm/km)	Thickness of Bitumen Layer (in mm)	Value of Bitumen Content in Percentage	Previous Total Alloted Amount (In Lakh)	Up-to-date Expenditure as per MIS (In Lakh)	Requisition against work done (In Lakh)	Remarks
					Length (In KM)	Amount of (In Lakh)	Initial Rectification with Surface Renewal (In Lakh)	5 Year Routine Maintenance (In Lakh)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	MR-N/22-23, Purnea/08	Moglaha to Prasadpur (VR44)	211052 02077	L. N.-1192 Dated 24.08.2022	1.030	39.479	28.41664	13.48585	102MBD/2022-23 dt. 20.12.22	19.09.23	—	3.501	25	5.02	0.00000	0.00000	28.41000	Comp
2	MR-N/22-23, Purnea/08	PMGSY Road Hat Dhanhara to PNB Bank	211052 12041	L. N.-1192 Dated 24.08.2022	0.910	41.119	33.18319	11.74611	102MBD/2022-23 dt. 20.12.22	19.09.23	—	3.502	25	5.01	0.00000	0.00000	33.18000	Comp
3	MR-N/22-23, Purnea/08	Thana Chowk to Sharma Tola	211052 12014	L. N.-1192 Dated 24.08.2022	1.197	62.285	45.99250	13.16806	102MBD/2022-23 dt. 20.12.22	19.09.23	—	3.501	25	5.01	0.00000	0.00000	45.98800	Comp
4	MR-N/22-23, Purnea/12	L040-T05 NH to Dhanhara Hat (VR40)	211052 02090	L. N.-1406 Dated 07.09.2022	5.077	248.09200	192.21557	66.32145	116MBD/2022-23 dt. 13.02.23	29.09.23	—	3.502	25	5.02	0.00000	0.00000	192.21000	Comp
				Total	8.214	390.97500	299.80790	104.72147							0.00000	0.00000	299.78800	

1. Signed Hard Copy and Soft Copy (in excel) of recorded IRI in enclosed.
2. Up-to-date Physical Progress has been uploaded in MIS

Divisional Accounts Officer
RWD, Works Division, Purnea

18/10/23

Executive Engineer
RWD, Works Division, Purnea

18/10/23

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

प्रमाणित किया जाता है कि एम0आर0 3054 योजनान्तर्गत **Thana Chowk to Sharma Tola** पथ में कार्य गुणवत्ता पूर्ण कराया गया है एवं विशिष्टियों के अनुरूप है एवं साथ ही कराये गये कार्यों के सभी अवयवों के अवयववार 100 प्रतिशत कार्य का दर्ज मापी का सत्यापन कनीय अभियंता एवं 50 प्रतिशत मापी का सत्यापन सहायक अभियंता एवं 10 प्रतिशत मापी का सत्यापन कार्यपालक अभियंता द्वारा किया गया है ।

18/10/23

कनीय अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रशाखा के0 नगर

18.10.23

सहायक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अवर प्रमंडल, के0 नगर

18/10/23

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, पूर्णियाँ

Lab Job number :15(RWD PURNEA)
Date :17-10-2023

Name of Customer :BHARAT BHUSHAN
Name of Work/ Road :THANA CHOWK TO SHARMA TOLA

Sr.no	Location o test(in km)	Corrected U.I value(mm/km)	Road catagory
657	0.1		2305 G
658	0.2		1806 G
659	0.3		2005 G
660	0.4		1806 G
661	0.5		1307 G
662	0.6		1007 G
663	0.7		1307 G
664	0.8		3103 G
665	0.9		1706 G
666	1		708 G
667	1.1		1806 G
668	1.2		2105 G
		AVERAGE	**1747.58**

18/10/23
JE

18.10.23
AE

18/10/23
Executive Engineer
R.W.D. (Works) Division
PURNEA

File :G:\18101112.Xls, Section No. :6, Eqn :test

Name of Customer :BHARAT BHUSHAN, Name of Work/ Road :THANA CHOWK TO SHARMA TOLA, Lab Job

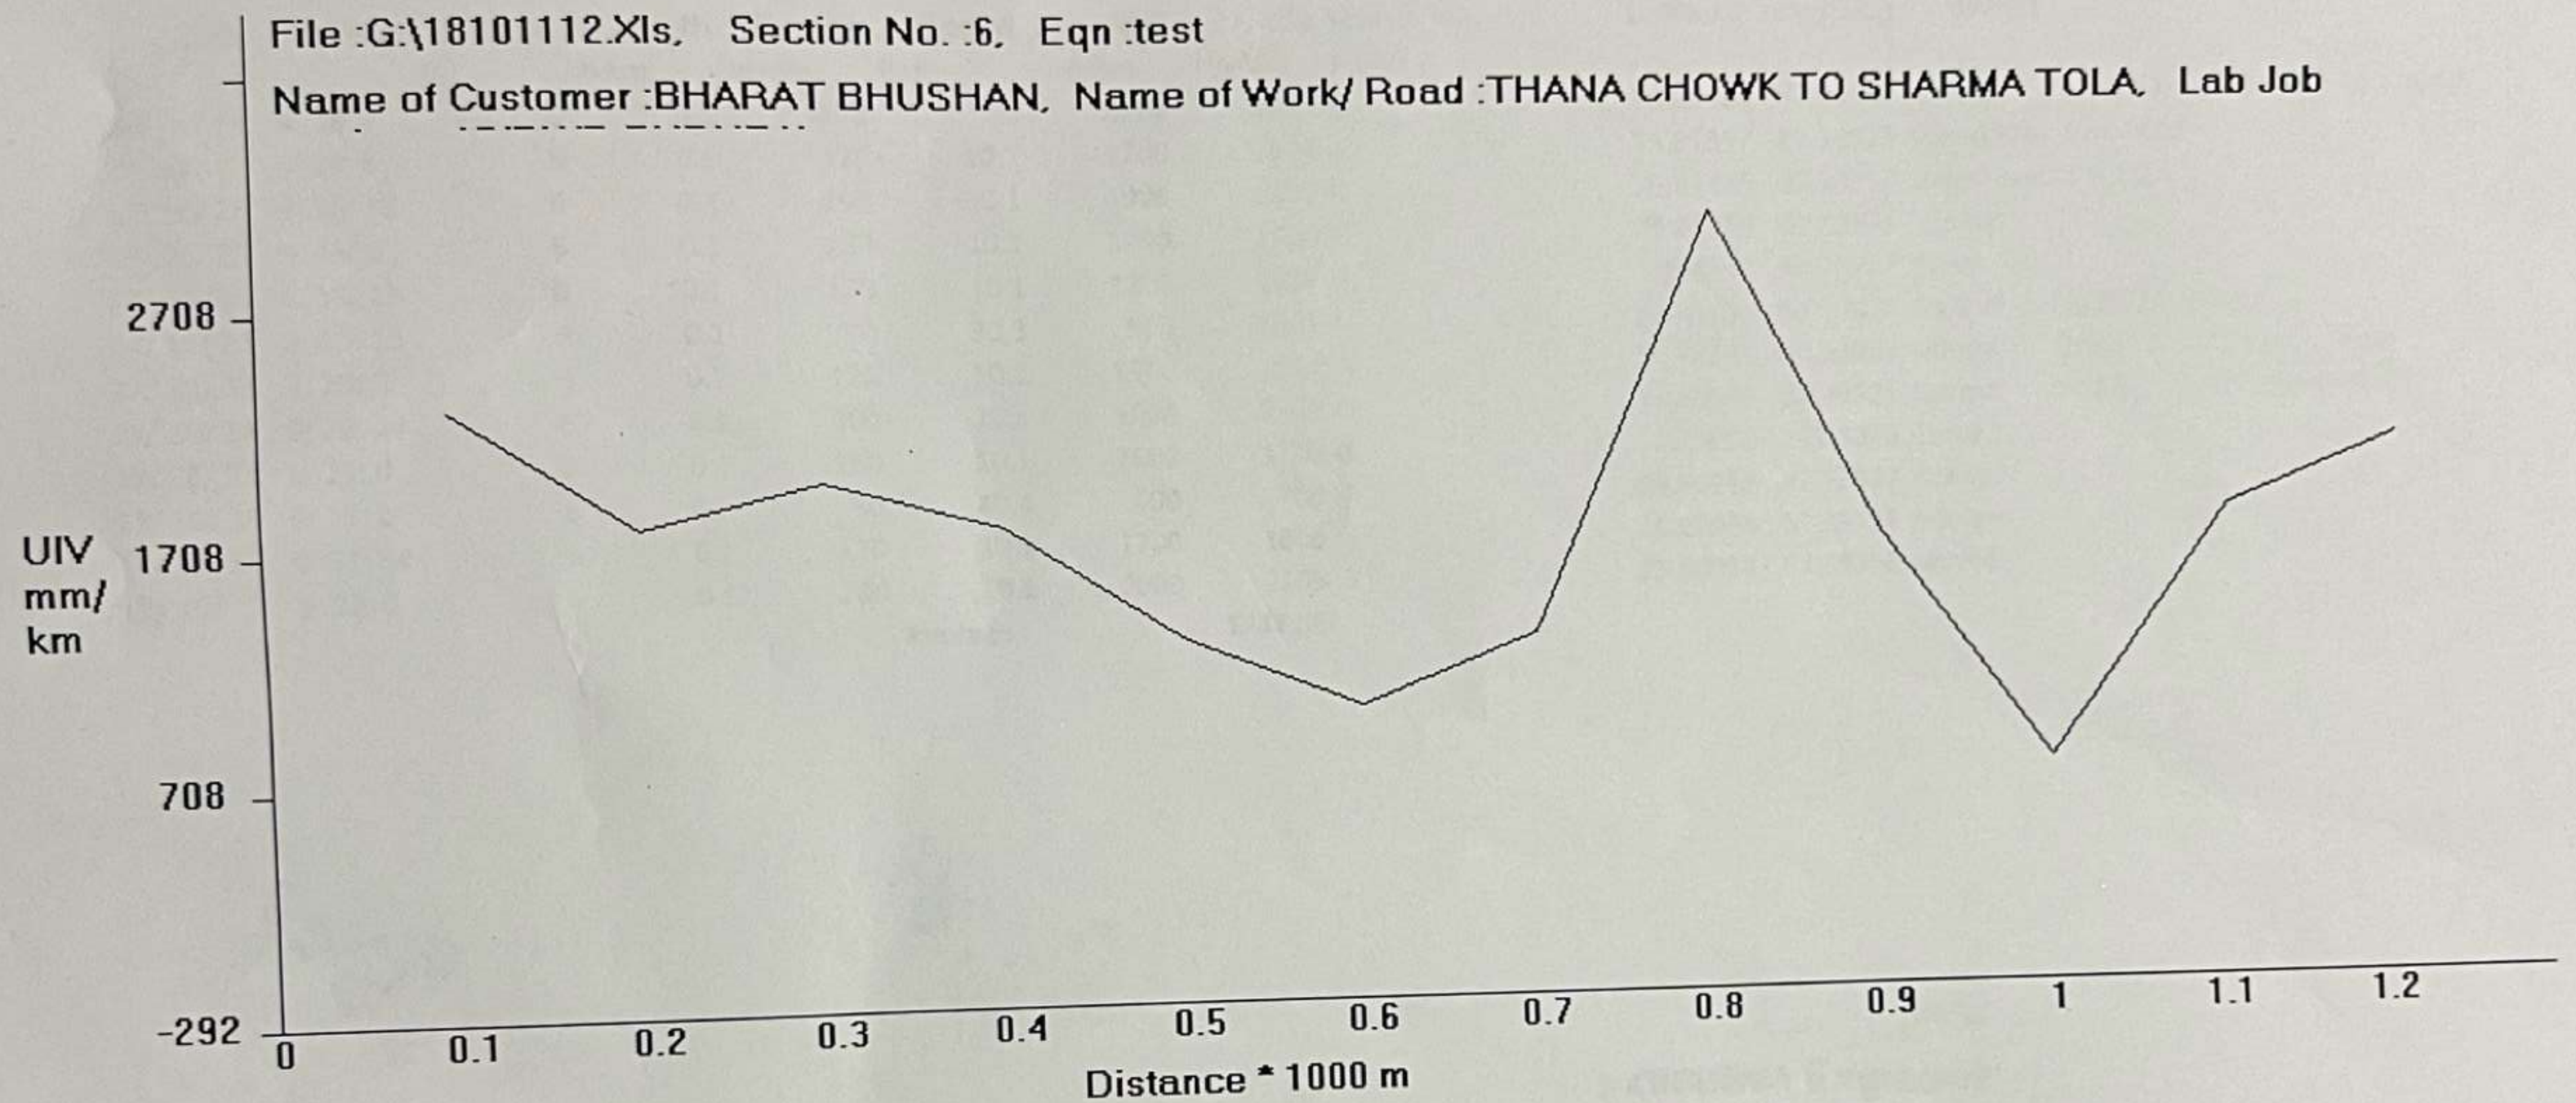

18/10/23
JE

18.10.23
AE

18/10/23
Executive Engineer
R.W.D. (Works) Division
PURNEA

Date	Time	Section No.	Length in km	Bumps in mm	Speed Rate	OR mm/km	IRI mm/km	TEGORY ROAD	Latitude	ongitude	Event	
17/ 10/ 23	9: 18: 0	6	0.1	220	0	2200	2305	G	25.81484	87.39966	Normal	Y = 0 * X ^ 2 + 0.998 * X + 109.5
17/ 10/ 23	9: 18: 4	6	0.1	170	10.1	1700	1806	G	25.81397	87.39929	Speed Brea	X = 1400
17/ 10/ 23	9: 18: 39	6	0.1	190	10.1	1900	2005	G	25.81335	87.39912	Speed Brea	Y = 1506
17/ 10/ 23	9: 19: 0	6	0.1	170	10.1	1700	1806	G	25.81259	87.39944	Normal	
17/ 10/ 23	9: 19: 13	6	0.1	120	10.1	1200	1307	G	25.8118	87.39987	Curve	
17/ 10/ 23	9: 19: 13	6	0.1	90	30.3	900	1007	G	25.81153	87.39975	Normal	(R) RURAL ROAD
17/ 10/ 23	9: 20: 0	6	0.1	120	10.1	1200	1307	G	25.81048	87.39939	Normal	Good Average Poor
17/ 10/ 23	9: 20: 24	6	0.1	300	10.1	3000	3103	G	25.80965	87.39921	Normal	<4000 4001-5000 >5001
17/ 10/ 23	9: 21: 0	6	0.1	160	10.1	1600	1706	G	25.8096	87.3986	Curve	
17/ 10/ 23	9: 21: 0	6	0.1	60	40.4	600	708	G	25.80968	87.39827	Normal	
17/ 10/ 23	9: 21: 34	6	0.1	170	10.1	1700	1806	G	25.80966	87.39778	Normal	
17/ 10/ 23	9: 22: 0	6	0.1	200	10.1	2000	2105	G	25.80918	87.39766	Normal	
					Average		1747.58					

18/10/23
JE

18.10.23
AE

18/10/23
Executive Engineer
R.W.D. (Works) Division
PURNEA
