


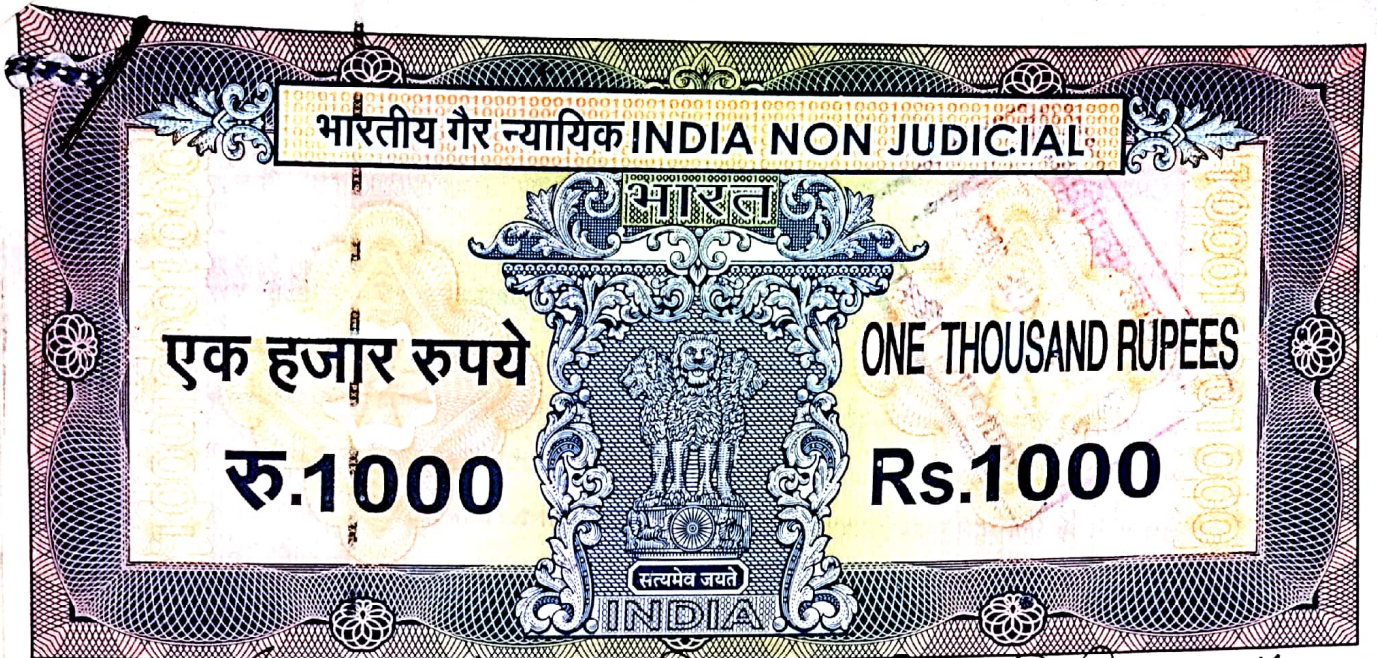

बिहार सरकार
गोपालगंज
21/02/98

पञ्चोदय सिंह का निवेदन
जागा निमरली (पा. न. नरसिंहपुर)

AP 545890

SUPPLEMENTARY AGREEMENT

1. Agreement No.	: 31/SBD(Sup.)/mmhsy/2022-23
2. Estimated Cost Rs.	: 7216658 = 00
3. Revised Agreement Amount Rs.	: 7198616 = 00
(i) Construction Cost Rs.	: 6556887 = 00
(ii) Maintenance Cost.	: 641729 = 00
Original Agreement Cost	: 6341522 = 00
(i) Construction Cost Rs.	: 5699793 = 00
(ii) Maintenance Cost.	: 641729 = 00
4. Performance Securities Rs.	:
A sin the shape of NSC/KVP/BG	
5. Date of Commencement of Work	: 15.11.18
6. Date of Completion of Work	: 14.08.19

Chandn Shetkar Sin
Chandn Shetkar Sin

22/09/22
कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कर्म प्रमंडल, गोपालगंज-2
23/9/22

AA vide letter no. 551 dt 25.6.18

L = 0.885 KM

Amt = 64.951 lacs

		A+ Agre Rate 0.25 + 5% show
work already done =	55.02	→ 54.88
M/c	6.43	→ 6.41
FOR	10.72	→ 10.69
total		71.98 lacs

Revised

0.885

Technically Sanctioned of Road Length. KM for Rs. 71.98 lacs
1. ~~7~~ Crore ~~Seventy one~~ Lacs ~~not up to~~ Thousand only
Sanction of Estimate does not mean Sanction of works.
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPR is to be followed Strictly.

22/06/18
A.E.
RWD

24/6/18
E.E.
RWD

25/6/18
RWD, PATNA

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-222/2022

2186 अ३

/पटना,दिनांक- 26.8.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सिवान।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन
01 (एक) पथ, Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli, Length-0.885
कि०मी० के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बड़े हुए मात्रा की स्वीकृति के
संबंध में।

प्रसंग:-मुख्य अभियंता-3, पटना के पत्रांक-497 अनु० दिनांक 25.06.2022


महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में
मदवार बड़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की
कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर
पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के
अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे
कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक
एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन




(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-222/2022


2186

/पटना, दिनांक- 26.8.22

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित।



अभियंता प्रमुख



दिनांक 29-7-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																																								
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़कें, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इस राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अर्द्ध योजना, Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli, Length-0.885 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्राक-497 अनु० दिनांक-25.06.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी अनुमोदित DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><tr><th colspan="10">Table-A</th></tr><tr><th>Sl No</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (In km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (in Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)</th><th>Amount & % Increase/Decrease</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Barault</td><td>Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli</td><td>0.885</td><td>414</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.885 कि०मी० है। अधिकांश अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल स्थिति एवं वास्तविक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-2 के द्वारा संपूर्ण स्थल निरीक्षण कर प्रत्येकित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2019 में किया गया था। उक्त पथ कुल-3 गांवों एवं बसावटों को संपर्कित प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने अनुरक्षण अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथार्थ तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रास्तावित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बढ़े हुए मदी का उद्वेगति का प्रस्ताव है।</td><td>64.951</td><td>71.98</td><td>7.02% Increase</td></tr></table>	Table-A										Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj-2	Barault	Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli	0.885	414	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.885 कि०मी० है। अधिकांश अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल स्थिति एवं वास्तविक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-2 के द्वारा संपूर्ण स्थल निरीक्षण कर प्रत्येकित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2019 में किया गया था। उक्त पथ कुल-3 गांवों एवं बसावटों को संपर्कित प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने अनुरक्षण अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथार्थ तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रास्तावित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बढ़े हुए मदी का उद्वेगति का प्रस्ताव है।	64.951	71.98	7.02% Increase
Table-A																																										
Sl No	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (in Lacs)	As Per Revised Technical Sanction (in Lacs)	Amount & % Increase/Decrease																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																	
1	Gopalganj-2	Barault	Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli	0.885	414	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.885 कि०मी० है। अधिकांश अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य अचल स्थिति एवं वास्तविक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-2 के द्वारा संपूर्ण स्थल निरीक्षण कर प्रत्येकित किया गया है कि इस पथ का निर्माण वर्ष 2016-2019 में किया गया था। उक्त पथ कुल-3 गांवों एवं बसावटों को संपर्कित प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण पथ है। यह योजना अपने अनुरक्षण अवस्था में ही वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल प्रभावित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पथार्थ तेज जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राकलन में किये गये प्रास्तावित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। इसी कारण पुनरीक्षित प्राकलन को तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित्त में पुनरीक्षित प्राकलन में बढ़े हुए मदी का उद्वेगति का प्रस्ताव है।	64.951	71.98	7.02% Increase																																	

Table-B

Sl. No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate	Amount	Qty.	Amount	Percentage
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Construction of subgrade and earthen shoulder with all approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Tables 300.2 with lead upto 100 m as per Technical specification clause 303	cum	1260.460	156.970	197854.41	1766.710	156.970	277320.47	506.250	79466.06	40.16
2	8	Granular sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) A) By Mix in place Method (Grading II) Construction of granular sub-base by providing well graded material, spreading in uniform layers with motor grader on prepared surface mixing by mix in place method with rotavator at OMC and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical specification cl. 401 (75mm thickness of this layer is extended for a width of 4.05m as Drainage Layer also where applicable. Aggregate 60% & local sand 40%)	cum	342.880	3124.430	1071304.56	438.619	3124.430	1370434.36	95.739	299129.80	27.92
3	9	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming, stone screening to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density Grading 3 as per Technical Specification Clause 405.	cum	172.990	3968.510	686512.54	236.271	3968.510	937643.83	63.281	251131.28	36.58
4	10	Providing and applying primer coat with bitumen emulsion (SS-1) on prepared surface of granular base including cleaning of road surface and spraying primer at the rate of 0.70-1.0kg/sqm using mechanical means as per Technical Specification Clause 502	Sqm	1609.690	47.950	77184.64	2452.750	47.950	117609.36	843.060	40424.73	52.37
5	11	Providing and applying tack coat with Bitumen emulsion (RS-1) using emulsion distributor at the rate of 0.25-0.30kg per sqm on the prepared granular surfaces treated with primer & cleaned with Hydraulic broom as per Technical Specification Clause 503	Sqm	1609.690	16.030	25803.33	2452.750	16.030	39317.58	843.060	13514.25	52.37
6	12	Providing, laying and rolling of close-graded premix surfacing material of 20 mm thickness composed of 11.2 mm to 0.9 mm (Type-A) or 13.2 mm to 0.9 mm (Type-B) aggregates using penetration grade bitumen to required line, grade and level to serve as wearing course on a previously prepared base, including mixing in a suitable plant, laying and rolling with a three wheel 8-10 kN static roller and finishing to required level and grades as per Technical Specification Clause 509	Sqm	1609.690	223.910	360425.69	2452.750	223.910	549195.25	843.060	188766.56	52.37

3 समिति द्वारा की गयी समीक्षा

(i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।

	(ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र07/विविध-02-187/2018-7155 (एस) दिनांक 14.09.2018 के कंडिका-4 में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना मूल प्रावकलन में, 20 प्रतिशत से कम या 20 प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्रावकलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना 2106 (एस) दिनांक 07.03.2017 के अनुसार लोक निर्माण संहिता-292 (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विधि (BOQ) मद का अनुमोदन 20 प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/समिति की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है। (iii) उक्त के आलोक में कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मदों (Item No.-4, 8, 9, 10, 11, 12) के स्तम्भ-11 में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा 20 प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।
4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय समीक्षोपरांत कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अनुसूचित जाति) अंतर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना Bakhraur Jaddi PMGSY to Miya Toli, Length-0.885 कि०मी० के निर्माण पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित कुल-06 (छः) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 में अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

24/01/22
(आमीर नैथर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(पंकज कुमार)
सरकार के सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।
