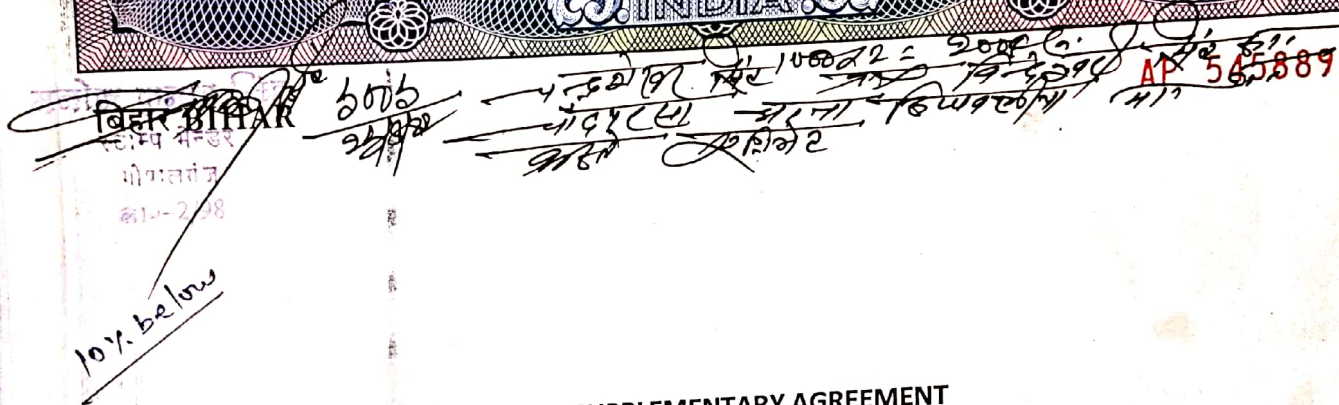




1. Agreement No.
2. Estimated Cost Rs.
3. Revised Agreement Amount Rs.
 - (i) Construction Cost Rs.
 - (ii) Maintenance Cost.
- Original Agreement Cost :
 - (i) Construction Cost Rs.
 - (ii) Maintenance Cost.
4. Performance Securities Rs.

A sin the shape of NSC/KVP/BG

5. Date of Commencement of Work
6. Date of Completion of Work

: 7967199 zw
 : 7170479 zw
 : 6824531 zw
 : 345948 zw
 : 6076936 zw
 : 5730988 zw
 : 345948 zw

कार्यपालक अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य प्रमंडल, गोपालपुर-२
23/9/22

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2022 218/214. /पटना,दिनांक- 26.8.22

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार मिश्रा,
अभियंता प्रमुख,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, सिवान।

विषय: मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अन्तर्गत कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 के अधीन 01 (एक) पथ, REO Road to Rajput Tola, Length-0.940 कि०मी० के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:-मुख्य अभियंता-3, पटना के पत्रांक-497 अनु० दिनांक 25.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त विषयांकित पथ के पुनरीक्षित प्राक्कलन में मदवार बढ़े हुए मात्रा की स्वीकृति पर विभागीय निविदा समिति द्वारा लिये गये निर्णय की कार्यवाही की छायाप्रति नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जा रही है।

पुनरीक्षित प्राक्कलन में वृद्धि वाले मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के अनुमोदित दर पर एवं नए मदों का दर प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) के अनुसार होगी, जिसके निर्धारण का दायित्व संबंधित अधीक्षण अभियंता का है। यह उससे कम हो सकती है किन्तु किसी भी परिस्थिति में प्राथमिक एकरारनामा की दर एवं प्राथमिक एकरारनामा के समय प्रभावी अनुसूचित दर (SOR) से अधिक नहीं होगी।

अनु०:-निविदा समिति की कार्यवाही की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

(अशोक कुमार मिश्रा)

ज्ञापक:-BRRDA(HQ)-MMGSY-221/2022 218/ /पटना, दिनांक- 26.8.22

प्रतिलिपि:-मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोपालगंज-2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख

दिनांक 29-7-2022 को सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग की अध्यक्षता में सम्पन्न निविदा समिति की बैठक की कार्यवाही।

1	उपस्थिति :-	• श्री पंकज कुमार पाल, सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री अशोक कुमार मिश्रा, अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री निर्मल कुमार, मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना। • श्री आमीर नैय्यर, आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना।																														
2	विषय एवं प्रस्ताव	(i) योजना शीर्ष/विपत्र कोड :- मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (SC) शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0104, विपत्र कोड-37-4515007890104 है। 3054-सड़क तथा सेतु-मुख्यशीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु, उपमुख्य शीर्ष-04-जिला तथा अन्य सड़के, लघु शीर्ष-105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष-0001-ग्राम सड़क-अन्य रख-रखाव व्यय जिसका विपत्र कोड-37-3054-04-105-0001 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ₹ 2530.00 करोड़ का बजटीय उपबंध प्राप्त है, इसी राशि से अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद की बढ़ोतरी राशि का व्यय विकलनीय होगा। (ii) योजना का नाम :-MMGSY (SC) ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अद्वय योजना, REO Road to Rajput Tola, Length-0.940 कि०मी० के पथ निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-497 अनु० दिनांक-25.06.2022 के द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति DPR विभाग को समर्पित है, जिसकी विवरणी Table-'A' एवं 'B' में निम्नवत् है :- <table><caption>Table-A</caption><tr><th>Sl No.</th><th>Division</th><th>Block</th><th>Name of Road</th><th>Length (In km)</th><th>Total Population Served</th><th>Reason for Revised DPR</th><th>As per Administrative Approval (In Lacs)</th><th>As Per Revised Technical Approval (In Lacs)</th><th>Amount & % increase/decrease</th></tr><tr><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th><th>5</th><th>6</th><th>7</th><th>8</th><th>9</th><th>10</th></tr><tr><td>1</td><td>Gopalganj-2</td><td>Baithunpur</td><td>REO Road to Rajput Tola</td><td>0.940</td><td>250</td><td>प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.940 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB & WBM Grade-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल क्लवित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पर्याप्त तल जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कन में किये गये प्राक्कनित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में किया गया प्राक्कन स्थल के अनुरूप है, पुनरीक्षित प्राक्कलन एकरूपीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।</td><td>69.548</td><td>71.70</td><td>2.152 लाख & 3.05 % अति</td></tr></table>	Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (In Lacs)	As Per Revised Technical Approval (In Lacs)	Amount & % increase/decrease	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	Gopalganj-2	Baithunpur	REO Road to Rajput Tola	0.940	250	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.940 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB & WBM Grade-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल क्लवित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पर्याप्त तल जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कन में किये गये प्राक्कनित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में किया गया प्राक्कन स्थल के अनुरूप है, पुनरीक्षित प्राक्कलन एकरूपीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	69.548	71.70	2.152 लाख & 3.05 % अति
Sl No.	Division	Block	Name of Road	Length (In km)	Total Population Served	Reason for Revised DPR	As per Administrative Approval (In Lacs)	As Per Revised Technical Approval (In Lacs)	Amount & % increase/decrease																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																							
1	Gopalganj-2	Baithunpur	REO Road to Rajput Tola	0.940	250	प्रस्तावित पथ की कुल लम्बाई-0.940 कि०मी० है। अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, सिवान एवं कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, गोपालगंज-2 के द्वारा संयुक्त स्थल निरीक्षण कर प्रतिवेदित किया गया है कि निरीक्षण में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 के बाढ़ से प्रभावित होकर क्षतिग्रस्त हो गयी थी। वर्ष 2020 में बाढ़ आने के पूर्व पथ का निर्माण अवस्था Earthwork, GSB & WBM Grade-III तक पूर्ण कर लिया गया था। किन्तु आकस्मिक आपदा बाढ़ के कारण पथ का अधिकांश भाग जल क्लवित हो गया था। इस कारण पथ का अधिकांश भाग जर्जर हो गया है। इसके अलावा पथ का पर्याप्त तल जल बहाव के कारण जगह-जगह टूट गया है जिसे प्राक्कन में किये गये प्राक्कनित राशि से पुनर्स्थापन नहीं किया जा सकता है। पुनरीक्षित प्राक्कलन में किया गया प्राक्कन स्थल के अनुरूप है, पुनरीक्षित प्राक्कलन एकरूपीत दर में ही तैयार किया गया है। फलस्वरूप कार्यवित में पुनरीक्षित प्राक्कलन में बड़े हुए मदों की स्वीकृति का प्रस्ताव है।	69.548	71.70	2.152 लाख & 3.05 % अति																							

Table-B												
Sl No.	Item No.	Description of Item	As Per Agreement				As Per Revised Estimate			Variation		
			Unit	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)	Qty.	Amount (in Rs.)	Percentage %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	4	Construction of Subgrade Construction of subgrade and earthen shoulders with approved material obtained from borrow pits with all lifts and leads, transporting to site, spreading, grading to required slope and compacted to meet requirement of Table 300.2 with lead upto 100 m as per Technical Specification Clause 303	Cum	601.6	176.47	106164	965.2	176.47	170328.8	363.6	64164	60.44
2	8	Granular Sub-base with Well Graded Material (Table 400.1) Construction of granular sub-base by providing well graded material spreading in uniform layers with tractor mounted grader arrangement on prepared surface, mixing by mix in place method with rotavator at OMC, and compacting with smooth wheel roller to achieve the desired density complete as per Technical Specification Clause 401. (74 mm thickness of this layer is extended to a width of 4.5m as drainage layer also where applicable Aggregate 60% below and 40% above)	Cum	264.66	3580.94	947731.58	459.566	3580.94	1645678	184.906	697947	73.64
3	9	Providing, laying, spreading and compacting stone aggregates of specific sizes to water bound macadam specification including spreading in uniform thickness, hand packing, rolling with smooth wheel roller 80-100 kN in stages to proper grade and camber, applying and brooming stone screening/binding materials to fill-up the interstices of coarse aggregate, watering and compacting to the required density grading 2 as per Technical Specification Clause 405. By Manual Means	Cum	192.940	4433.560	855411	270.264	4433.560	1198232	77.324	342821	40.08

3 सभिति
द्वारा की
गयी
समीक्षा

- (i) सक्षम पदाधिकारी मुख्य अभियंता-3, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना द्वारा उपर्युक्त कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के कॉलम 9 में अंकित राशि के लिए योजना की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान किया गया है।
- (ii) पथ निर्माण विभाग के संकल्प सं०-प्र०७/विविध-०२-१८७/२०१८-७१५५ (एस) दिनांक १४.०९.२०१८ के कंडिका-४ में निहित प्रावधान के अनुरूप "किसी भी स्वीकृत योजना के मूल प्राक्कलन में, २० प्रतिशत से कम या २० प्रतिशत तक की वृद्धि होने की स्थिति में, संबंधित योजना के पुनरीक्षित प्राक्कलन के लिये पुनः प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी, किन्तु राशि का व्यय वित्तीय प्रावधानों का पालन कर किया जायेगा। "पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना २१०६ (एस) दिनांक ०७.०३.२०१७ के अनुसार लोक निर्माण संहिता-२९२ (xviii) (xii) अधिकाई परिमाण विपत्र (BOQ) मद का अनुमोदन २० प्रतिशत से अधिक विचलन होने पर प्रधान सचिव/सचिव की अध्यक्षता में गठित विभागीय निविदा समिति सक्षम प्राधिकार है।
- (iii) उक्त के आलोक में कंडिका-२ (विषय एवं प्रस्ताव) में अंकित योजना के Table-A के स्तम्भ-७ में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-३ में अंकित कुल-०३ (तीन) अदद मद (Item No.- ०४, ०८, ०९.) के स्तम्भ-११ में अंकित मात्रा का विचलन अधिकतम अनुज्ञेय सीमा २० प्रतिशत से अधिक होने के क्रम में विभागीय निविदा समिति की स्वीकृति अपेक्षित है।

4	समिति के द्वारा लिया गया निर्णय	समीक्षोपरांत कंडिका-2 में वर्णित मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (SC) अंतर्गत कार्य प्रमंडल गोपालगंज-2 के अधीन बाढ़ से क्षतिग्रस्त 01 (एक) अदद योजना, REO Road to Rajput Tola, Length-0.940 कि०मी० के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य हेतु कंडिका-2 (विषय एवं प्रस्ताव) के Table-A के स्तम्भ-7 में अंकित तथ्य विवरणी के आलोक में Table-B के स्तम्भ-3 में अंकित 03 (तीन) अदद मदों के लिए स्तम्भ-8 अंकित पुनरीक्षित मात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
---	---	---

21/7/22
(आमीर नैय्यर)
आंतरिक वित्तीय सलाहकार,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

21/7/22
(निर्मल कुमार)
मुख्य अभियंता-3,
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

21/7/22
(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

21/7/22
(पंकज कुमार पाण्डे)
सरकार के सचिव
ग्रामीण कार्य विभाग,
बिहार, पटना।

(97)

AA vide letter no. 669 dt 12.7.19


L = 0.94 KM

Amnt = 69.548 lakh


Revised		Agmt Rate 10% below
Const. =	63.34	57.01
M/c =	3.84	3.45
FOR =	12.49	11.24
total =	79.67	71.70 lakh

Revised

Technically Sanctioned of Road Length 0.94 KM for Rs. 71.70 lakh
(.....X.....Crore. ~~Seventy one~~ Lacs. ~~seventy~~ Thousand only
Sanction of Estimate does not mean Sanction of works.
Conditions and directions laid down in attached technical notes
with the DPR is to be followed Strictly.


A.E.
RWD


E.E.
RWD


C.E.-3
RWD, PATNA
